
실 정 보 고

(공기연장에 따른 간접비 청구권)

The logo of Seoul Housing & Communities Corporation is a circular emblem. It features the company name in English, "Seoul Housing & Communities Corporation", around the top inner edge and in Korean, "서울주택도시공사", around the bottom inner edge. In the center, there is a stylized white graphic of a person sitting on a chair, with the Korean characters "소하" (SoHa) integrated into the design.

2018. 02.

105391521702699

내국 보증자리 주택지구 조성공사

목 차

1. 변 경 사 유 서
2. 공 사 비 집 계 표
3. 수 량 산 출 서
4. 관 련 공 문

1. 변경 사유서

2. 공 사 비 집 계 표



105391521702699

3. 수 량 산 출 서

4. 관 련 규 칙

공기연장에 따른 간접비 청구권

1. 개요 및 현황


① 공사기간 연장에 따른 간접비 지급청구

- 2016.04.18 "내국지구 개발계획변경 및 설계보완사항에 대한 추진일정조회" (택지조성부-1767)
- 2016.05.04 "내국지구 설계보완사항에 대한 추진일정 회신" (택지설계부-1081)
- 2016.05.09 "내국지구 개발계획변경사항에 대한 추진일정 회신" (택지계획부-1752)
- 2016.05.12 "내국지구 개발계획 및 설계보완에 따른 공기연장 검토요청" (택지조성부-2224)
- 2016.05.18 "내국지구 현릉로변 방음벽하부 우수암거관련 관리청의견 알림" (택지설계부-1238)
- 2016.08.29 "내국지구 내 여의천 등 변경 설계도서 송부" (택지설계부-2370)
- 2016.08.29 "내국지구 내 여의천 등 변경 설계도서 송부 및 실정보고 검토지시" (택지조성부-4424)
- 2016.09.05 "내국지구 증압장 설계도서 송부 및 실정보고 검토지시" (택지조성부-4564)
- 2016.11.15 "중(집)2-B 오수,상수공사 설계도서 송부" (SH→큰빛)
- 2017.06. "현릉로 방음벽 설계도서 송부(안골천 및 자족기능부지)" (SH→큰빛)
- 2017.09.17 "신원천산책로 설계도서 송부" (SH→큰빛)
- 2017.10.20 "여의천인도교 설계도서 송부" (SH→큰빛)

② SH공사 공사계약 특수조건 제29조

③ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규 제344호, 2010.12.30.) 제1장 8.실비의산정 2.공사이행기간의 변경에 따른 실비산정

2. 간접비적용 공정표

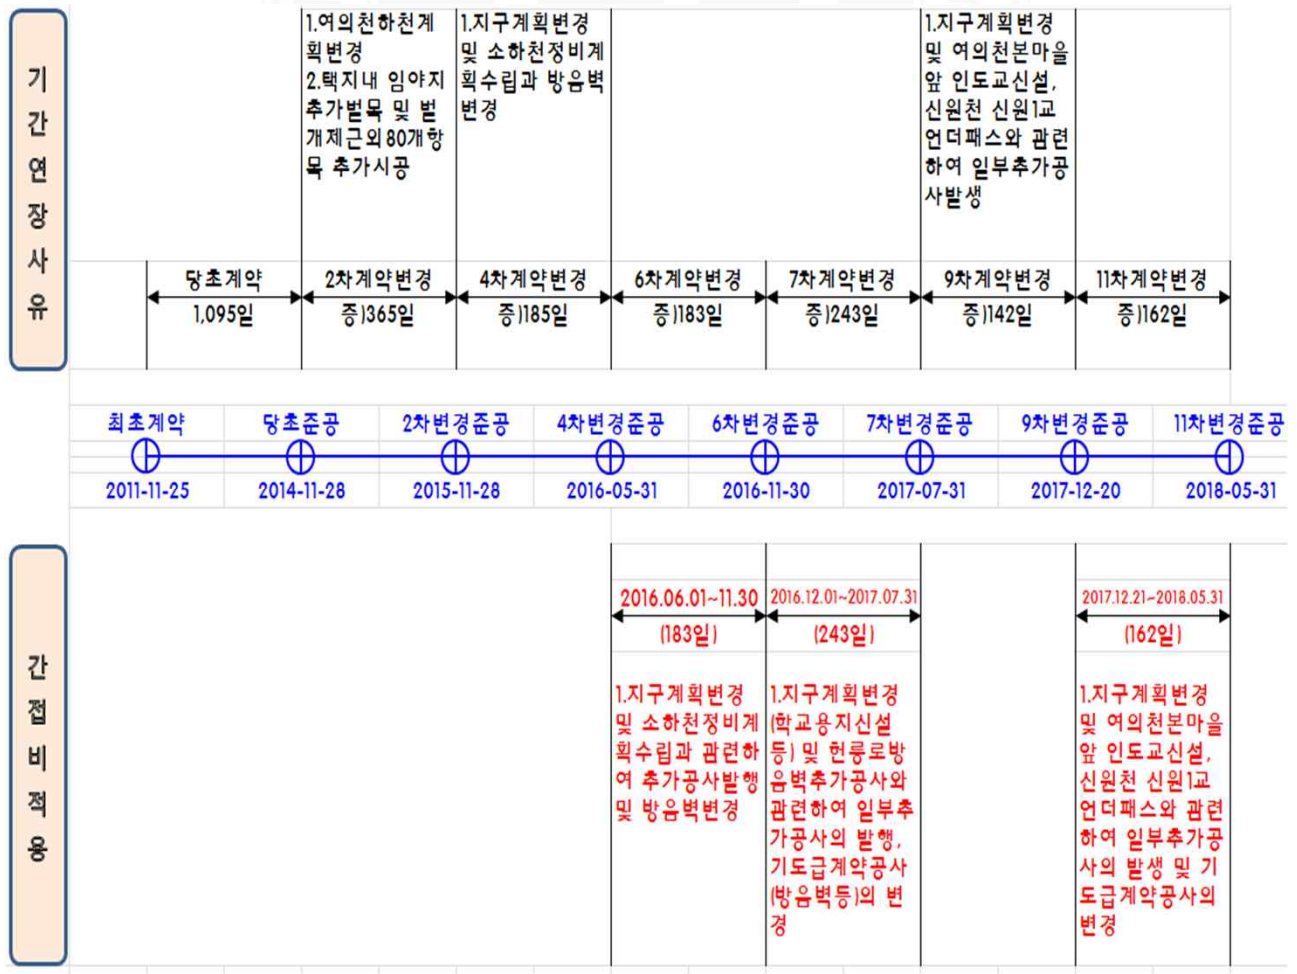

3. 공사비증감 현황

(단위:천원)

구 분	단위	당 초	변 경	비 고
직 접 공 사 비	천원	-	-	
간 접 공 사 비	천원	-	281,281	증) 281,281
제잡비 및 부가세	천원	-	57,013	증) 57,013
도 급 액	천원	-	338,294	증) 338,294
지 급 자 재 비	천원	-	-	
총 공 사 비	천원	-	338,294	증) 338,294

4. 단가구성

① 제잡비 : 계약요율 적용

5. 기대효과

공사기간 연장에 따른 간접비를 청구하므로 원활한 공사관리를 하고자 함.



원 가 계 산 서

[공사명] 내곡 보금자리주택지구 조성공사

비 목 / 구 분	조정계수	구 성 비	도 급	구 성	비 고	
1. 직 접 공 사 비						
1.1 직 접 노 무 비						
2. 간 접 공 사 비	간 접 노 무 비		233,588,983	공사기간 조정에 따른 간접노무비 적용		
	산 재 보 험 료		8,409,203	[직접노무비+간접노무비]*요율		
	고 용 보 험 료		1,938,788	[직접노무비+간접노무비]*요율		
	건 강 보 험 료		-	[직접노무비]*요율		
	연 금 보 험 료		-	[직접노무비]*요율		
	노인장기요양보험료		-	[국민건강보험료]*요율		
	퇴직공제부금비		-	[직접노무비]*요율		
	산업안전보건관리비	0.56	0.94%	-	[재료비(직접공사비*조정계수)+직접노무비]*요율*1.2	
	하도급지급보증수수료		0.064%	-	[직접공사비]*요율	
	건설기계대금지급보증수수료		0.41%	-	[재료비*직접노무비+산출경비]*요율	
	공사이행보증수수료			28,888,170	실납부 내역	
	기 타 경 비	0.56	3.62%	8,455,921	[재료비(직접공사비*조정계수)+노무비(직접+간접)]*요율	
	[소 계]			281,281,065		
2. 순 공 사 원 가			281,281,065	[직접공사비+간접공사비]		
3. 일 반 관 리 비			7,791,485	[직접공사비+간접공사비]*요율		
4. 이 윤			18,467,450	[직접공사비+간접공사비+일반관리비]*요율		
5. 운 영 관 리 비			-			
6. 공 급 가 액			307,540,000	[순공사원가+일반관리비+이윤+지하매설물GIS구축]		
7. 부 가 가 치 세			30,754,000	[공급가액*0.5125*요율]		
8. 도 급 액			338,294,000			

< 공사기간 조정에 따른 간접노무비 산출내역 >

현장명	수급업체	구분	산출금액	적용금액(원)	적용일수
내곡지구	SH공사 의견	1. 실지급 노무비에 따른 산출	234,093,531	233,588,983	588일
		2. 엔지니어링 노임단가에 의한 산출	257,979,837		
		3. 실지급 및 엔지니어링 노임단가중 작은금액에따른 산출	233,588,983		
		4. 당초도급내역서상의 간접노무비에 의한 산출	297,074,064		

▶ 4. 당초 도급내역서상의 간접노무비에 의한 산출

공사기간 조정내역 및 간접비 적용일수	최초공사기간	2011-11-30	2014-11-28	
	공사일수(일)		1,095	
	6회 계약변경	2016-06-01	2016-11-30	간접비 적용
	금회 간접비 적용일수(일)		183	
	7회 계약변경	2016-12-01	2017-07-31	간접비 적용
	금회 간접비 적용일수(일)		243	
	11회 계약변경	2017-12-21	2018-05-31	간접비 적용
	금회 간접비 적용일수(일)		162	588

항 목	금액(원)	비 고
도급내역서상 간접노무비	553,225,090	- 계약내역서 원가계산서 참조
총공사기간	1,095	- 2011년 11월 30일 ~ 2014년 11월 28일
일평균 간접노무비	505,228	- 553,225,090 / 1,095일 = 505,228
공기연장기간(간접비적용일수)	588	- 2016년 06월 01일 ~ 2018년 05월 31일
공기연장간접노무비	297,074,064	- 505,228 × 588일 = 297,074,064

1. 실지급 노무비에 따른 산출

1.1. 원천징수영수증에 따른 간접노무비 적용 대상 일 급여액 산정

업무	성명	수령액(730일)('16.06.01~'18.05.31)			인정상여 ④=①×(4/12)	적용금액 ⑤=①+④	일 급여액 ⑥÷공기연장일수	비고
		급여①	상여②	계③=①+②				
현장대리인(특급)	이준행	92,903,218	-	92,903,218	-	92,903,218	157,999	(2016-06-01~2018-05-31) 92,903,218 / 588 일
품질관리자(중급)	심혁주	75,383,866	-	75,383,866	-	75,383,866	128,204	(2016-06-01~2018-05-31) 75,383,866 / 588 일
품질관리자(초급)	김정태	65,806,447	-	65,806,447	-	65,806,447	111,916	(2016-06-01~2018-05-31) 65,806,447 / 588 일

※ 인정상여(400%까지만 인정) : 「예정가격작성기준」(계약예규 2200.04-160-9, 2011.05.13.)

1.2. 실지급 노무비 금액 산출

단위: 원

공기연장일수	공기연장일	성명	일 급여액	투입일수	신청금액	기술자등급	비고
588 일	2016-06-01 ~ 2018-05-31	이준행	157,999	588	92,903,412	특급	일수계산
588 일	2016-06-01 ~ 2018-05-31	심혁주	128,204	588	75,383,952	특급	"
588 일	2016-06-01 ~ 2018-05-31	김정태	111,916	588	65,806,608	초급	"
계					234,093,972		

----> 소숫점이하단가 조정으로 인하여 금액난이

"

"

2. 엔지니어링 노임단가기준에 따른 산출근거

공기연장일수	공기연장일	성명	경력사항				학력	기술자등급	비고
			최초개시일	현재	경력일수	현재			
588 일	2016-06-01 ~ 2018-05-31	이준행	1992-08-01	2018-02-27	9,342	25년 7개월	대졸	특급	
588 일	2016-06-01 ~ 2018-05-31	심혁주	2002-08-28	2018-02-27	5,663	15년 6개월	대졸	특급	
588 일	2016-06-01 ~ 2018-05-31	김정태	2000-12-28	2018-02-27	6,271	17년 2개월	초대졸	초급	
계									

3-1. 법정 최소인원, 엔지니어링 노임단가에의한 산출 적용 검토

1) 현장대리인(특급기술자)

- 2016년도 검토

구 분	실지급확인 산출 ①	엔지니어링 노임단가에 의한 산출 (1)	비 고
간접노무비	33,600,000	40,198,004	
적용일수	214일	22일 x 7월 = 154일	
산출근거	급여명세서요약 참조	154일 x 261,026 = 40,198,004	
적용	◎		

- 2017년도 검토

구 분	실지급확인 산출 ②	엔지니어링 노임단가에 의한 산출 (2)	비 고
간접노무비	35,303,218	42,090,048	
적용일수	223일	22일 x 7.3월 = 161일	
산출근거	급여명세서요약 참조	161일 x 262,080 = 42,090,048	
적용	◎		

- 2018년도 검토

구 분	실지급확인 산출 ③	엔지니어링 노임단가에 의한 산출 (3)	비 고
간접노무비	24,000,000	29,393,760	
적용일수	151일	22일 x 5월 = 110일	
산출근거	급여명세서요약 참조 <small>105391521702699</small>	110일 x 267,216 = 29,393,760	
적용	◎		

< 합 계 >

$$\textcircled{4} = \textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3}$$

$$(4) = (1) + (2) + (3)$$

구 분	실지급확인 산출 계	엔지니어링 노임단가에 의한 산출 계	비 고
간접노무비	92,903,218	111,681,812	
적용일수	588일	425일	
적용	◎		

2) 품질관리자(중급기술자)

- 2016년도 검토

구 분	실지급확인 산출 ⑤	엔지니어링 노임단가에 의한 산출 (5)	비 고
간접노무비	27,200,000	28,707,756	
적용일수	214일	22일 x 7월 = 154일	
산출근거	급여명세서요약 참조	154일 x 186,414 = 28,707,756	
적용	◎		

- 2017년도 검토

구 분	실지급확인 산출 ⑥	엔지니어링 노임단가에 의한 산출 (6)	비 고
간접노무비	28,683,866	30,428,560	
적용일수	223일	22일 x 7.3월 = 161일	
산출근거	급여명세서요약 참조	161일 x 189,468 = 30,428,560	
적용	◎		

- 2018년도 검토

구 분	실지급확인 산출 ⑦	엔지니어링 노임단가에 의한 산출 (7)	비 고
간접노무비	19,500,000	21,454,400	
적용일수	151일	22일 x 5월 = 110일	
산출근거	급여명세서요약 참조 105391521702690	110일 x 195,040 = 21,454,400	
적용	◎		

< 합 계 >

$$\textcircled{8} = \textcircled{5} + \textcircled{6} + \textcircled{7}$$

$$\textcircled{8} = (5) + (6) + (7)$$

구 분	실지급확인 산출 계	엔지니어링 노임단가에 의한 산출 계	비 고
간접노무비	75,383,866	80,590,716	
적용일수	588일	425일	
적용	◎		

3) 품질관리자(초급기술자)

- 2016년도 검토

구 분	실지급확인 산출 ⑨	엔지니어링 노임단가에 의한 산출 (9)	비 고
간접노무비	23,800,000	23,581,866	
적용일수	214일	22일 x 7월 = 154일	
산출근거	급여명세서요약 참조	154일 x 153,129 = 23,581,866	
적용		⊙	

- 2017년도 검토

구 분	실지급확인 산출 ⑩	엔지니어링 노임단가에 의한 산출 (10)	비 고
간접노무비	25,006,447	24,720,033	
적용일수	223일	22일 x 7월 = 161일	
산출근거	급여명세서요약 참조	161일 x 153,923 = 24,720,033	
적용		⊙	

- 2018년도 검토

구 분	실지급확인 산출 ⑪	엔지니어링 노임단가에 의한 산출 (11)	비 고
간접노무비	17,000,000	17,405,410	
적용일수	151일	22일 x 5월 = 110일	
산출근거	급여명세서요약 참조 105391521702690	110일 x 158,231 = 17,405,410	
적용	⊙		

< 합 계 >

$$\textcircled{12} = \textcircled{9} + \textcircled{10} + \textcircled{11}$$

$$(12) = (9) + (10) + (11)$$

구 분	실지급확인 산출 계	엔지니어링 노임단가에 의한 산출 계	비 고
간접노무비	65,806,447	65,707,309	
적용일수	588일	425일	
적용		⊙	

4) 안전관리자(중급기술자)

- 2016년도 검토

구 분	실지급확인 산출 ⑬	엔지니어링 노임단가에 의한 산출 (13)	비 고
간접노무비	0	0	
적용일수	214일	22일 x 7월 = 154일	
산출근거	급여명세서요약 참조	154일 x 186,414 = 28,707,756	
적용	◎		

- 2017년도 검토

구 분	실지급확인 산출 ⑭	엔지니어링 노임단가에 의한 산출 (14)	비 고
간접노무비	0	0	
적용일수	223일	22일 x 7.3월 = 161일	
산출근거	급여명세서요약 참조	161일 x 189,468 = 30,428,560	
적용	◎		

- 2018년도 검토

구 분	실지급확인 산출 ⑮	엔지니어링 노임단가에 의한 산출 (15)	비 고
간접노무비	0	0	
적용일수	151일	22일 x 5월 = 110일	
산출근거	급여명세서요약 참조 105391521702690	110일 x 195,040 = 21,454,400	
적용	◎		

< 합 계 >

$$⑨ = ⑬ + ⑭ + ⑮$$

$$(a) = (13) + (14) + (15)$$

구 분	실지급확인 산출 계	엔지니어링 노임단가에 의한 산출 계	비 고
간접노무비	0	0	
적용일수	588일	425일	
적용	◎		

5) 총괄합계 (실지급 및 엔지니어링 노임단가 산출계)

구분	실지급확인 산출계	엔지니어링 노임단가에 의한 산출계	비고
간접노무비	234,093,531	257,979,837	
적용일수	588일	425일	
적용	⊙		

$$5) = ④ + ⑧ + ⑫ + ㉑$$

$$5) = ④ + ⑧ + ⑫ + ㉑$$

6) 총괄합계(실지급확인 산출 및 엔지니어링 노임단가 산출중 작은값 적용계)

구분	비교금액 작은값	비교금액 많은값	비고
간접노무비	233,588,983	258,484,385	
적용일수	588일	425일	
적용	⊙		

$$6) = ④ + ⑧ + ⑫ + ㉑$$

$$6) = ④ + ⑧ + ⑫ + ㉑$$

3-2. 엔지니어링 기술자 노임단가

단위 : 원

구 분	2015			2016			2017			비고
	원자력발전	산업공장	건설및기타	원자력발전	산업공장	건설및기타	원자력발전	산업공장	건설및기타	
기술사	456,463	407,136	348,021	459,952	407,249	348,258	472,680	419,181	359,350	
특급기술자	421,834	358,975	261,026	427,450	358,883	262,080	440,305	359,469	267,216	
고급기술자	301,650	264,484	213,071	304,454	266,143	217,189	313,662	269,900	224,002	
중급기술자	258,828	222,644	186,414	251,748	222,721	189,468	270,826	225,615	195,040	
초급기술자	204,632	188,640	153,129	219,791	187,968	153,923	231,396	193,024	158,231	
고급숙련기술자	274,614	188,377	176,629	272,113	208,823	167,628	280,554	224,100	175,188	
중급숙련기술자	239,265	182,704	149,279	235,126	170,674	155,246	252,911	172,278	166,062	
초급숙련기술자	135,937	152,670	130,553	146,726	156,011	131,270	148,789	161,317	142,817	

4. 월급 집행현황

< 2016년 > 기준 : 2016년 06월 01일 ~ 12월 31일

단위 : 원

성명	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	소계	비고
이준행						4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	33,600,000	214일
이현석						4,300,000							4,300,000	30일
심혁주							3,400,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	22,900,000	184일
심혁주						3,400,000							3,400,000	30일
김정태							3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	20,400,000	184일
이광우						2,628,910							2,628,910	22일
김윤근							3,721,670	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	22,971,670	192일

< 2017년 > 기준 : 2017년 01월 01일 ~ 07월 31일 , 2017년 12월 21일 ~ 12월 31일

성명	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	소계	비고
이준행	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000					1,703,218	35,303,218	223일
심혁주	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000					1,383,866	28,683,866	223일
김정태	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000					1,206,447	25,006,447	223일
김윤근	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000					1,366,123	28,316,123	223일

< 2018년 > 기준 : 2018년 01월 01일 ~ 05월 31일

성명	1월	2월	3월	4월	5월								소계	비고
이준행	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000								24,000,000	151일
심혁주	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000								19,500,000	151일
김정태	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000								17,000,000	151일
김윤근	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000								19,250,000	151일

< 합 계 >

성명	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	소계	비고
이준행	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	6,503,218	92,903,218	588일
이현석	-	-	-	-	-	4,300,000	-	-	-	-	-	-	4,300,000	30일
심혁주	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	3,900,000	7,300,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	5,283,866	71,083,866	558일
심혁주	-	-	-	-	-	3,400,000	-	-	-	-	-	-	3,400,000	30일
김정태	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000	3,400,000	6,800,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	4,606,447	62,406,447	558일
이광우	-	-	-	-	-	2,628,910	-	-	-	-	-	-	2,628,910	22일
김윤근	7,700,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000	3,850,000	7,571,670	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	5,216,123	70,537,793	566일

5. 계약 이행증권 수수료 산출내역

업 체 명	금 액		비 고
	납부액	적용	
큰빛종합건설(주)	263,980		(1회)변경
큰빛종합건설(주)	13,639,450		(2회)변경
큰빛종합건설(주)	919,720		(3회)변경
큰빛종합건설(주)	7,835,510		(4회)변경
큰빛종합건설(주)	294,670		(5회)변경
큰빛종합건설(주)	8,182,240	8,182,240	(6회)변경
큰빛종합건설(주)	11,997,140	11,997,140	(7회)변경
큰빛종합건설(주)	54,040		(8회)변경
큰빛종합건설(주)	7,171,890		(9회)변경
큰빛종합건설(주)	165,770		(10회)변경
큰빛종합건설(주)	8,708,790	8,708,790	(11회)변경
계	59,233,200	28,888,170	

4.1. 계약 이행증권 수수료 영수증 사본 (1회)



영 수 증(산정내역)

(2014. 03. 03)

조 합 원	NO. 02455	상호 : 큰빛종합건설(주)
-------	-----------	----------------

과 목	계약보증	
대체과목	보통예금	263,980
		0
		0

(일부) 현금 입금

보증서번호 (거래번호)	산출근거금액	기 간	일수	요금	수입금액
201400036519	96,621,030	2014-03-03 ~ 2014-11-28	271	0.3679	263,980
합 계					263,980

적 요	(201400036519)[에스에이치공사]내곡 보금자리주택지구 조성공사(추가)		(보증서 인증번호 :0008758123-1)
-----	---	--	--------------------------

※ 위 금액을 정히 영수(계산)함.



중앙지점
사업자등록번호 : 211-85-16507



4.1. 계약 이행증권 수수료 영수증 사본 (2회)



영 수 증(산정내역)

(2014. 10. 17)

조 합 원	NO. 02455	상호 : 큰빛종합건설(주)
-------	-----------	----------------

과 목	계약보증	
	보통예금	13,639,450
대체과목		0
		0

(일부) 현금 입금

보증서번호 (거래번호)	산출근거금액	기 간	일수	요금	수입금액
201100217464	3,006,278,970	2014-11-29 ~ 2015-11-28	365	0.3415	10,268,570
201400036519	96,621,030	2014-11-29 ~ 2015-11-28	365	0.3679	355,560
201400196108	1,021,800,000	2014-10-17 ~ 2015-11-28	408	0.2639	3,015,320
				합 계	13,639,450

적 요	{201100217464}[에스에이치공사장]내곡 보금자리주택지구 조성공사(연장)	(보증서 인증번호 :0006918635-2)
	{201400036519}[에스에이치공사장]내곡 보금자리주택지구 조성공사(연장)	(보증서 인증번호 :0008758123-2)
	{201400196108}[에스에이치공사장]내곡 보금자리주택지구 조성공사(추가)	(보증서 인증번호 :0009218499-1)



* 위 금액을 정히 영수(계산)함.




중앙지점
사업자등록번호 : 211-85-16507



4.1. 계약 이행증권 수수료 영수증 사본 (3회)

		영 수 증(산정내역) (2015. 06. 25)			
조 합 원		NO. 02455 상품 : 큰빛종합건설(주)			
과 목 대체과목		계약보증			
		보통예금			919,720
					0
					0
(일부) 현금 입금					
보증서번호 (거래번호)	산출근거금액	기 간	일수	요율	수입금액
201500118543	610,950,000	2015-06-25 ~ 2015-11-28	157	0.3499	919,720
			합 계		919,720
적 요		(201500118543)[에스에이치공사장]내곡 보금자리주택지구 조성공사(추가) (보증서 인증번호 :0009759795-1)			
※ 위 금액을 경히 영수(계산)함.					
					
			건설공제조합 Construction Guarantee		
			중앙지점 사업자등록번호 : 211-85-16507		

4.1. 계약 이행증권 수수료 영수증 사본 (5회)



영 수 증(산정내역)

(2016. 01. 28)


조 합 권	NO. 02455	상호 : 큰빛종합건설(주)
과 목	계약보증	
대체과목	보통예금	294.670
		0
		0

(일부) 현금 입금

보증서번호 (거래번호)	산출근거금액	기 간	일수	요일	수입금액
201600014336	245,850,000	2016-01-28 ~ 2016-05-31	125	0.3499	294.670
합 계					294.670


적 요 (201600014336)[에스에이치공사장]내국 보금자리주택지구 조성공사(추가) (보증서확인번호 :PBJ14-14539-67574-80312)

※ 위 금액을 정히 영수(계산)함.



건설공제조합
Construction Guarantee

중앙지점
사업자등록번호 : 211-85-16507



4.1. 계약 이행증권 수수료 영수증 사본 (6회)



영 수 증(산정내역)

(2016. 05. 25)

조 합 원	NO. 02455	상호 : 근빛종합건설(주)
-------	-----------	----------------

과 목	계약보증	
대체과목	보통예금	8,182,240
		0
		0

(일부) 현금 입금

보증서번호 (거래번호)	산출금금액	기 간	일수	요금	수입금액
201100217484	3,006,278,970	2016-05-01 ~ 2016-11-30	183	0.3415	5,148,150
201400036519	96,621,030	2016-06-01 ~ 2016-11-30	183	0.3679	178,260
201400198108	1,021,800,000	2016-06-01 ~ 2016-11-30	183	0.2639	1,352,410
201500118543	610,950,000	2016-06-01 ~ 2016-11-30	183	0.3499	1,072,030
201600014336	245,850,000	2016-06-01 ~ 2016-11-30	183	0.3499	431,390
합 계					8,182,240

적 요	(201100217484)[에스에이치공사] 내국 보증자리주먹지구 조성공사(연장) :PBJ14-14841-60520-81233	(보증서확인번호)
	(201400036519)[에스에이치공사] 내국 보증자리주먹지구 조성공사(연장)	(보증서 인증번호 :0008758123-4)
	(201400198108)[에스에이치공사] 내국 보증자리주먹지구 조성공사(연장)	(보증서 인증번호 :0009218499-3)
	(201500118543)[에스에이치공사] 내국 보증자리주먹지구 조성공사(연장)	(보증서 인증번호 :0009758795-3)
	(201600014336)[에스에이치공사] 내국 보증자리주먹지구 조성공사(연장)	(보증서 인증번호 :0010232606-2)

※ 위 금액을 정미 일수(계산)함.



영양지점
사업자등록번호 : 211-85-18507



4.1. 계약 이행증권 수수료 영수증 사본 (7회)



영 수 증(산정내역)

(2016. 11. 29)

조 합 원	NO. 02455	상호 : 큰빛종합건설(주)
-------	-----------	----------------

과 목	계약보증	
대체과목	보통예금	11,997,140
		0
		0

(원부) 현금 입금

보증서번호 (거래번호)	산출근거금액	기 간	일수	요금	수입금액
201100217464	3,006,278,970	2016-12-01 ~ 2017-07-31	243	0.3415	6,836,300
201400036519	96,621,030	2016-12-01 ~ 2017-07-31	243	0.3679	236,710
201400196108	1,021,800,000	2016-12-01 ~ 2017-07-31	243	0.2639	1,795,890
201500118543	610,950,000	2016-12-01 ~ 2017-07-31	243	0.3499	1,423,570
201600014336	245,850,000	2016-12-01 ~ 2017-07-31	243	0.3499	572,850
201600249839	481,770,000	2016-11-29 ~ 2017-07-31	245	0.3499	1,131,820
합 계					11,997,140

적 요	(201100217464)[서울주택도시공사]내국 보증자리주택지구 조성공사(연장) :PBJ14-14804-03196-76200)	(보증서확인번호
	(201400036519)[서울주택도시공사]내국 보증자리주택지구 조성공사(연장)	(보증서 인증번호 :0008758123-5)
	(201400196108)[서울주택도시공사]내국 보증자리주택지구 조성공사(연장)	(보증서 인증번호 :0009218499-4)
	(201500118543)[서울주택도시공사]내국 보증자리주택지구 조성공사(연장)	(보증서 인증번호 :0009758795-4)
	(201600014336)[서울주택도시공사]내국 보증자리주택지구 조성공사(연장)	(보증서 인증번호 :0010232606-3)
	(201600249839)[서울주택도시공사]내국 보증자리주택지구 조성공사(추가) :PBJ14-14804-03195 74874)	(보증서확인번호




※ 위 금액을 정액 영수(계산)함.



중앙지점
사업자등록번호 : 211-85-16507



4.1. 계약 이행증권 수수료 영수증 사본 (8회)

		영 수 증(산정내역) (2017. 06. 16)			
		조 랑 현 NO. 02455 상호 : 큰빛종합건설(주)			
과 목		계약보증			
대체과목		보통예금			54,040
					0
					0
(일부) 현금 입금					
보증서번호 (거래번호)	산출근거금액	기 간	일수	요율	수입금액
201700128102	122,550,000	2017-06-16 ~ 2017-07-31	46	0.3498	54,040
			합 계		54,040
적 요	(201700128102)[서울주택도시공사]내곡 보금자리부락지구 조성공사(추가) (보증서확인번호 : PBJ14-14975-97035-74084)				
※ 위 금액을 정액 영수(계산)함.		 중앙지점 사업자등록번호 : 211-85-16507			
					

4.1. 계약 이행증권 수수료 영수증 사본 (9회)



영 수 증(산정내역)

(2017. 07. 28)

조 합 원	NO. 02455	상호 : 권북공제조합(주)
-------	-----------	----------------

과 목	계약보증	
대체과목	보통예금	7,171,890
		0
		0

(일부) 현금 입금

보증서번호 (거래번호)	산출근거금액	기 간	일수	요율	수입금액
201100217484	3,006,278,970	2017-08-01 ~ 2017-12-20	142	0.3415	3,994,730
201400036519	-96,621,030	2017-08-01 ~ 2017-12-20	142	0.3879	138,820
201400196108	1,021,800,000	2017-08-01 ~ 2017-12-20	142	0.2689	1,049,410
201500118543	610,950,000	2017-08-01 ~ 2017-12-20	142	0.3499	831,860
20160014336	245,850,000	2017-08-01 ~ 2017-12-20	142	0.3499	334,740
201600249839	481,770,000	2017-08-01 ~ 2017-12-20	142	0.3499	655,970
201700128102	122,550,000	2017-08-01 ~ 2017-12-20	142	0.3499	166,860
합 계					7,171,890

적 요	(201100217484)[서울주택도시공사 사장]내국 보증자리주택지구 조성공사(연장) :PBJ14-15012-27790-33324) (보증서확인번호)	(보증서 인준번호 : 0008758123-6)
	(201400036519)[서울주택도시공사 사장]내국 보증자리주택지구 조성공사(연장)	(보증서 인준번호 : 0006216499-5)
	(201400196108)[서울주택도시공사 사장]내국 보증자리주택지구 조성공사(연장)	(보증서 인준번호 : 0009758795-5)
	(201500118543)[서울주택도시공사 사장]내국 보증자리주택지구 조성공사(연장)	(보증서 인준번호 : 0010232606-4)
	(20160014336)[서울주택도시공사 사장]내국 보증자리주택지구 조성공사(연장)	(보증서 인준번호 : 0010902887-2)
	(201600249839)[서울주택도시공사 사장]내국 보증자리주택지구 조성공사(연장)	(보증서 인준번호 : 0011418522-2)
	(201700128102)[서울주택도시공사 사장]내국 보증자리주택지구 조성공사(연장)	

* 위 금액을 경리 영수(계산)함.

CG **건설공제조합**
Construction Guarantee
중앙지점
사업자등록번호 : 211-85-16507



4.1. 계약 이행증권 수수료 영수증 사본 (10회)



영 수 증(산정내역)

(2017. 10. 31)

조 합 원	NO. 02455	상호 : 씨넷중앙건설(주)
-------	-----------	----------------

과 목		계약보증				
대체과목		보통예금				165,770
						0
						0
(일부) 현금 입금						
보증서번호 (거래번호)	산출근거금액	기 간	일수	요율	수입금액	
201700244418	339,012,000	2017-10-31 ~ 2017-12-20	51	0.3499	165,770	
			합 계		165,770	
전 요		(201700244418)[서울주택도시공사 사장]내곡 분금자리주택지구 조성공사(추가) (보증서확인번호 : PRJ14-15094-36994-45802)				

* 외 금액을 정히 영수(계산)함.




중앙지점
사업자등록번호 : 211-05-18507



간접비적용 공정표

공사명 : 내곡 보금자리 주택지구 조성공사

기간연장사유

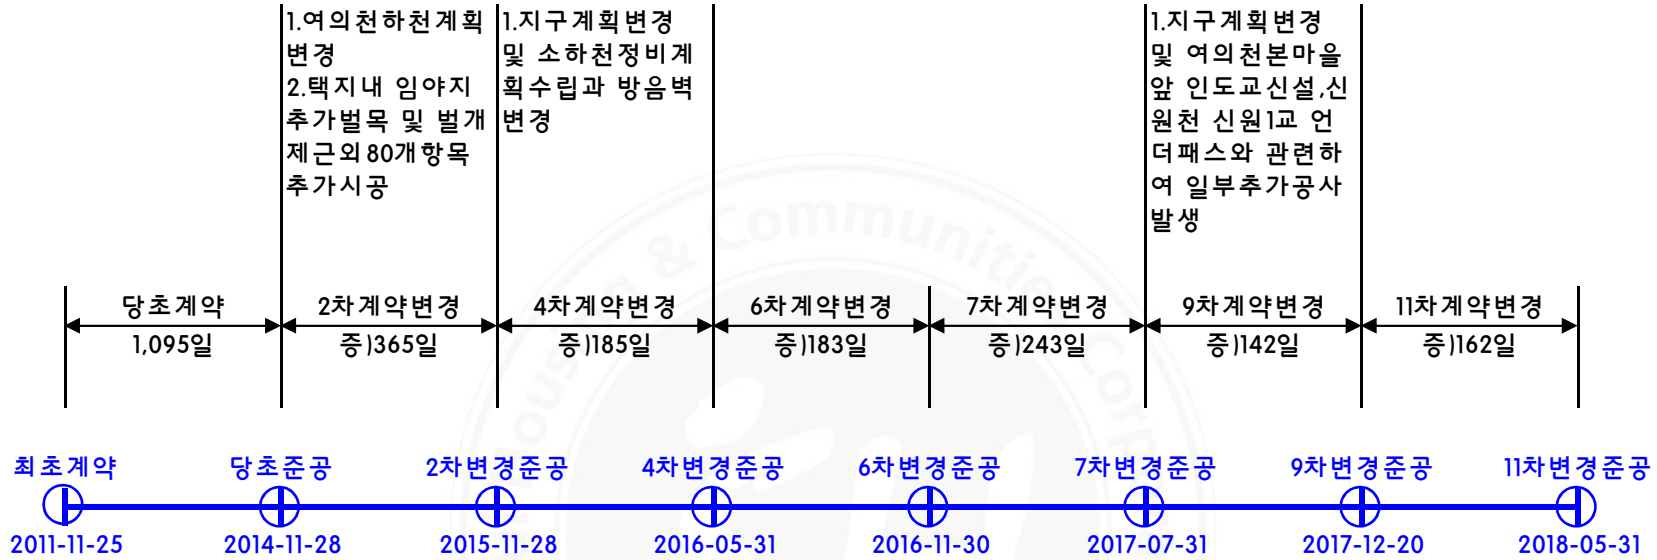

간접비적용

