

4월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

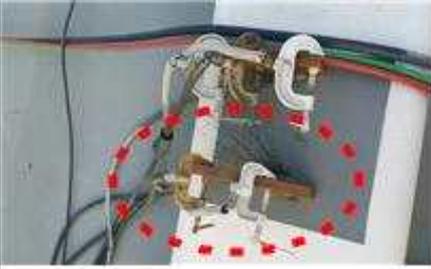
(토 목 부)

안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 24개			
1	2018.4.18.	월드컵대교 건설공사	3	2	2
2	2018.4.20.	서부간선지하도로 민간투자사업(1공구)	3	2	2
3	2018.4.18.	서부간선지하도로 민간투자사업(2공구)	3	3	3
4	2018.4.19.	율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사	2	2	2
5	2018.4.18.	남부순환로(개봉1동사거리주 변)평탄화공사	2	2	2
6	2018.4.17.	밤고개로 확장공사	3	2	2
7	2018.4.19.	신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)	3	1	1
8	2018.4.18.	신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)	3	2	2
9	2018.4.17.	올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사	3	2	2
10	2018.4.19.	성산대교 북단 성능개선공사	2	2	2
11	2018.4.20.	성산대교 남단 성능개선공사	3	2	2
12	2018.4.20.	천호대로(광나루역) 확장공사	3	2	2
13	2018.4.18.	중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사	3	2	2
14	2018.4.20.	동부간선도로확장공사(1공구)	3	1	1

연번	일시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
15	2018.4.18.	동부간선도로확장공사(2공구)	3	2	2
16	2018.4.18.	동부간선도로확장공사(3공구)	3	2	2
17	2018.4.23.	여의교 확장공사	3	2	2
18	2018.4.18.	올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사	3	3	3
19	2018.4.18.	장지지하차도~동부간선도로 연결로 설치공사	3	2	2
20	2018.4.19.	강남순환도시고속도로 4공구 건설공사	3	2	2
21	2018.4.18.	강남순환도시고속도로 8공구 건설공사	3	2	2
22	2018.4.19.	광복교~안양교 도로확장공사	2	2	2
23	2018.4.19.	노들섬 특화공간 조성 토목공사	3	2	2
24	2018.4.18.	동작대로(연장) 중앙버스전용차로 설치공사	3	2	2

점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과
1	월드컵대교 건설공사		
		용접작업 가스용기 MSDS 부착 미흡	용접작업 가스용기 MSDS 부착 완료
			
		용접작업 어스선 피복 불량	용접작업 어스선 피복 보완 완료

연번	공사명	점검내용	조치결과
2	서부간선지하도로 민간투자사업(1공구)		
		전선 피복 손상	손상된 전선 피복 절연조치 완료
			
		굴삭기 전면 유리 균열 발생	굴삭기 전면 유리 교체
3	서부간선지하도로 민간투자사업(2공구)		
		터널 정상방향 시점 환기 뿔주부 파손	파손 환기 뿔주부 보수 완료
			
		산소통 보호캡 미설치	보호캡 설치
			
		분전반 점검통로 미확보 자재적치	분전반 자재이동으로 통로 확보

연번	공사명	점검내용	조치결과
4	울곡로 창경궁앞 도로구조개선공사		
		발판 설치 상태 미흡	발판 교체 설치 완료
			
		안전시설물(가림막) 설치 미흡	안전시설물(가림막) 설치 완료
5	남부순환로(개봉1동 사거리주변)평탄화공 사		
		우회도로안내간판 보수 요망	철거 후 설치 예정
			
		오류IC A1구간 비산먼지 저감 요망	살수 및 청소 완료

연번	공사명	점검내용	조치결과
6	밤고개로 확장공사		
		보도부 PE방호벽 정리요망	PE방호벽 이동 조치 완료
			
		진,출입로와 보행자통로 구분필요	보행자통로 쿠션매트 설치 완료
7	신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)		
		현장 자재 정리 미흡	자재 정리 정돈
8	신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)		
		가설창고 환풍기 외함접지 단락	가설창고 환풍기 외함접지 연결완료
			
		피난연결통로로 이동하는 통로 확보 필요	피난연결통로로 이동하는 통로 설치 완료

연번	공사명	점검내용	조치결과
9	올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사	 램프J2교P3 워킹타워 파이프캡 미설치  J2시점 옹벽 PHC파일 덮개 미설치	 램프J2교P3 워킹타워 파이프캡 설치  J2시점 옹벽 PHC파일 덮개 설치
10	성산대교 북단 성능개선공사	 가교기초 범면부 세굴 등 침식방지 요함  임시 출입문은 일반인이 출입하지 못하도록 상단부까지 연장하여 보강 조치 필요	 범면부 천막설치 완료  상단부까지 연장하여 정비 완료

연번	공사명	점검내용	조치결과
11	성산대교 남단 성능개선공사		
		추락방지 및 출입통제 헨스설치 지시	추락방지 및 출입통제 PE방호벽 설치
			
		적치장 출입통제 및 안전시설물 설치	출입통제 및 PE방호벽 설치
12	천호대로(광나루역) 확장공사		
		맨홀 개구부 덮개설치 부적정	맨홀덮개 규격품 제작설치 완료
			
		이동식 발전기 접지 미실시	접지 및 누전차단기 설치 완료

연번	공사명	점검내용	조치결과
13	중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사	 E/V Pit 개구부 난간 설치 보강	 조치 완료
		 난간대 및 안전계단 설치 미흡	 조치 완료
14	동부간선도로확장공사 (1공구)	 녹천마을 도로개설공사 안전휀스 관리미흡	 녹천마을 도로개설공사 안전휀스 재설치
15	동부간선도로확장공사 (2공구)	 굴삭기 타이어 손상 교체 필요	 굴삭기 타이어 교체 완료
		 부적격 발판 사용으로 전도 위험	 안전발판(말비계)으로 교체 완료

연번	공사명	점검내용	조치결과
16	동부간선도로확장공사 (3공구)		
		작업선 접지선 탈락	접지선 연결 후 작업실시
			
		버킷 이탈방지핀 탈락	버킷 이탈방지핀 장착 후 작업
17	여의교 확장공사		
		소화기 압력불량	소화기 교체
			
		장비 작업시 신호수 미배치	장비 작업시 신호원 배치

연번	공사명	점검내용	조치결과
18	올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사		
		단관 파이프 보호캡 미설치	단관 파이프 보호캡 설치 완료
			
		규격에 맞지 않은 마대 사용	양중고리가 감싸는 형태의 마대로 교체
19	장지지하차도~동부간 선도로 연결로 설치공사		
		굴삭기 협착 방지봉 미사용	굴삭기 협착 방지봉 설치 후 작업 시행
			
현장내 폐기물 정리 불량	폐기물 반출 완료		
작업계단 발판 경사 불량	작업계단 발판 수평으로 수정 완료		

연번	공사명	점검내용	조치결과
20	강남순환도시고속도로 4공구 건설공사	 <p>복공판 난간대 그물망 미설치</p>	 <p>난간대 그물망 설치</p>
		 <p>전선 피복 절연상태 불량</p>	 <p>피복 절연조치완료</p>
21	강남순환도시고속도로 8공구 건설공사	 <p>주형보 받침 빔 모서리 충돌 위험</p>	 <p>주형보 받침빔 모서리부분 보양조치</p>
		 <p>비계(작업발판) 수직재 용접으로 인한 변형</p>	 <p>수직재 단관파이프 보강조치 완료</p>

연번	공사명	점검내용	조치결과
22	광복교~안양교 도로확장공사		
		광복교 날개벽 상단 추락방지 조치	광복교 날개벽 상단 추락방지 난간 설치
			
		보도데크 옹벽 추락방지 조치	보도데크 옹벽 추락방지 난간 설치
23	노들섬 특화공간 조성 토목공사		
		토사 야적상태(안식각) 미흡	토사 야적(안식각) 정리
			
		보행자 이동통로 미설치	보행자 이동통로 설치

연번	공사명	점검내용	조치결과
24	동작대로(연장) 중양버스전용차로 설치공사		
		경계석 설치 후 줄눈몰탈 일부 미시공	줄눈 시공 완료
			
		인도부 줄눈모래 시공 미비	줄눈 시공 보완 완료
