

**2018년 페루 찬차마요시 피차나키 수도시설 개선사업(ODA) PMC용역**

---

# 월 간 공 정 보 고 ( 7 월 )

**2018. 7**

# 목 차

1. 과업명 .....
2. 과업의 목적 .....
3. 과업위치 및 개요 .....
4. 월간 진척 사항 .....
5. 과업 추진현황 .....
6. 예정공정표 .....
6. 월간공정보고(7월) .....

## 별 첨

- 공정보고
- 공사일보

# 1. 과업명

2018년 페루 찬차마요시 피차나키 수도시설 개선사업 (ODA) PMC용역

# 2. 목 적

본 과업은 2018년 페루 찬차마요시 피차나키 지역의 수도시설 개선사업 (ODA)공사에 대하여 발주처의 권한을 대행하여 시공업체가 도급받은 공사를 설계도서 규정대로 시공되는지의 여부를 성실히 감독함으로써 공사에 대한 품질, 공정 및 안전관리 등 시공감리를 시행함에 있음.

# 3. 과업위치 및 개요

**KEYMAP 브라질**

페루

찬차마요

**피차나키 정수장 (금회사업)**

피차나키

배수시설

정수시설

취수시설

**라메르세드 정수장 ('16~'17년 사업완료)**

라메르세드시

**산라몬 정수장 ('13~'15년 사업완료)**

산라몬시

**● 시설개요**

- **과업명** 2018년 페루 찬차마요시 피차나키 수도시설 개선사업(ODA)
- **과업기간** 계약체결 후 ~ 11월 (2017년 4월 ~ 2017년 11월)
- **시행기관** 서울특별시 상수도 사업본부
- **과업내용**

구분	공종	수량	비고
피차나키	착수정	1식	개선
	Floc형성지	1식	개선
	침전지	1식	개선
	여과지	1식	개선
	취수장	1식	개선
	도수관	400m	HDPE 12"

● 시행기관 : 서울특별시 상수도사업본부

● 위 치 : 페루 후닌주 찬차마요시 피차나키 지역

● 과업개요 : 찬차마요시 피차나키 수도시설 개선공사 PMC 용역

● 과업기간 : 2018. 04. 16 - 2018. 11. 30

● 과업범위 :

1) 피차나키 정수장 개선공사(Q=4,800 m<sup>3</sup>/일) - 1 식

- 착수정, 플럭형성지, 침전지, 여과지, 취수장 등 공사

2) 송수관로 설치(HDPE 수도관 D315mm, L = 400m)

- 피차나키 정수장부터 ~ 배수지 송수관로 (D315mm, L=400m) 설치

#### 4. 월간 진척사항(2018. 07)

구분	금회(%)			누계(%)		
	계획	실시	대비	계획	실시	대비
공정율	17	17	100.0	35	35	100.0

#### 5. 과업 추진현황 및 향후 추진계획

##### □ 2018. 05~06 완료 공정

공 종	과업수행내용	날짜
1. 공통	- 찬차마요시&서영 업무협약	4/03
	- 찬차마요시&서영 양해각서(MOU)작성(4/10)	4/10
	- 시공, 감리사 입찰공고	5/9~5/12
	- 시공, 감리사 현장설명회	5/13
	- 시공사 입찰 및 선정, 협상	5/14
	- 시공사 계약 실시(USD 259,310)	5/15
	- 착공식	5/17
	- 피차나키 현장설계 및 EPS 시공범위 협의	5/19~5/21
2. 피차나키 정수시설	- 공사준비	5/28~6/30
	- 기존시설 점검 및 별개제근	
	- 기존 구조물 철거	6/4~6/30
	- 배수관로 측량 및 터파기	6/18~6/30

##### □ 2018. 07 추진 공정

공 종	과업수행내용	날짜
1. 공통	- 관자재 육상운반(리마 -> 피차나키)	7/3
2. 피차나키 정수시설	- 취수시설 개량 및 신설 : 현장정리 및 별개제근	7/1~7/15
	: 취수시설 진출입로 시공	7/2~7/15
	: 암파쇄 및 운반	7/2~7/15
	- Floc 형성지 개량 : 외벽 보수 및 내부 청소	7/2~7/15
	- 침전지 개량 : 내부 및 외부 청소	7/9~7/22
	: 계단 및 외벽 보수	7/16~7/22

# 6. 예정공정표

## 2018년도 수도시설 개선공사 예정공정표

구분	2018년												비고																																																																																								
	4월			5월			6월			7월				8월			9월			10월			11월																																																																														
MILESTONE																																																																																																					
← 공사착공 및 양허각서 체결(5/17) →												← 서울시 최종준공 →																																																																																									
1. 개관 및 착수준비																																																																																																					
가) 현상조사 및 자료수집																																																																																																					
나) 설계기안 협의																																																																																																					
2. 실시설계																																																																																																					
가) 피치나리 정수장 개선공사 실시설계																																																																																																					
나) 용수정호 시범의 실시설계																																																																																																					
다) 양지저 공간조성 계획																																																																																																					
라) 용수정호의 입체산형																																																																																																					
마) 양지저 공간																																																																																																					
3. 양허각서 및 양허신청서 제출(5/17)																																																																																																					
가) 양허각서 작성 및 양허신청서																																																																																																					
나) 양허각서 상형 및 계획																																																																																																					
3. 양허각서 인허가																																																																																																					
피치나리																																																																																																					
4. 피치나리 수도시설 개선공사																																																																																																					
가) 착공준비																																																																																																					
나) 피치나리 정수장																																																																																																					
1) 오폐수조 설치																																																																																																					
2) 정수정호기																																																																																																					
3) 구조물공기 시설 (드래프트, 통풍정호기, 용연기, 양곡기)																																																																																																					
4) 수로정거 및 고지																																																																																																					
5) 기타공사																																																																																																					
다) 용수정호																																																																																																					
1) 용정																																																																																																					
2) 정수정(순수정호)																																																																																																					
3) 구조물(양기정호기, 이통정호기)																																																																																																					
4) 기타공사																																																																																																					
5. 준공																																																																																																					
가) 시공준비 및 준공보고서																																																																																																					
<b>계획</b>												<b>실행</b>																																																																																									
6						12						18						24						30						36						42						48						54						60						66						72						78						84						90						96						100					

## 7. 월 간 공 정 보 고

## 주간 업무 일지

용역명	2018년 페루 찬차마요시 피차나키 수도시설 개선사업(ODA) PMC용역		
용역기간	2018. 04. 16 ~ 2018. 11. 31		
작성일	2018. 07. 02(월요일)		
지난주 수행 사항 (2018. 06. 25 ~ 2018. 07. 01)	금주 수행 계획 (2018. 07. 02 ~ 2018. 07. 08)		
<p><b>1. 피차나키 정수장 현장정리 및 시설개량</b></p> <p>1) 기존 구조물 철거</p> <p>2) 배수관로 인력 터파기 및 부지정지</p>	<p><b>1. 피차나키 정수장 현장정리 및 시설개량</b></p> <p>1) 취수시설 개량 및 신설</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현장 정리 및 별개재근</li> <li>- 취수시설 진출입로 시공</li> <li>- 암파쇄 및 운반</li> </ul>		



## 주간 업무 일지

용역명	2018년 페루 찬차마요시 피차나키 수도시설 개선사업(ODA) PMC용역		
용역기간	2018. 04. 16 ~ 2018. 11. 31		
작성일	2018. 07. 09(월요일)		
지난주 수행 사항 (2018. 07. 02 ~ 2018. 07. 08)		금주 수행 계획 (2018. 07. 09 ~ 2018. 07. 15)	
<p><b>1. 피차나키 정수장 현장정리 및 시설개량</b></p> <p>1) 취수시설 개량 및 신설</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현장 정리 및 별개재근</li> <li>- 취수시설 진출입로 시공</li> <li>- 암파쇄 및 운반</li> </ul>		<p><b>1. 피차나키 정수장 현장정리 및 시설개량</b></p> <p>1) 취수시설 개량 및 신설</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현장 정리 및 별개재근</li> <li>- 취수시설 진출입로 시공</li> <li>- 암파쇄 및 운반</li> </ul> <p>2) 플럭형성지 개량</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외벽 보수</li> <li>- 내부 청소</li> </ul> <p>3) 침전지 개량</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내부 및 외부 청소</li> </ul>	

# 주간 업무 일지

용역명	2018년 페루 찬차마요시 피차나키 수도시설 개선사업(ODA) PMC용역		
용역기간	2018. 04. 16 ~ 2018. 11. 31		
작성일	2018. 07. 16(월요일)		
지난주 수행 사항 (2018. 07. 09 ~ 2018. 07. 15)		금주 수행 계획 (2018. 07. 16 ~ 2018. 07. 22)	
<p><b>1. 피차나키 정수장 현장정리 및 시설개량</b></p> <p>1) 취수시설 개량 및 신설</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현장 정리 및 별개재근</li> <li>- 취수시설 진출입로 시공</li> <li>- 암파쇄 및 운반</li> </ul> <p>2) 플럭형성지 개량</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외벽 보수</li> <li>- 내부 청소</li> </ul> <p>3) 침전지 개량</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내부 및 외부 청소</li> </ul>		<p><b>1. 피차나키 정수장 시설개량</b></p> <p>1) 취수시설 개량 및 신설</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 구조물 철거</li> <li>- 철근 가공 및 조립</li> <li>- 골재운반</li> </ul> <p>2) 플럭형성지 개량</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외벽 보수</li> </ul> <p>3) 여과지 개량</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내부 청소</li> </ul> <p>4) 침전지 개량</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외부 청소</li> <li>- 계단 및 외벽 보수</li> </ul>	

# 주간 업무 일지

용역명	2018년 페루 찬차마요시 피차나키 수도시설 개선사업(ODA) PMC용역		
용역기간	2018. 04. 16 ~ 2018. 11. 31		
작성일	2018. 07. 23(월요일)		
지난주 수행 사항 (2018. 07. 16 ~ 2018. 07. 22)		금주 수행 계획 (2018. 07. 23 ~ 2018. 07. 29)	
<p><b>1. 피차나키 정수장 시설개량</b></p> <p>1) 취수시설 개량 및 신설</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 구조물 철거</li> <li>- 철근 가공 및 조립</li> <li>- 골재운반</li> </ul> <p>2) 플럭형성지 개량</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외벽 보수</li> </ul> <p>3) 여과지 개량</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내부 청소</li> </ul> <p>4) 침전지 개량</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외부 청소</li> <li>- 계단 및 외벽 보수</li> </ul>	<p><b>1. 피차나키 정수장 시설개량</b></p> <p>1) 취수시설 개량 및 신설</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 구조물 철거</li> <li>- 철근 가공 및 조립</li> <li>- 골재운반</li> </ul> <p>2) 플럭형성지 개량</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외벽 보수 및 개량</li> </ul> <p>3) 여과지 개량</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내부 벽체 보수 및 개량</li> <li>- 여과서 구매준비</li> </ul> <p>4) 침전지 개량</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 벽체 보수 및 개량</li> </ul>		

# 별첨

# ■공 정 보 고

**INFORME DIARIO**

Nombre del Proyecto:	"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAQUI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"
Financiamiento:	DONACION DEL GOBIERNO METROPOLITANO DE SEUL - COREA DEL SUR
Contratistas:	SEO YOUNG ENGINEERING CO., LTD
Plazo de Ejecución:	160 DIAS CALENDARIOS
Fecha :	<b>2018-07-02</b>

**I.- GENERALIDADES**

**1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO**

1.1.1.- Ubicación

Departamento:

Distrito:

Dirección y Ubicación:

JUNÍN

Provincia:

PICHANAQUI

PICHANAQUI

CHANCHAMAYO

**II.- EJECUCIÓN DE OBRA**

2.1.-PERSONAL: 01 MAESTRO DE OBRA, 10 PEONES

2.2.- TRABAJOS EJECUTADOS

1.- LIMPIEZA DE TERRENO (ELIMINACIÓN DE MALEZAS)

1.- APERTURA DE ACCESO A CAPTACION DE AGUA CON MAQUINARIA

2.3.- OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA

## INFORME DIARIO

### III.- DOCUMENTACION 3.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA


	<p>Fecha de la fotografía: 02 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad. ELIMINACION DE MALEZAS (LIMPIEZA DE TERRENO)</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"</p>
---	--

**INFORME DIARIO**


	<p>02 DE JULIO DEL 2018</p> <p>APERTURA DE ACCESO A CAPTACION DE AGUA CON MAQUINARIA</p> <p>"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"</p>
<p>Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad.</p>	<p>Nombre del Proyecto:</p>



**INFORME DIARIO**

	<p>Fecha de la fotografía: 02 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando y la actividad: ELIMINACION DE MALEZAS (LIMPIEZA DE TERRENO) "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"</p> <p>Nombre del Proyecto:</p>
---	--

**INFORME DIARIO**

	<p>02 DE JULIO DEL 2018</p> <p>ELIMINACION DE MALEZAS (LIMPIEZA DE TERRENO)</p> <p>"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE LA CAPTACION DE UYARIKI, PICHANAQI- CHANCHAMAYO- JUNIN"</p>
<p>Fecha de la fotografía:</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad</p> <p>Nombre del Proyecto:</p>	

## INFORME DIARIO

	"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAQUI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"
Financiamiento:	DONACION DEL GOBIERNO METROPOLITANO DE SEUL - COREA DEL SUR
Contratistas:	SEO YOUNG ENGINEERING CO., LTD
Plazo de Ejecución:	160 DIAS CALENDARIOS
Fecha:	<b>2018-07-03</b>

JUNÍN	Provincia:	CHANCHAMAYO
PICHANAQUI	Distrito:	
PICHANAQUI	Dirección y Ubicación:	

**I.- GENERALIDADES**

**1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO**

1.1.1.- Ubicación

Departamento:

Distrito:

Dirección y Ubicación:

**II.- EJECUCIÓN DE OBRA**

2.1.-PERSONAL: 01 MAESTRO DE OBRA, 10 PEONES

2.2.- TRABAJOS EJECUTADOS

1.- APERTURA DE ACCESO A CAPTACION DE AGUA CON MAQUINARIA

2.- LIMPIEZA DE TERRENO

2.3.- OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA

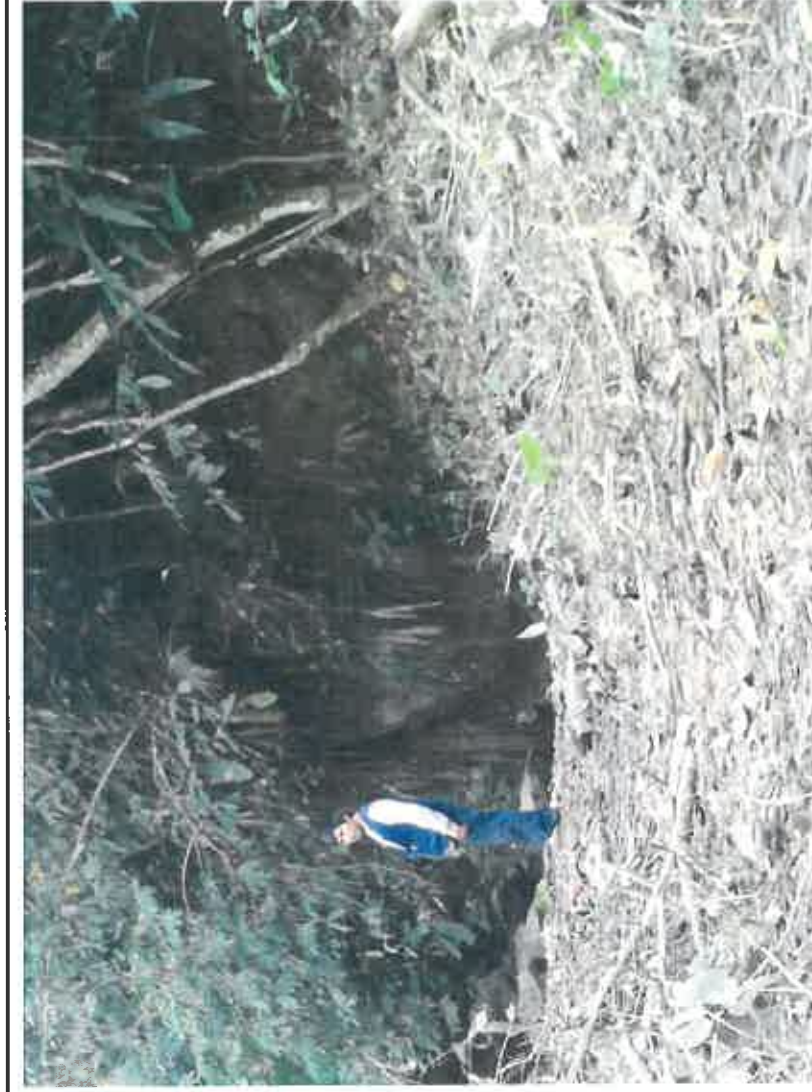
## INFORME DIARIO

### III.- DOCUMENTACION 3.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA

	<p>03 DE JULIO DEL 2018</p> <p>APERTURA DE ACCESO A CAPTACION DE AGUA CON MAQUINARIA</p> <p>"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE LA CAPTACION DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNIN"</p>
<p>Fecha de la fotografía:</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad.</p> <p>Nombre del Proyecto:</p>	



**INFORME DIARIO**



Fecha de la fotografía: 03 DE JULIO DEL 2018	Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad.
Nombre del Proyecto:	"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"

**INFORME DIARIO**



Fecha de la fotografía:	03 DE JULIO DEL 2018
Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando y la actividad.	APERTURA DE ACCESO A CAPTACION DE AGUA CON MAQUINARIA
Nombre del Proyecto:	"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"

## INFORME DIARIO

<b>Nombre del Proyecto:</b>	"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAQUI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"
<b>Financiamiento:</b>	DONACION DEL GOBIERNO METROPOLITANO DE SEUL - COREA DEL SUR
<b>Contratistas:</b>	SEO YOUNG ENGINEERING CO., LTD
<b>Plazo de Ejecución:</b>	160 DIAS CALENDARIOS
<b>Fecha :</b>	<b>2018-07-04</b>

### I.- GENERALIDADES

#### 1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.1.- Ubicación

Departamento:

Distrito:

Dirección y Ubicación:

JUNÍN

PICHANAQUI

PICHANAQUI

Provincia:

CHANCHAMAYO

### II.- EJECUCIÓN DE OBRA

2.1.-PERSONAL: 01 MAESTRO DE OBRA, 10 PEONES

2.2.- TRABAJOS EJECUTADOS

1.- APERTURA DE ACCESO A CAPTACION DE AGUA CON MAQUINARIA

2.3.- OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

CLIMA: SOLEADO

## INFORME DIARIO

### III.- DOCUMENTACION 3.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA

	<p>Fecha de la fotografía: 04 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando y la actividad. APERTURA DE ACCESO CON MAQUINARIA</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNIN"</p>
---	---



**INFORME DIARIO**



Fecha de la fotografía:	04 DE JULIO DEL 2018
Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando y la actividad.	APERTURA DE ACCESO CON MAQUINARIA "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"
Nombre del Proyecto:	

**INFORME DIARIO**

	<p>Fecha de la fotografía: 04 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando y la actividad: APERTURA DE ACCESO CON MAQUINARIA</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNIN"</p>
---	---

**INFORME DIARIO**

	<p>Fecha de la fotografía: 04 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad APERTURA DE ACCESO CON MAQUINARIA</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"</p>
---	--

## INFORME DIARIO

Nombre del Proyecto:
Financiamiento:
Contratistas:
Plazo de Ejecución:
Fecha :

"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAQUI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"
DONACION DEL GOBIERNO METROPOLITANO DE SEUL. - COREA DEL SUR
SEO YOUNG ENGINEERING CO., LTD
160 DIAS CALENDARIOS
2018-07-05

### I.- GENERALIDADES

#### 1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

##### 1.1.1.- Ubicación

Departamento:

Distrito:

Dirección y Ubicación:

JUNÍN

Provincia:

PICHANAQUI

CHANCHAMAYO

PICHANAQUI

### II.- EJECUCIÓN DE OBRA

#### 2.1.-PERSONAL: 01 MAESTRO DE OBRA, 10 PEONES

#### 2.2.- TRABAJOS EJECUTADOS

##### 1.- LIMPIEZA DE TERRENO (ELIMINACIÓN DE MALEZAS)

##### 1.-APERTURA DE ACCESO A CAPTACION DE AGUA (VOLADURA DE ROCAS)

#### 2.3.- OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA

**INFORME DIARIO**

**III.- DOCUMENTACION**  
**3.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA**

	<p>Fecha de la fotografía: 05 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad APERTURA DE ACCESO A CAPTACION DE AGUA (VOLADURA DE ROCAS)</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"</p>
---	---

**INFORME DIARIO**

	Fecha de la fotografía: 05 DE JULIO DEL 2018
Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando y la actividad.	LIMPIEZA DE TERRENO
Nombre del Proyecto:	"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"



## INFORME DIARIO

Nombre del Proyecto:
Financiamiento:
Contratistas:
Plazo de Ejecución:
Fecha :

"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAQUI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"
DONACION DEL GOBIERNO METROPOLITANO DE SEUL - COREA DEL SUR
SEO YOUNG ENGINEERING CO., LTD
160 DIAS CALENDARIOS
<b>2018-07-06</b>

### I.- GENERALIDADES

#### 1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.1.- Ubicación

Departamento:

Distrito:

Dirección y Ubicación:

JUNÍN

Provincia:

PICHANAQUI

CHANCHAMAYO

PICHANAQUI

### II.- EJECUCIÓN DE OBRA

2.1.-PERSONAL: 01 MAESTRO DE OBRA, 10 PEONES

2.2.- TRABAJOS EJECUTADOS

1.- ACARREO DE PIEDRAS A OBRA

2.- LIMPIEZA DE TERRENO

2.3.- OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA

**INFORME DIARIO**

**III.- DOCUMENTACION**  
**3.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA**

	<p>Fecha de la fotografía: 06 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta LIMPIEZA DE TERRENO</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNIN"</p>
---	--



**INFORME DIARIO**

	<p>Fecha de la fotografía: 06 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad. ACARREO DE PIEDRAS</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"</p>
---	--

## INFORME DIARIO

<b>Nombre del Proyecto:</b>	"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAQUI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"
<b>Financiamiento:</b>	DONACION DEL GOBIERNO METROPOLITANO DE SEUL - COREA DEL SUR
<b>Contratistas:</b>	SEO YOUNG ENGINEERING CO., LTD
<b>Plazo de Ejecución:</b>	160 DIAS CALENDARIOS
<b>Fecha :</b>	2018-07-07

### I.- GENERALIDADES

#### 1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.1.- Ubicación

Departamento:

Distrito:

Dirección y Ubicación:

JUNÍN

Provincia:

PICHANAQUI

CHANCHAMAYO

PICHANAQUI

### II.- EJECUCIÓN DE OBRA

2.1.-PERSONAL: 01 MAESTRO DE OBRA, 10 PEONES

2.2.- TRABAJOS EJECUTADOS

1.- APERTURA DE ACCESO A CAPTACION DE AGUA CON MAQUINARIA

2.- VOLADURA DE ROCAS


3.- LIMPIEZA DE TERRENO

2.3.- OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

CLIMA: SOLEADO

**INFORME DIARIO**

**III.- DOCUMENTACION**  
**3.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA**

	<p>Fecha de la fotografía: 07 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad. APERTURA DE ACCESO CON MAQUINARIA</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNIN"</p>
---	---

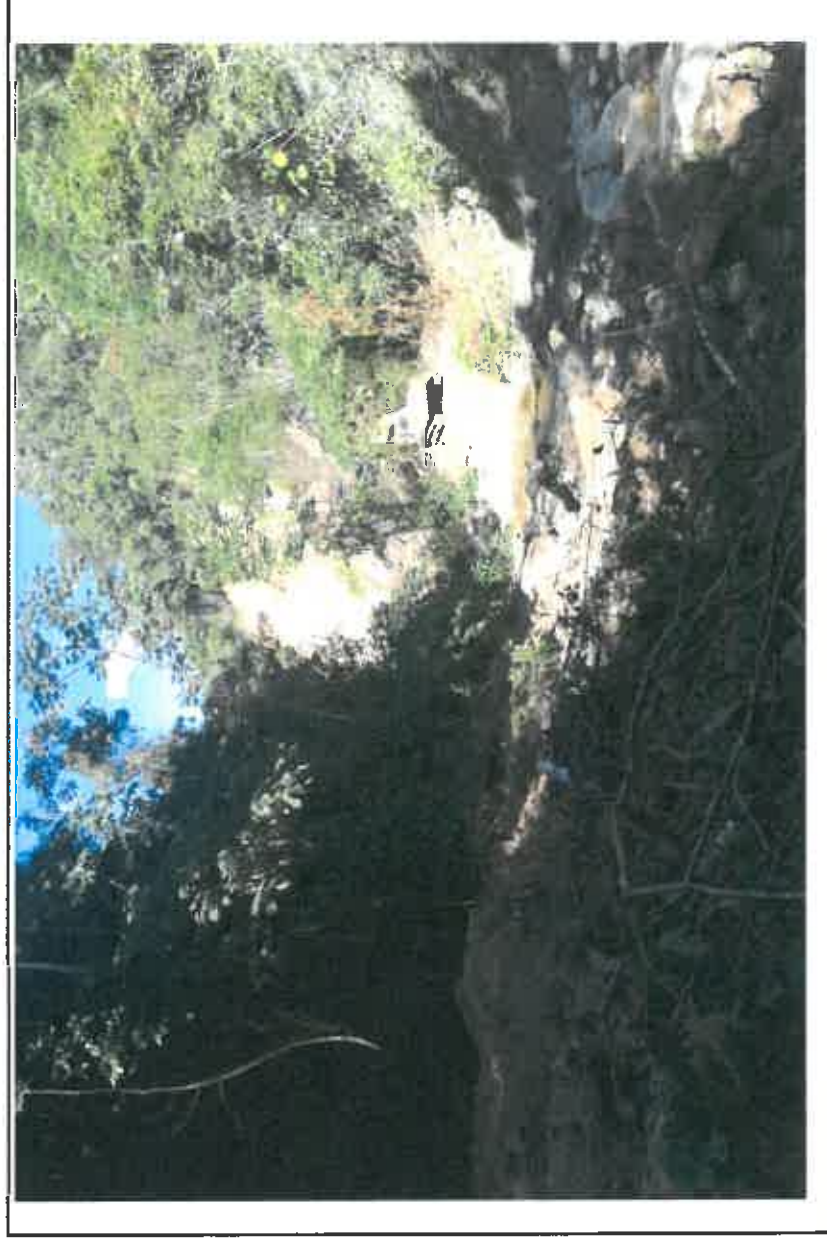
**INFORME DIARIO**



Fecha de la fotografía:	07 DE JULIO DEL 2018
Describir la fotografía, indicando cual es la partida que se está	VOZADURA DE ROCAS "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"
Nombre del Proyecto:	



**INFORME DIARIO**

	<p>Fecha de la fotografía: 07 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad APERTURA DE ACCESO CON MAQUINARIA</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNIN"</p>
---	--

**INFORME DIARIO**

	<p>Fecha de la fotografía: 07 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad LIMPIEZA DE TERRENO</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"</p>
---	--

## INFORME DIARIO

Nombre del Proyecto:
Financiamiento:
Contratistas:
Plazo de Ejecución:
Fecha :

"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAQUI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"
DONACION DEL GOBIERNO METROPOLITANO DE SEUL - COREA DEL SUR
SEO YOUNG ENGINEERING CO., LTD
160 DIAS CALENDARIOS
<b>2018-07-09</b>

### I.- GENERALIDADES

#### 1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.1.- Ubicación

Departamento:

Distrito:

Dirección y Ubicación:

JUNÍN

Provincia:

PICHANAQUI

PICHANAQUI

CHANCHAMAYO

### II.- EJECUCIÓN DE OBRA

2.1.-PERSONAL: 01 MAESTRO DE OBRA, 10 PEONES

2.2.- TRABAJOS EJECUTADOS

1.- REPARACIÓN DE MAQUINARIA

1.-APERTURA DE ACCESO A CAPTACION DE AGUA (VOLADURA DE ROCAS)

2.3.- OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA

**INFORME DIARIO**

**III.- DOCUMENTACION**  
**3.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA**

	<p>09 DE JULIO DEL 2018</p>
<p>Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad.</p>	<p>REPARACION DE MAQUINARIA</p>
<p>Nombre del Proyecto:</p>	<p>"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE LA CAPTACION DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNIN"</p>



**INFORME DIARIO**



Fecha de la fotografía:	09 DE JULIO DEL 2018
Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta reparando	REPARACION DE MAQUINARIA
Nombre del Proyecto:	"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE LA CAPTACION DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNIN"

**INFORME DIARIO**

	<p>Fecha de la fotografía: 09 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta REPARACION DE MAQUINARIA</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNIN"</p>
---	---

**INFORME DIARIO**



Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta	09 DE JULIO DEL 2018 APERTURA DE ACCESO A CAPTACIÓN DE AGUA
Nombre del Proyecto:	"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANARI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"

## INFORME DIARIO

<b>Nombre del Proyecto:</b>	"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAQUI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"
<b>Financiamiento:</b>	DONACION DEL GOBIERNO METROPOLITANO DE SEUL - COREA DEL SUR
<b>Contratistas:</b>	SEO YOUNG ENGINEERING CO., LTD
<b>Plazo de Ejecución:</b>	160 DIAS CALENDARIOS
<b>Fecha :</b>	<b>2018-07-10</b>

### I.- GENERALIDADES

#### 1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.1.- Ubicación

Departamento:

Distrito:

Dirección y Ubicación:

JUNÍN

Provincia:

PICHANAQUI

PICHANAQUI

CHANCHAMAYO

### II.- EJECUCIÓN DE OBRA

2.1.-PERSONAL: 01 MAESTRO DE OBRA, 10 PEONES

2.2.- TRABAJOS EJECUTADOS

1.- APERTURA DE ACCESO A CAPTACIÓN DE AGUA

2.- LIMPIEZA DE TERRENO

2.3.- OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA

**INFORME DIARIO**

**III.- DOCUMENTACION  
3.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA**

	<p>Fecha de la fotografía: 10 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta APERTURA DE ACCESO A CAPTACION DE AGUA</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE LA CAPTACION DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNIN"</p>
---	--



**INFORME DIARIO**

	<p>10 DE JULIO DEL 2018</p>
<p>Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta</p>	<p>APERTURA DE ACCESO A CAPTACION DE AGUA CON MAQUINARIA</p>
<p>Nombre del Proyecto:</p>	<p>"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"</p>

**INFORME DIARIO**

	Fecha de la fotografía: 10 DE JULIO DEL 2018
Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se ejecutando v. la actividad.	APERTURA DE ACCESO A CAPTACION DE AGUA
Nombre del Proveedor:	"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAUKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"



## INFORME DIARIO

<b>Nombre del Proyecto:</b>	"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAQUI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"
<b>Financiamiento:</b>	DONACION DEL GOBIERNO METROPOLITANO DE SEUL - COREA DEL SUR
<b>Contratistas:</b>	SEO YOUNG ENGINEERING CO., LTD
<b>Plazo de Ejecución:</b>	160 DIAS CALENDARIOS
<b>Fecha :</b>	2018-07-11

### I.- GENERALIDADES

#### 1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.1.- Ubicación

Departamento:

Distrito:

Dirección y Ubicación:

JUNÍN

Provincia:

PICHANAQUI

CHANCHAMAYO

PICHANAQUI

### II.- EJECUCIÓN DE OBRA

2.1.-PERSONAL: 01 MAESTRO DE OBRA, 10 PEONES

#### 2.2.- TRABAJOS EJECUTADOS

1.- APERTURA DE ACCESO A CAPTACION DE AGUA CON MAQUINARIA

2.- REPARACIÓN DE MAQUINARIA

3.- LIMPIEZA DE TERRENO

2.3.- OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

CLIMA: SOLEADO

**INFORME DIARIO**

**III.- DOCUMENTACION  
3.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA**

	<p>Fecha de la fotografía: 11 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad. APERTURA DE ACCESO CON MAQUINARIA</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE LA CAPTACION DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNIN"</p>
---	---

**INFORME DIARIO**



Fecha de la fotografía:	11 DE JULIO DEL 2018
Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta	REPARACIÓN DE MAQUINARIA
Nombre del Proyecto:	"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"

**INFORME DIARIO**

	<p>Fecha de la fotografía: 11 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad. REPARACIÓN DE MAQUINARIA</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"</p>
---	--



**INFORME DIARIO**



Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad.	11 DE JULIO DEL 2018 LIMPIEZA DE TERRENO
Nombre del Proyecto:	"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNIN"

## INFORME DIARIO

Nombre del Proyecto:	
Financiamiento:	
Contratistas:	
Plazo de Ejecución:	
Fecha :	

"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAQUI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"
DONACION DEL GOBIERNO METROPOLITANO DE SEUL - COREA DEL SUR
SEO YOUNG ENGINEERING CO., LTD
160 DIAS CALENDARIOS
<b>2018-07-12</b>

### I.- GENERALIDADES

#### 1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

##### 1.1.1.- Ubicación

Departamento:

Distrito:

Dirección y Ubicación:

JUNÍN

PICHANAQUI

PICHANAQUI

Provincia:

CHANCHAMAYO

### II.- EJECUCIÓN DE OBRA

#### 2.1.-PERSONAL: 01 MAESTRO DE OBRA, 10 PEONES

#### 2.2.- TRABAJOS EJECUTADOS

- 1.- APERTURA DE ACCESO A CAPTACION DE AGUA CON MAQUINARIA
- 1.-APERTURA DE ACCESO A CAPTACION DE AGUA (VOLADURA DE ROCAS)

#### 2.3.- OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA



## INFORME DIARIO

### III.- DOCUMENTACION 3.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA

 A yellow excavator is positioned on a rocky riverbank, working on a muddy stream. The excavator's arm is extended towards the water. The surrounding area is densely forested with green trees and vegetation. The water in the stream is brown and turbulent, flowing over rocks.	
Fecha de la fotografía: 12 DE JULIO DEL 2018	Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta APERTURA DE ACCESO A CAPTACION DE AGUA CON MAQUINARIA
Nombre del Proyecto:	"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNIN"

**INFORME DIARIO**



Fecha de la fotografía: 12 DE JULIO DEL 2018	12 DE JULIO DEL 2018
Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando y la actividad.	APERTURA DE ACCESO A CAPTACION DE AGUA CON MAQUINARIA
Nombre del Proyecto:	"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"

**INFORME DIARIO**

	Fecha de la fotografía: 12 DE JULIO DEL 2018
Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad.	APERTURA DE ACCESO A CAPTACION DE AGUA CON MAQUINARIA
Nombre del Proyecto:	"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANARI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"



**INFORME DIARIO**

	<p>Fecha de la fotografía: 12 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad. APERTURA DE ACCESO A CAPTACIÓN DE AGUA</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"</p>
---	--

## INFORME DIARIO

Nombre del Proyecto:
Financiamiento:
Contratistas:
Plazo de Ejecución:
Fecha :

"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAQUI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"
DONACION DEL GOBIERNO METROPOLITANO DE SEUL - COREA DEL SUR
SEO YOUNG ENGINEERING CO., LTD
160 DIAS CALENDARIOS
<b>2018-07-13</b>

### I.- GENERALIDADES

#### 1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.1.- Ubicación

Departamento:

Distrito:

Dirección y Ubicación:

JUNÍN

Provincia:

PICHANAQUI

CHANCHAMAYO

PICHANAQUI

### II.- EJECUCIÓN DE OBRA

2.1.-PERSONAL: 01 MAESTRO DE OBRA, 10 PEONES

2.2.- TRABAJOS EJECUTADOS

1.- APERTURA DE ACCESO A CAPTACIÓN DE AGUA

2.- LIMPIEZA DE TERRENO

2.3.- OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA

**INFORME DIARIO**

**III.- DOCUMENTACION  
3.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA**




Fecha de la fotografía:	13 DE JULIO DEL 2018
Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta	APERTURA DE ACCESO A CAPTACIÓN DE AGUA CON MAQUINARIA
Nombre del Proyecto:	"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAYI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"



**INFORME DIARIO**

 <p>A yellow New Holland excavator is shown in a rugged, rocky environment. The excavator is positioned next to a structure made of corrugated metal sheets. The background consists of a steep, rocky slope with some sparse vegetation. The excavator has the text "NEW HOLLAND" and "Para obtener... para todos" visible on its side.</p>	<p>Fecha de la fotografía: 13 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad. APERTURA DE ACCESO A CAPTACION DE AGUA CON MAQUINARIA</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACION DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNIN"</p>
---	---

**INFORME DIARIO**

	<p>Fecha de la fotografía: 13 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando y la actividad. APERTURA DE ACCESO A CAPTACION DE AGUA</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"</p>
---	---

**INFORME DIARIO**

	<p>Fecha de la fotografía: 13 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando y la actividad. APERTURA DE ACCESO A CAPTACION DE AGUA</p> <p>Nombre del Proveedor: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"</p>
---	---

## INFORME DIARIO

Nombre del Proyecto:	
Financiamiento:	
Contratistas:	
Plazo de Ejecución:	
Fecha :	

"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAQUI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"
DONACION DEL GOBIERNO METROPOLITANO DE SEUL - COREA DEL SUR
SEO YOUNG ENGINEERING CO., LTD
160 DIAS CALENDARIOS
<b>2018-07-14</b>

### I.- GENERALIDADES

#### 1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

##### 1.1.1.- Ubicación

Departamento:

Distrito:

Dirección y Ubicación:

JUNÍN

PICHANAQUI

PICHANAQUI

Provincia:

CHANCHAMAYO

### II.- EJECUCIÓN DE OBRA

#### 2.1.-PERSONAL: 01 MAESTRO DE OBRA, 10 PEONES

#### 2.2.- TRABAJOS EJECUTADOS

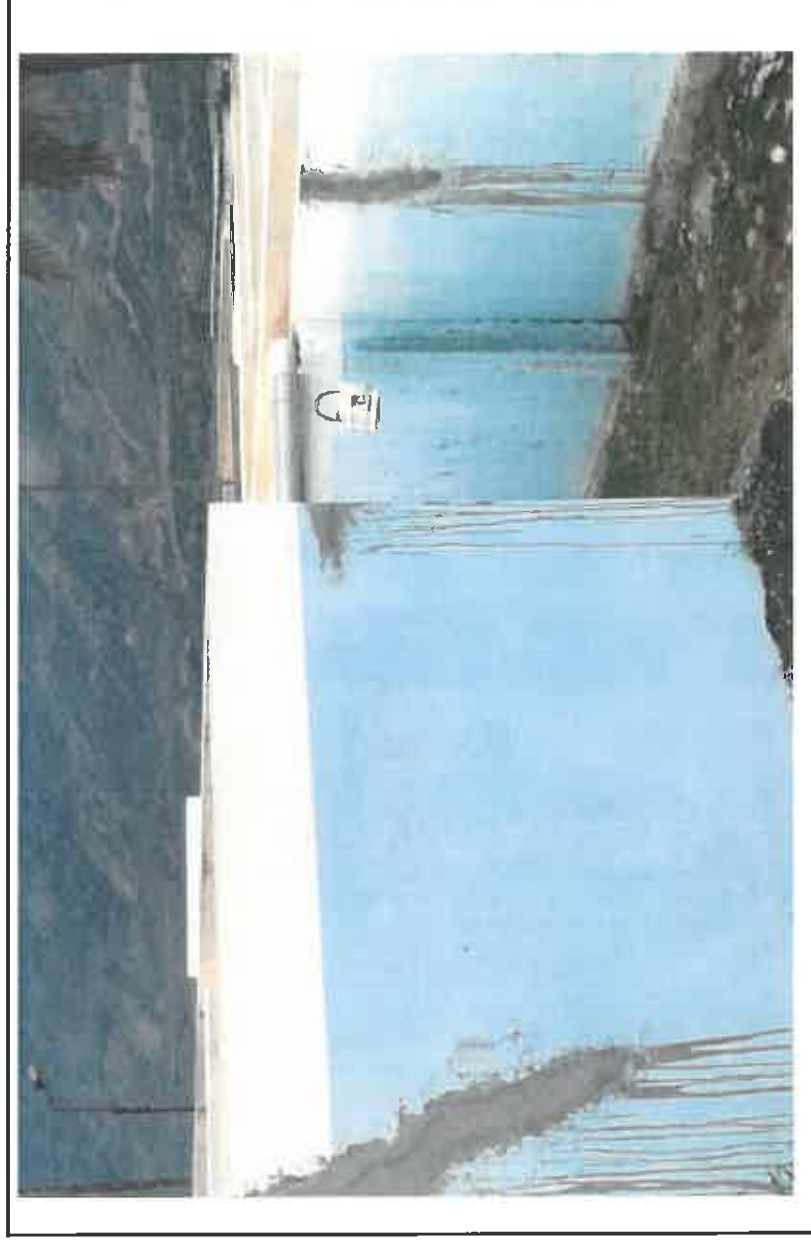
- 1.- RESANE DE MUROS EXTERIORES DE TANQUE DE FLOCULADORES
- 2.- LIMPIEZA DE TANQUE DE FLOCULARES
- 3.- LIMPIEZA DE TANQUE

#### 2.3.- OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

CLIMA: SOLEADO

## INFORME DIARIO

### III.- DOCUMENTACION 3.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA

	<p>Fecha de la fotografía: 14 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad. RESANE DE MUROS EXTERIORES DE TANQUE DE FLOCULADORES</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNIN"</p>
---	--



**INFORME DIARIO**

	<p>Fecha de la fotografía: 14 DE JULIO DEL 2018</p>
<p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad</p>	<p>Limpeza de tanque</p>
<p>Nombre del Proyecto:</p>	<p>"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"</p>

**INFORME DIARIO**

	<p>Fecha de la fotografía: 14 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad. LIMPIEZA DE TANQUE DE FLOCULADORES</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"</p>
---	--

**INFORME DIARIO**

	<p>Fecha de la fotografía: 14 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad LIMPIEZA DE TANQUES INTERIORES Y EXTERIORES</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"</p>
---	---

## INFORME DIARIO

Nombre del Proyecto:	
Financiamiento:	
Contratistas:	
Plazo de Ejecución:	
Fecha :	

"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAQUI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"
DONACION DEL GOBIERNO METROPOLITANO DE SEUL - COREA DEL SUR
SEO YOUNG ENGINEERING CO., LTD
160 DIAS CALENDARIOS
<b>2018-07-16</b>

### I.- GENERALIDADES

#### 1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

##### 1.1.1.- Ubicación

Departamento:

Distrito:

Dirección y Ubicación:

JUNÍN

PICHANAQUI

PICHANAQUI

Provincia:

CHANCHAMAYO

### II.- EJECUCIÓN DE OBRA

#### 2.1.-PERSONAL: 01 MAESTRO DE OBRA, 10 PEONES

#### 2.2.- TRABAJOS EJECUTADOS

1.- RESANE DE PAREDES

2.- LIMPIEZA INTERIOR DEL LECHO FILTRANTE

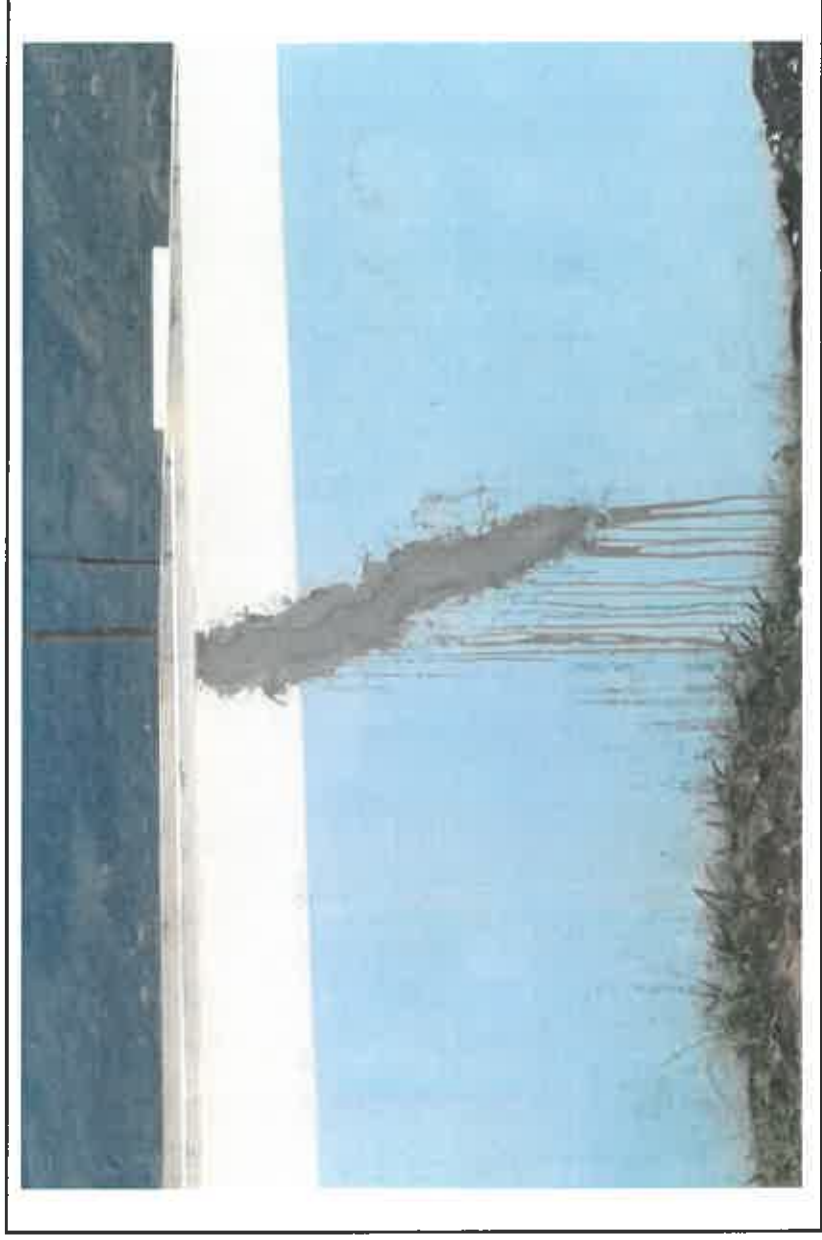
3.- LIMPIEZA EXTERIOR DE PLANTA DE AGUA

#### 2.3.- OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA

## INFORME DIARIO

### III.- DOCUMENTACION 3.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA

	<p>Fecha de la fotografía: 16 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta RESANE DE PAREDES</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE DYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"</p>
---	--




**INFORME DIARIO**



Fecha de la fotografía:	16 DE JULIO DEL 2018
Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad	LIMPIEZA INTERIOR DEL LECHO FILTRANTE "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"
Nombre del Proyecto:	

**INFORME DIARIO**

	<p>Fecha de la fotografía: 16 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta RESANE DE PAREDES</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNIN"</p>
---	--

## INFORME DIARIO

	<p>Fecha de la fotografía: 16 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta LIMPIEZA EXTERIOR DE PLANTA DE AGUA</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"</p>
---	--

**INFORME DIARIO**

	<p>Fecha de la fotografía: 11 de JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando y la actividad LIMPIEZA DE TANQUES</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNIN"</p>
---	--

## INFORME DIARIO

Nombre del Proyecto:
Financiamiento:
Contratistas:
Plazo de Ejecución:
Fecha :

"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAQUI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"
DONACION DEL GOBIERNO METROPOLITANO DE SEUL - COREA DEL SUR
SEO YOUNG ENGINEERING CO., LTD
160 DIAS CALENDARIOS
<b>2018-07-17</b>

### I.- GENERALIDADES

#### 1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.1.- Ubicación

Departamento:

Distrito:

Dirección y Ubicación:

JUNÍN

PICHANAQUI

PICHANAQUI

Provincia:

CHANCHAMAYO

### II.- EJECUCIÓN DE OBRA

2.1.-PERSONAL: 01 MAESTRO DE OBRA, 10 PEONES

2.2.- TRABAJOS EJECUTADOS

1.- RESANE DE PISOS Y PAREDES

2.- LIMPIEZA DE TANQUE EN PLANTA DE AGUA

2.3.- OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA



**INFORME DIARIO**

**III.- DOCUMENTACION**  
**3.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA**

	<p>Fecha de la fotografía: 17 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta RESANE DE PISOS</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNIN"</p>
---	--

**INFORME DIARIO**

	<p>Fecha de la fotografía: 17 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta RESANE Y TARRAJEO DE PAREDES</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE IYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"</p>
---	---

**INFORME DIARIO**

	17 DE JULIO DEL 2018 LIMPIEZA DE TANQUE
Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando y la actividad.	"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"
Nombre del Proyecto:	

## INFORME DIARIO

Nombre del Proyecto:	
Financiamiento:	
Contratistas:	
Plazo de Ejecución:	
Fecha :	

"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAQUI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"
DONACION DEL GOBIERNO METROPOLITANO DE SEUL - COREA DEL SUR
SEO YOUNG ENGINEERING CO., LTD
160 DIAS CALENDARIOS
<b>2018-07-18</b>

### I.- GENERALIDADES

#### 1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

##### 1.1.1.- Ubicación

Departamento:

Distrito:

Dirección y Ubicación:

JUNÍN

PICHANAQUI

PICHANAQUI

Provincia:

CHANCHAMAYO

### II.- EJECUCIÓN DE OBRA

#### 2.1.-PERSONAL: 01 MAESTRO DE OBRA, 10 PEONES

#### 2.2.- TRABAJOS EJECUTADOS

1.- ACARREO DE AGREGADOS A CAPTACION

2.-TARRAJEO DE PAREDES

3.- LIMPIEZA INTERIOR DE LECHO FILTRANTE

#### 2.3.- OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

CLIMA: SOLEADO

**INFORME DIARIO**

**III.- DOCUMENTACION**  
**3.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA**

	<p>Fecha de la fotografía: 18 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad. ACARREO DE AGREGADOS A CAPTACION</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE LA CAPTACION DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNIN"</p>
---	--



**INFORME DIARIO**



Fecha de la fotografía:	18 DE JULIO DEL 2018
Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad.	TARRAJEO DE PAREDES EN PLANTA DE AGUA
Nombre del Proyecto:	"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"



**INFORME DIARIO**

	<p>Fecha de la fotografía: 18 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando y la actividad. LIMPIEZA INTERIOR DE LECHO FILTRANTE</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNIN"</p>
---	---

**INFORME DIARIO**

Nombre del Proyecto:
Financiamiento:
Contratistas:
Plazo de Ejecución:
Fecha :

"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAQUI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"
DONACION DEL GOBIERNO METROPOLITANO DE SEUL - COREA DEL SUR
SEO YOUNG ENGINEERING CO., LTD
160 DIAS CALENDARIOS
<b>2018-07-19</b>

**I.- GENERALIDADES**

**1.- 1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO**

1.1.1.- Ubicación

Departamento:

Distrito:

Dirección y Ubicación:

JUNÍN

Provincia:

PICHANAQUI

CHANCHAMAYO

PICHANAQUI

**II.- EJECUCIÓN DE OBRA**

2.1.-PERSONAL: 01 MAESTRO DE OBRA, 10 PEONES

2.2.- TRABAJOS EJECUTADOS

1.- DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE

2.- AMARRE DE ACERO CORRUGADO PARA DESARENADOR

2.3.- OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA

## INFORME DIARIO

### III.- DOCUMENTACION 3.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA

	<p>Fecha de la fotografía: 19 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad. DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"</p>
---	--

**INFORME DIARIO**

	<p>Fecha de la fotografía: 19 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando y la actividad. AMARRE DE ACERO CORRUGADO</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"</p>
---	---



**INFORME DIARIO**

	<p>Fecha de la fotografía: 19 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad. AMARRE DE ACERO CORRUGADO PARA DESARENADOR</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNIN"</p>
---	--

## INFORME DIARIO

Nombre del Proyecto:
Financiamiento:
Contratistas:
Plazo de Ejecución:
Fecha :

"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAQUI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"
DONACION DEL GOBIERNO METROPOLITANO DE SEUL - COREA DEL SUR
SEO YOUNG ENGINEERING CO., LTD
160 DIAS CALENDARIOS
<b>2018-07-20</b>

### I.- GENERALIDADES

#### 1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

##### 1.1.1.- Ubicación

Departamento:

Distrito:

Dirección y Ubicación:

JUNÍN

PICHANAQUI

PICHANAQUI

Provincia:

CHANCHAMAYO

### II.- EJECUCIÓN DE OBRA

#### 2.1.-PERSONAL: 01 MAESTRO DE OBRA, 10 PEONES

#### 2.2.- TRABAJOS EJECUTADOS

1.- AMARRE DE ACERO PARA CONSTRUCCION DE DESARENADOR

2.- ACARREO DE AGREGADOS A OBRA

#### 2.3.- OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA



## INFORME DIARIO

### III.- DOCUMENTACION 3.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA

	<p>Fecha de la fotografía: 20 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando y la actividad. "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"</p> <p>Nombre del Proyecto: AMARRE DE ACERO PARA CONSTRUCCION DE DESARENADOR</p>
---	--

**INFORME DIARIO**

	<p>Fecha de la fotografía: 20 DE JULIO DEL 2018</p> <p>Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad. ACARREO DE AGREGADOS A OBRA</p> <p>Nombre del Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"</p>
---	---

**INFORME DIARIO**

	ZO DE JULIO DEL 2018
Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando y la actividad.	AMARRE DE ACERO PARA CONSTRUCCION DE DESARENADOR
Nombre del Proyecto:	"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"

**INFORME DIARIO**

Nombre del Proyecto:	
Financiamiento:	
Contratistas:	
Plazo de Ejecución:	
Fecha :	

"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAQUI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"
DONACION DEL GOBIERNO METROPOLITANO DE SEUL - COREA DEL SUR
SEO YOUNG ENGINEERING CO., LTD
160 DIAS CALENDARIOS
<b>2018-07-21</b>

**I.- GENERALIDADES**

**1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO**

1.1.1.- Ubicación

Departamento:

Distrito:

Dirección y Ubicación:

JUNÍN

PICHANAQUI

PICHANAQUI

Provincia:

CHANCHAMAYO

**II.- EJECUCIÓN DE OBRA**

2.1.-PERSONAL: 01 MAESTRO DE OBRA, 10 PEONES

2.2.- TRABAJOS EJECUTADOS

1.- ACARREO DE AGREGADOS A CAPTACION

2.3.- OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

CLIMA: SOLEADO



## INFORME DIARIO

### III.- DOCUMENTACION 3.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA

	<p>21 DE JULIO DEL 2018</p>
<p>Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta seleccionando y la actividad.</p>	<p>ACARREO DE AGREGADOS A CAPTACION</p>
<p>Nombre del Proyecto:</p>	<p>"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE LA CAPTACION DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNIN"</p>


**INFORME DIARIO**



Fecha de la fotografía:	21 DE JULIO DEL 2018
Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad	ACARREO DE AGREGADOS A CAPTACION
Nombre del Proyecto:	"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANAKI- CHANCHAMAYO- JUNIN"



**INFORME DIARIO**

	
Fecha de la fotografía: 21 DE JULIO DEL 2018	21 DE JULIO DEL 2018
Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando y la actividad.	AGREGADO PARA CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA
Nombre del Proyecto:	"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE UYARIKI, PICHANANI- CHANCHAMAYO- JUNÍN"
