


6호선 신내역 건설
종합시험운행TF팀

4차 회의

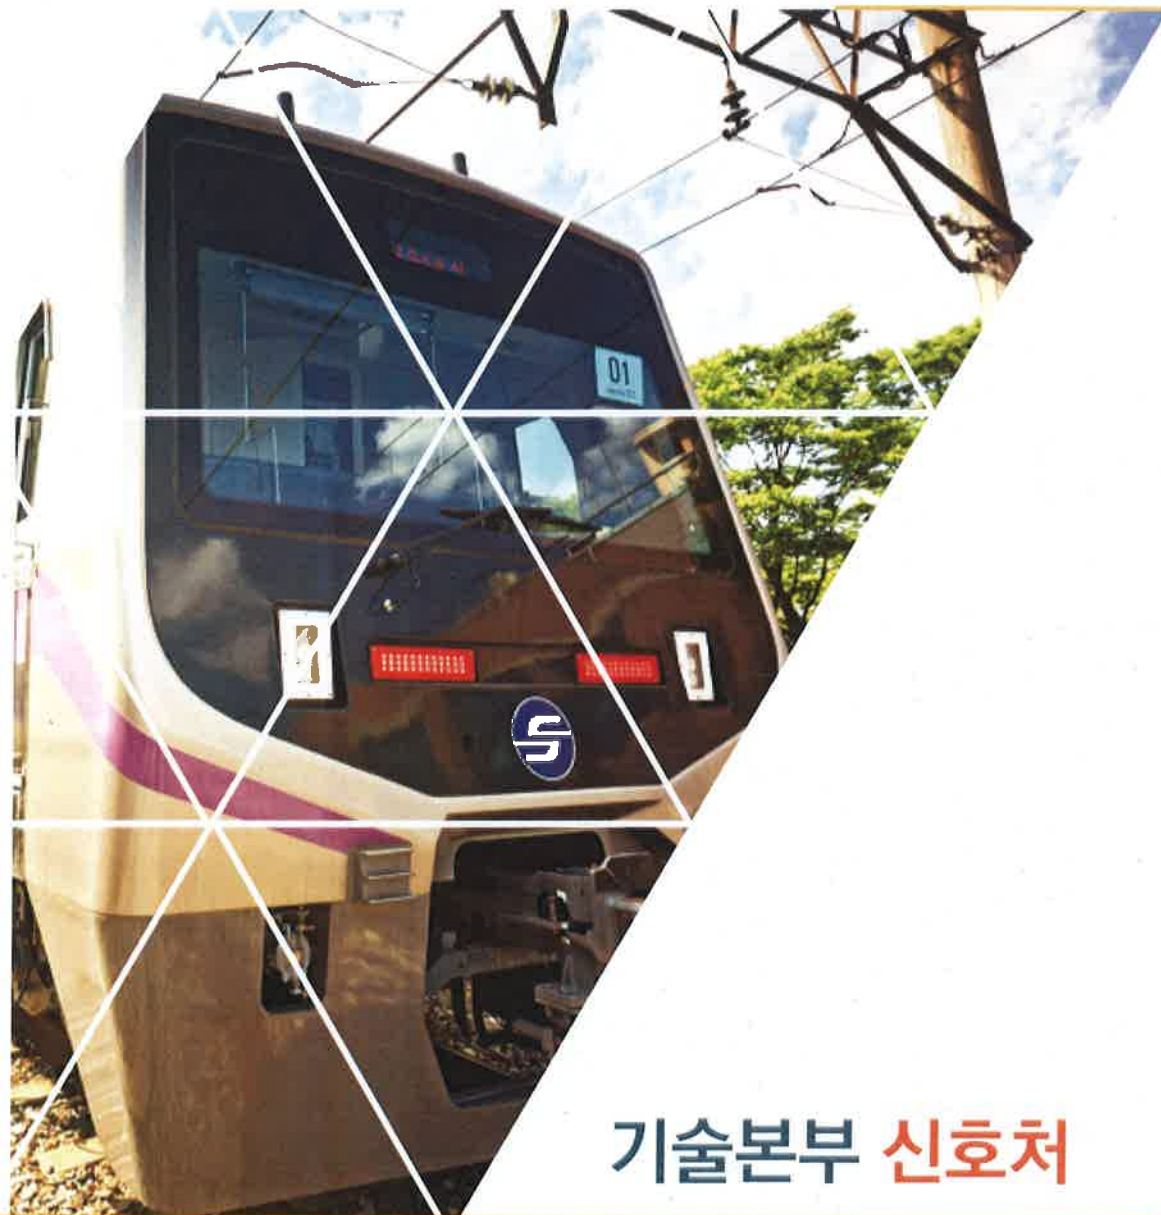

기술본부 **신호처**

6호선 신내역 건설 종합시험운영TF팀




4차 회의 진행순서

1. 기술본부장님 인사말 및 현안사항 공유
2. 각 공종별 공정을 보고
 - 공종별 문제점 및 해결방안 보고 및 공정표 공유
3. 참여업체 건의사항 및 애로사항 청취

1. 기술본부장님 인사말 및 현안사항 공유

종합시험운행 사전협의를 따른 추진 일정

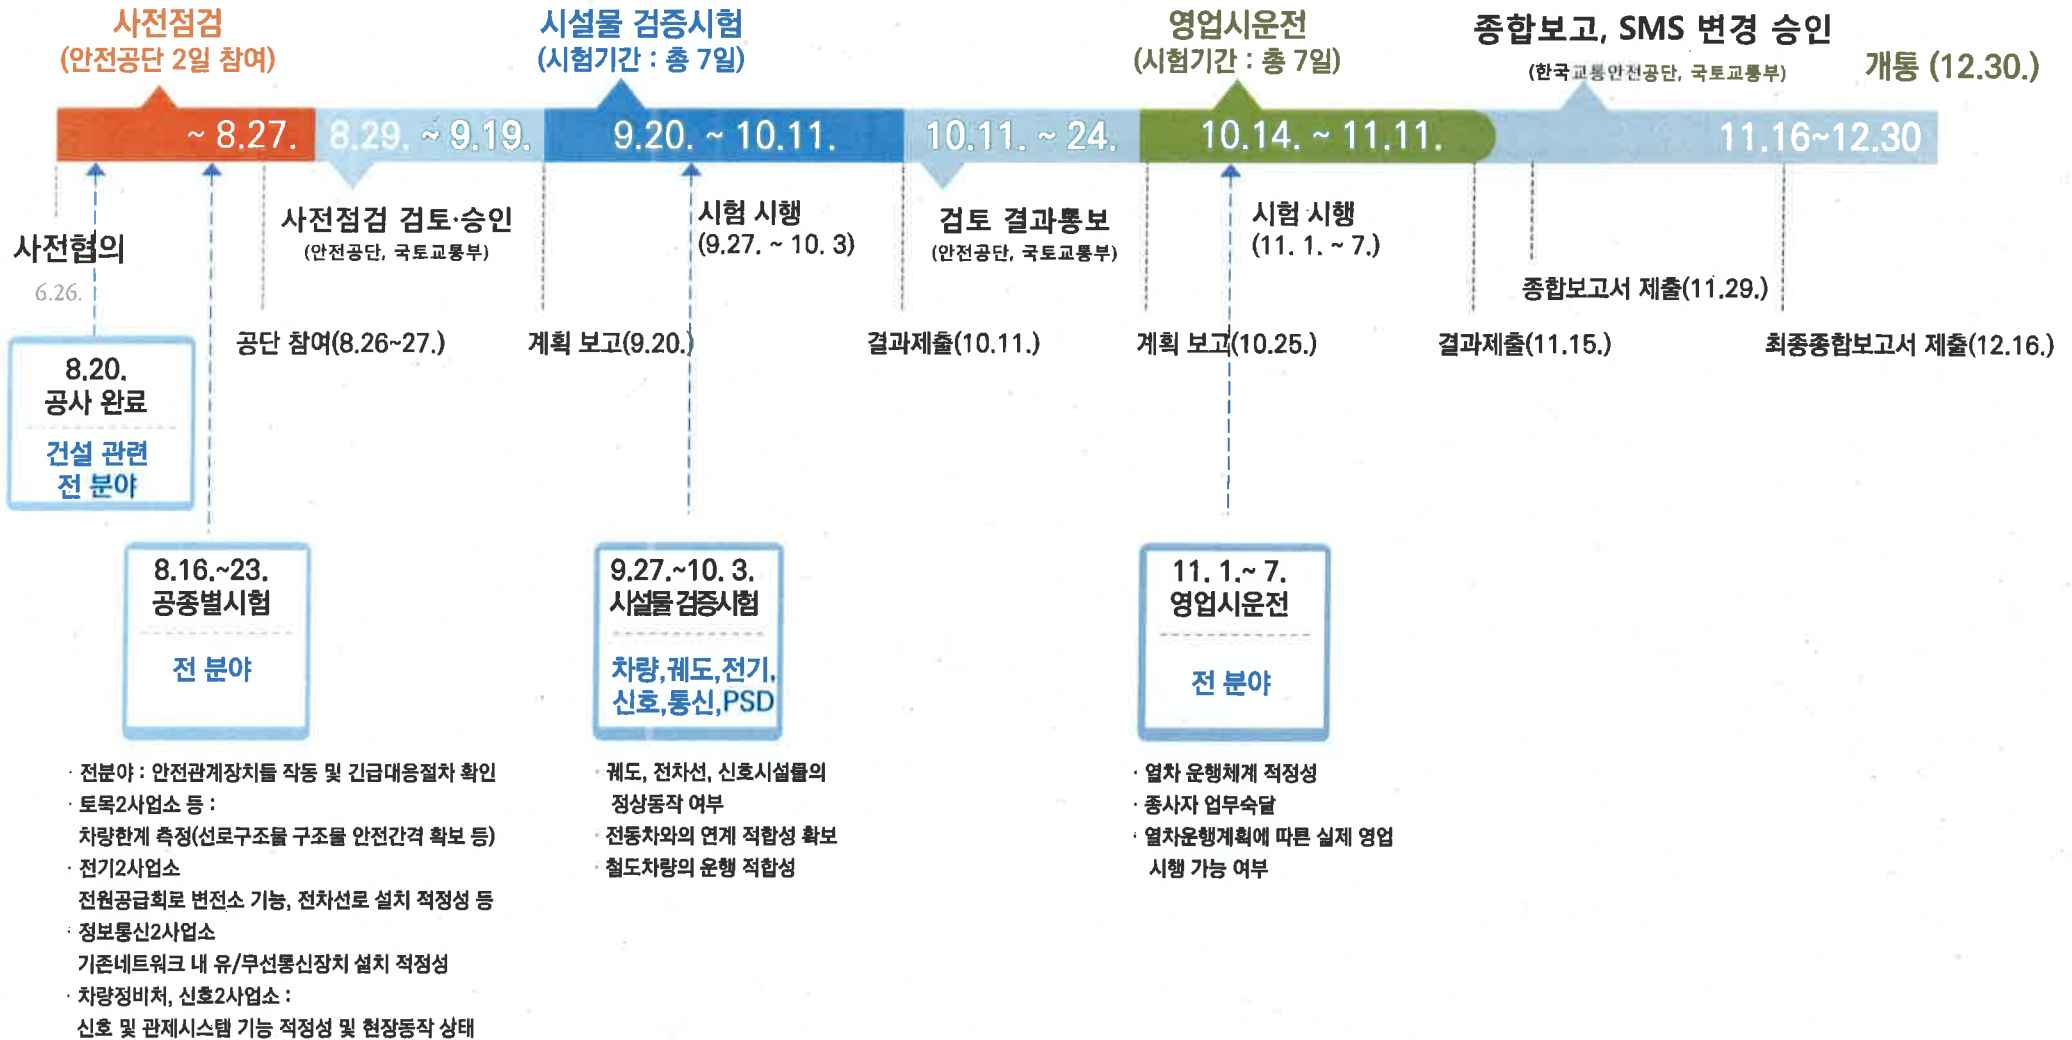

2. 각 공종별 공정율 보고

- 공종별 문제점 및 해결방안 보고 및 공정표 공유

분야별 통합공정표

구분	분야	2019년 8월																				비고		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
선로 공사	궤도 (85%)	선형공정 조기완료시 공사 시행							재료운반(레일, 철목, 지갈)					궤광조립			지갈 살포, 4단계 분기설치			지갈다지기		'19. 8. 20. 완료예정		
	신호 (71.4%)	1~3단계 연동검사				열차 투입 기능/ 연동검사 / 관제 시험(표시/제어)							4~6단계 현장시공			관제총괄 표시/제어			인원점검			'19. 8. 20. 완료예정		
	전차선 (62%)	전차선로 4단계 작업 및 조정				전차선로 5단계 작업							4, 5단계 미비사항 처리 및 6단계 작업									'19. 8. 20. 완료예정		
	차량 (50%)	신내역 음원/작화/광고데이터 편집											1개 편성 완료		제어PCB 협식시험 및 전편성 완료							'19. 8. 20. 완료예정		
역 시설 공사	토목 (96%)	공동구 맨홀 보강				노반 다짐/ 궤광 조립 / 도상타설					승강장 슬라브 마감석 작업					도로복구						'19. 8. 15. 완료예정		
	건축 (77%)	기둥, 보, 필린 설치				벽체 판넬 설치 / 지붕 출통공사																'19. 8. 20. 완료예정		
	통신 (43.1%)	배관배선		승강장 트레이 및 통신케이블 포설							통신설비 설치			통신설비, 방송장치, 계시기 시험							'19. 8. 15. 완료예정			
	승강설비 (75%)	반입 및 설치 작업(계속)																				'19. 8. 20. 완료예정		
	역사전기 (53%)	전동 전열 배선		덕트 및 레이스웨이 설치					분기배관, 조명기구 및 분전반 설치					제어반 케이블 테스트			조명테스트					'19. 8. 20. 완료예정		
	PSD (10%)	구조체(수직벽) 설치							케이블 및 전선 배선										ups		가동도어 / 헤더박스 설치			'19. 8. 20. 완료예정
	기계 (10%)	전선관 설치				자동제어 전선관 설치																시운전		'19. 8. 20. 완료예정
	소방 (10%)	전선관 매립													유도등 및 발신기 설치					시운전		'19. 8. 20. 완료예정		

3. 참여업체 건의사항 및 애로사항 청취
