



(주)진우엔지니어링코리아

08506 서울시 금천구 가산디지털1로 151, 세진이노플렉스 전화:02-2156-3297 전송:02-2156-3118 www.jinwoo-eng.com 담당: 이다정

문서번호	진우 제 18 - 217 호	선 결	과감 심혁형	지시	
시행일자	2018. 06. .	일 자	2018. 6. 12		
수 신	북부도로사업소장	접 수	시 간	결재	
경 유		번호	4902	공람	
참 조	도로보수과장	처 리 파	도로보수과		
		담 당 자	최한		

제 목 : 노후도로정비공사(2구역)-북부 제1회 기성검사 결과보고

1. 지속적인 업무협조에 감사드립니다.
2. “2018년 노후포장도로 정비공사(2구역)-북부”의 기성검사(1회)를 건설사업관리 업무 수행지침 제98조 제2항 단서조항, 제99조 제1항에 의한 기성검사를 시행하고 동 지침 제98조 제9항에 따라 그 결과를 보고하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 붙 임 :
1. 공사기성부분 검사조서 1부.
 2. 건설사업관리기술자(기성부분) 건설사업관리조서 1부.
 3. 기성내역서 1부.
 4. 기성검사사진 대지 1부. 끝.



주식회사 진우엔지니어링코리아
대표이사 김명



공사기성부분 검사조서

공 사 명 : 2017년 관내 포장도로 굴착복구공사(연간단가) - 북부

2018년 06월 06일 기성 준공

2018년 02월 28일 아폴로건설(주) 대표 서민정과 계약분

위 공사 제 1 회 기성부분검사의 명을 받아 2018년 6월 11일 검사한 결과 별지 내역서와 같이 전공사에 대하여 그 기성공정을 42.69%로 조정함.
단, 수중지하 및 구조물 내부 또는 저부 등 시공 후 매몰된 부분의 검사는 별지 건설 사업관리조서에 의거함.

2018년 06월 11일

기성부분 검사자 : 기술지원기술자

정 수 일



입 회 자 : 북부도로사업소 도로보수과

최 완

서민정

현장대리인

김 용 태

김용태

북부도로사업소장 귀 하

건설사업관리기술자 (기성부분) 건설사업관리조서

공 사 명 : 2018년 노후포장도로정비공사(2구역) - 북부

2018년 02월 28일 아폴로건설 대표 서민정과 계약분

위 공사의 건설사업관리기술자로 임명받아 2018년 04월 02일부터
2018년 06월 06일까지 실시 건설사업관리한 결과 공사전반에 걸쳐 공사
설계 도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 기성(기성금액 :
₩443,355,000 원, 기성율 42.69%) 되었음을 인정함.

2018년 06월 07일

책임건설사업관리기술자

김 경 복



북부도로사업소 소장 귀 하

공사 기성부분 내역서

1. 공 사 명 : 2018년 노후포장도로정비공사(2구역)-북부
2. 도 급 액 : 일금 일십억삼천팔백오십오만원정 (₩1,038,550,000)
3. 기 성 금 액 : 일금 사억사천삼백삼십오만오천원정 (₩443,355,000원) - 42.69%
 - 전회까지 기성금액 : 일금 - 0 - 원정 (₩ - 0 -천원) - 0%
 - 금 회 기 성 금 액 : 일금 사억사천삼백삼십오만오천원정 (₩443,355,000원) - 42.69%
 - 누 계 금 액 : 일금 사억사천삼백삼십오만오천원정 (₩443,355,000원) - 42.69%
 - 기 성 대 상 공 사 기 간 : 2018.02.28. ~ 2018.12.31.
 - 전회까지 기성대상 공사기간 : - 0 -
 - 금 회 기 성 대 상 공 사 기 간 : 2018.02.28. ~ 2018.06.06

4. 내 역 (갑) (단위 / 수량 : 식, 금액 : 천원, 비율 : %)

공사내역	규격	도 급 액		전회까지기성금액			금회 기성 금액			누계 금액			비고
		수량	금액	수량	금액	비율	수량	금액	비율	수량	금액	비율	
1.포장공		1	659,574,000				1	297,505,677	45.11	1	297,505,677	45.11	
2.부대공		1	17,634,638				1	7,844,193	44.48	1	7,844,193	44.48	
순공사비			677,208,895					305,349,870	45.09		305,349,870	45.09	
3.간접노무비	11.3%	1	31,332,284				1	14,119,854	45.06	1	14,119,854	45.06	
4.산재보험료	3.8%	1	11,727,147				1	5,284,824	45.06	1	5,284,824	45.06	
5.고용보험료	0.87%	1	2,684,899				1	1,209,946	45.06	1	1,209,946	45.06	
6.건강보험료	1.7%	1	4,606,828				-	-	-	-	-	-	
7.연금보험료	2.49%	1	6,747,649				-	-	-	-	-	-	
8.퇴직공제부금비	2.3%	1	6,377,367				-	-	-	-	-	-	
9.노인장기요양보험	6.55%	1	301,747					-	-		-	-	
10. 건설기계대여금	0.49%	1	3,318,323			없음		-	-		-	-	
11.환경보전비	0.8%	1	3,640,292					-	-		-	-	
12.하도급지급보증	0.081%	1	548,539				-	-	-	-	-	-	
13. 기타경비	6.2%	1	28,212,266				-	12,627,993	44.76	-	12,627,993	44.76	
14.안전보건관리비	1.86+	1	15,836,247				-	-	-	-	-	-	
순공사원가			792,542,483					338,592,487	42.72		338,592,487	42.72	
12. 일반관리비	6.0%	1	47,552,548				1	20,315,549	42.72	1	20,315,549	42.72	
13. 이 윤	15%	1	104,041,333				1	44,141,964	42.43	1	44,141,964	42.43	
공급가액			944,136,364					403,050,000	42.69		403,050,000	42.69	
14. 부가가치세		1	94,413,636				1	40,305,000	42.69	1	40,305,000	42.69	
도 급 비			1,038,550,000					443,355,000	42.69		443,355,000	42.69	

(을)


(단위 / 수량 : a, 금액 : 원, 비율 : %)

공사내역	규격	도금액		전회까지기성금액			금회기성금액			누계		비고	
		수량	금액	수량	금액	비율	수량	금액	비율	수량	금액		비율
야간공사 조명비	25a/일	205.56	4,587,071				71.6	1,597,754	34.83	71.6	1,597,754	34.83	
야간공사 조명비	30a/일	140.59	2,614,271				92.0	1,710,740	65.44	92.0	1,710,740	65.44	
야간공사 조명비	50a/일	1,377.72	15,371,222				635.1	7,085,810	46.1	635.1	7,085,810	46.1	
미끄럼방지포장	그루빙 중절단	1,412.0	22,395,732					-	-		-	-	
소계			659,574,257					297,505,677	45.11		297,505,677	45.11	
2. 부대공													
기설사무실	6개월~1년3×6	1	569,989				-	-	-	-	-	-	
기설창고	6개월~1년3×6	1	522,160		없음		7	-	-	7	-	-	
포장장비운반비	연속구간=10km	10	11,205,990				-	7,844,193	70.0	-	7,844,193	70.0	
포장장비운반비	불연속구간=10km	5	4,062,965				-	-	-	-	-	-	
포장장비운반비	불연속구간=0.5km	5	771,655				-	-	-	-	-	-	
포장장비운반비	불연속구간=1.0km	3	501,879				-	-	-	-	-	-	
소계			17,634,638					7,844,193	44.48		7,844,193	44.48	
계			677,208,895					305,349,870	45.09		305,349,870	45.09	

사 진 대 지



기성준공서류 확인

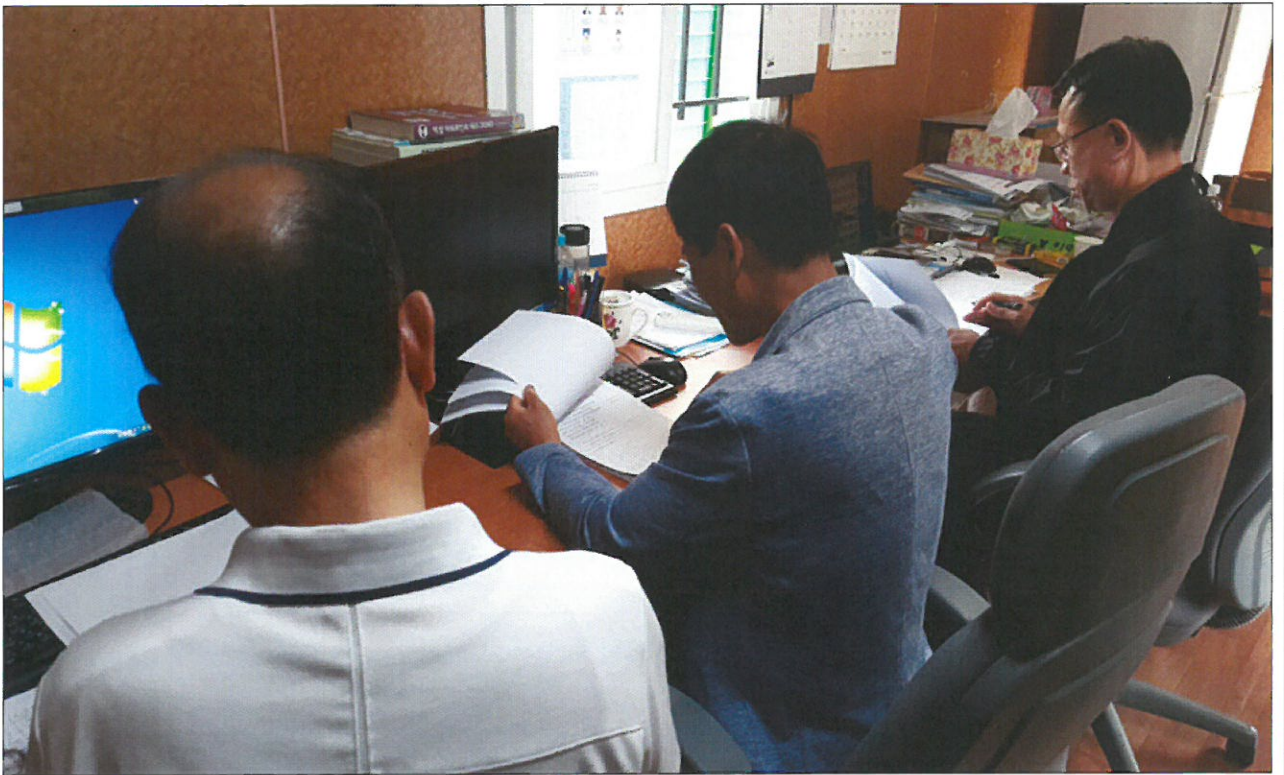

기성준공서류 확인

사 진 대 지



아스팔트포장도로 폭 확인



아스팔트포장도로 연장 확인

사 진 대 지



아스팔트포장도로 폭 확인



아스팔트포장도로 연장 확인
