


품질관리 지적사항 조치결과 보고서

(감리단 · 시공사 작성용)

- 점검대상 : 별내선(8호선 연장) 신호보안설비공사(1공구) BN1(암사역 방향)
- 점 검 일 : 2022. 6.29
- 시 공 사 : 종합전기 주식회사
- 조치결과



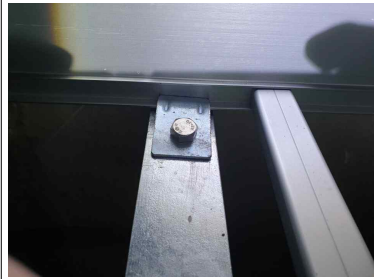
위 치	세부지적사항	사진대지	
		조 치 전	조 치 후
BN1	선로전환기 설치공간 확인	-	

※ BN1과 암사역 연결부위 선로전환기 신설개소의 설치공간 확인 및 위치 확인
(궤도 분기 침목 설치 시 선로전환기 깔판 사전 설치로 선로전환기 설치 공간 확보하였음)

품질관리 지적사항 조치결과 보고서

(감리단 · 시공사 작성용)

- 점검대상 : 별내선(8호선 연장) 신호보안설비공사(2공구) BN4
- 점검일 : 2022. 6.29
- 시공사 : 주식회사 서우건설산업
- 조치결과

위 치	세부지적사항	사진대지	
		조치 전	조치 후
BN4	케이블트레이 접지선 설치요		8월15일 이전 조치예정
BN4	케이블트레이 받침대 고정 체결구 일부 미설치		

※ BN4~ BN6 구간 케이블트레이 설치공사 중 확인한 사항임.

- 케이블 트레이 접지선 미설치 (현재 자재 발주중으로 7월 하순 입고예정으로 8월15일 이전 조치예정)
- 케이블 트레이 받침대 고정체결구 일부 미설치(재조사를 통하여 미설치 개소 조치완료)
