

정기(기동점검) 점검 결과보고


[창작연극지원센터 건립공사]

- 점검일시 : 2022.03.04 (금)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 이경석,이영주

○ 추락재해 예방(건축부)

- 현장에 전반적으로 추락방지 안전시설이 설치
는 되어있으나 누락된 개소가 다수 있고, 로프 등
으로 마감된 개소가 있어 추락시 충분한 역할을
못할것으로 판단되므로 안전난간시설 보완하거
나 단부에서 작업시는 안전고리를 체결후 작업
토록 교육관리 요함

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제42조(추락
의 방지),제44조(안전대의 부착설비 등)

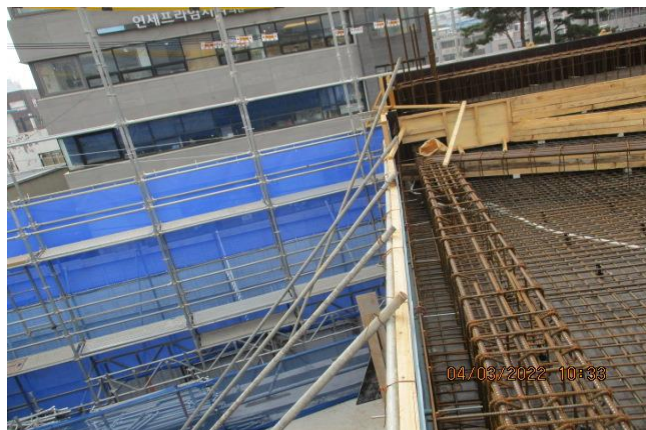

○ 거푸집동바리 안전(건축부)

- 지상2층 시스템 동바리 설치구간 안전관리계획서에는 수평연결재 4단으로 설치하는 것으로 되어 있으나, 1단 또는 미설치 구간이 있으므로 추가 설치 요망

- 또한, 수직도 불량 및 견고하게 고정되지 않아 흔들리는 곳이 다수 발견되고 벽이음 누락된곳이 있으니 추가 설치 및 보완 요망

※ 산업안전보건기준에 관한규칙 제332조(거푸집동바리 등의 안전조치)

※ 건설공사장 안전관리지침 3.3.1 거푸집동바리-001(시스템동바리)



○ 가설통로 안전(건축부)

- 지상 3층 바닥 슬라브 철근배근 구간 작업자용 작업발판 미설치된 구간이 있으니 발빠짐의 안전사고 방지를 위해 추가설치 요망

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)

※ 건설공사장 안전관리지침 3.1.2 가설통로 안전-006(통로발판)

