

# ' 17년 10월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(도시철도사업부)

## □ 안전점검의 날 현장점검 실시

연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 3개소	21	23	23
1	'17.10.19	신림선 도시철도 민간투자사업 건설 (1공구)	5	5	5
2	"	신림선 도시철도 민간투자사업 건설 (2공구)	11	12	12
3	"	신림선 도시철도 민간투자사업 건설 (3공구)	5	6	6

## □ 점검 및 조치결과

연번	위 치	점검내용	조치결과	비고
1	신림1공구 101정거장	·카고크레인 아웃트리거 설치 후 바퀴 지상에서 미이격	·카고크레인 바퀴 지상에서 이격 조치	
2	신림1공구 103정거장	·시점부 화살표 안내등 표지판 낮에 미점등	·낮에도 점등되도록 보수 조치	
3	신림1공구 103정거장	·중점부 계측기 지상 노출	·중점부 계측기 주변 임시 보호 조치 (향후 복공 덧씌우기 후 계측기 보호 박스 설치 예정)	
4	신림1공구 103정거장	·중점부 자재 정리정돈 미실시	·중점부 자재 정리정돈	

연번	위 치	점검내용	조치결과	비고
5	신림1공구 103정거장	·종점부 가설울타리 차량 진출입시를 제외하고 평상시 폐쇄조치 요함	·평상시 폐쇄조치 실시	
6	신림2공구 104S환기구	가설계단 측면부 추락방지망설치 필요함	가설계단 측면부 추락방지망 설치	
7	신림2공구 104S환기구	A형사다리 아웃트리거 설치 필요함	아웃트리거 설치	
8	신림2공구 개착1구간	개구부 작업자 안전대 착용 및 고리걸고 작업바람	안전대 착용 후 고리체결	
9	신림2공구 개착1구간	용접작업중인 용접공은 방열복 착용바람	용접공 방열복 착용	
10	신림2공구 105정거장	소화기 정기점검표 부착필요함	소화기 점검표 부착	
11	신림2공구 105정거장	센터파일에 설치된 피스브라켓트에 볼트가 1개 누락됨.체결바람	센터파일 피스브라켓트 볼트 체결	
12	신림2공구 108S환기구	안전통로 도시가스 관리용품 적치	안전통로 관리용품 정리	
13	신림2공구 108S환기구	안전통로 조명 미점등	안전통로 조명 점등	
14	신림2공구 108S환기구	소화기 관리카드 미부착	소화기 점검표 부착	
15	신림2공구 108S환기구	굴착사면 안전시설 보완	안전시설 추가설치	
16	신림2공구 106E환기구	작업구 주변 토사 잔재물 미처리	토사잔재물 정리	
17	신림2공구 106E환기구	계단 상부 사버팀 충돌 안전표지 미부착	충돌안전시설 설치	

연번	위 치	점검내용	조치결과	비고
18	신림3공구 111정거장	고재 보관 철재 BOX 규격 미표시, 내부 혼재된 쓰레기 정리요	철재박스 규격표시 및 내부 쓰레기 청소 완료	
19	신림3공구 111정거장	위험물 보관소에 보관된 물질 실병 및 공병 수량표기 필요	실병 및 공병 수량 표기	
20	신림3공구 111정거장	적재된 강재 버팀보중 stopper 보다 높게 적재된 자재 정리	적재 강재 stopper 보다 하단으로 적재 조치 완료	
21	신림3공구 111정거장	용접기 점검 표기 9월로 10월 점검 필요	용접기 10월점검 확인 점검표 부착 조치완료	
22	신림3공구 110E환기구	환기용 배기구 상부에 설치된 메탈리스망이 날카로우니 교체 요망	메탈리스망을 추락 방지 망으로 교체완료	
23	신림3공구 110E환기구	진입계단 코너부 통로 어두운곳 조도기준 75LUX 참고하여 등기구 설치요	등기구 추가 설치 완료	

## 지적사항 및 조치결과 사진

지적사항	조치결과
	
(101정거장)카고크레인 바퀴 미이격	카고크레인 바퀴 지상에서 이격
	
(103정거장)화살표 안내등 주간 미점등	화살표 안내등 주간 점등
	
(103정거장)계측기 보호 미조치	계측기 임시 보호 조치 (향후 복구 덧씌우기 후 계측기 보호 박스 설치 예정)




지적사항	조치결과
	
(103정거장)자재 정리정돈 요망	자재 정리정돈 실시
	
(103정거장)중점부 가설 울타리 폐쇄 요함	중점부 가설 울타리 평상시 폐쇄 조치
	
(104S환기구) 가설계단 측면부 추락방지망 설치 필요함	가설계단 측면부 추락방지망 설치
	
(104S환기구) A형사다리 아웃트리거 설치 필요함	아웃트리거 설치

점검내용	조치결과
	
<p>(신림2공구 개착1구간) 개구부 작업자 안전대 착용 및 고리걸고 작업바람</p>	<p>안전대 착용 후 고리체결</p>
	
<p>(신림2공구 105정거장) 용접작업중인 용접공은 방열복 착용바람</p>	<p>용접공 방열복 착용</p>
	
<p>(신림2공구 105정거장) 소화기 정기점검포 부착 필요함</p>	<p>소화기 점검포 부착</p>
	
<p>(신림2공구 105정거장) 센터파일에 설치된 피스브라켓트에 볼트가 1개 누락됨.체결바람</p>	<p>센터파일 피스브라켓트 볼트 체결</p>

점검내용	조치결과
	
<p>(신림2공구 108S 환기구) 안전통로 도시가스 관리용품 적치</p>	<p>안전통로 관리용품 정리</p>
	
<p>(신림2공구 108S 환기구) 안전통로 조명 미점등</p>	<p>안전통로 조명 점등</p>
	
<p>(신림2공구 108S 환기구) 소화기 관리카드 미부착</p>	<p>소화기 점검포 부착</p>
	
<p>(신림2공구 108S 환기구) 굴착사면 안전시설 보완</p>	<p>안전시설 추가설치</p>

점검내용	조치결과
	
<p>(신림2공구 106E 환기구) 작업구 주변 토사 잔재물 미처리</p>	<p>토사잔재물 정리</p>
	
<p>(신림2공구 106E 환기구) 계단 상부 사버팀 충돌 안전표지 미부착</p>	<p>충돌방지시설 설치</p>
	
<p>(신림3공구 111정거장) 철재박스 규격 표기 및 내부청소</p>	<p>규격표기 및 청소 완료</p>
	
<p>(신림3공구 111정거장) 실병 및 공병 수량 표기</p>	<p>수량 표기 완료</p>

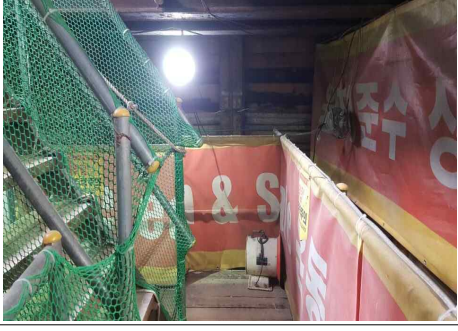

점검내용	조치결과
	
<p>(신림3공구 111정거장) 강관 버팀보 스토퍼 위로 적재</p>	<p>스토퍼 하단적재 조치완료</p>
	
<p>(신림3공구 111정거장) 용접기 점검 9월로 10월점검 필요</p>	<p>10월 점검 확인 부착 완료</p>
	
<p>(신림3공구 110E 환기구) 환기 배기구 상부 메탈리스망 교체요</p>	<p>교체 완료</p>
	
<p>(신림3공구 110E 환기구) 진입계단 코너부 등기구 설치요</p>	<p>등기구 추가 설치 완료</p>
