

정기(기동점검) 점검 결과보고

[남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사]

- 점검일시 : 2018.10.16 (화)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 홍민철


○ 낙하·비래 재해 예방(토목부)

- A1 교대에 보결이가 손상된 곳이 있어 향후 철거시 띠장의 낙하 위험이 있으니 보완 조치 요망
※ 건설안전 기본지침 II.낙하 재해예방 안전시설 및 작업기준



○ 가설통로 안전(토목부)

- A2 교대 터파기 구간의 통로상에 충분대 철거 자재가 적치되어 있어 근로자 통행시 전도 위험이 있으니 조치하기 바람
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)

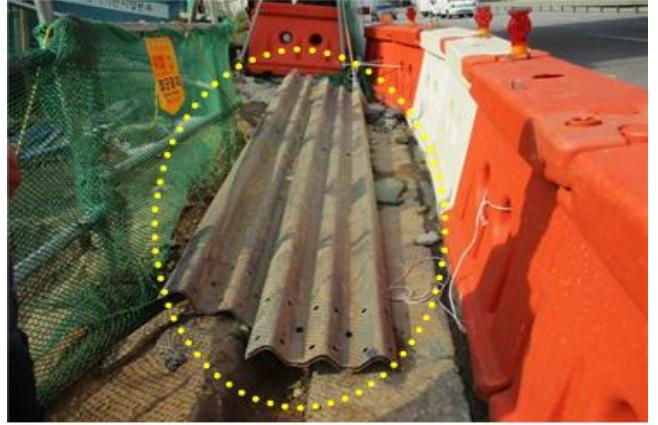

○ 흙막이가시설 안전(토목부)

- A2 예각부 strain gauge 계측값의 변화를 철저히 주시하고 조속히 기초판 콘크리트를 타설하기 바람



○ 사면 안전(토목부)

- A1 교대기초 터파기 경사면은 청탐지로 보호 조치하기 바람

