

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

[남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사]

□ 점검일시 : 2019.04.18 (목)


□ 점검결과

◆ 점검자 : 전용현

## ○ 품질관리(토목부)


- 기존교량 커팅부에 일부 균열 및 공극이 발생되어 있으므로 열화 방지를 위하여 보수 조치 요망.

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제51조(건축물 또는 이와 유사한 시설물 등의 안전유지)

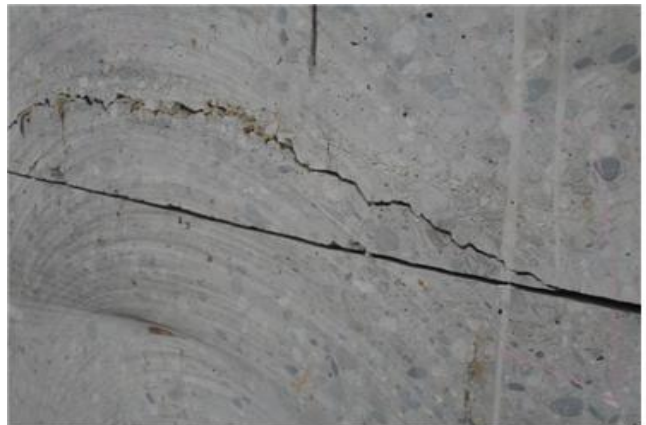

## ○ 흙막이가시설 안전(토목부)

- 오류IC A1작업장은 강우 유입 등으로 인하여 계측기에 오류가 발생하지 않도록 계측기함을 보양 조치바람.

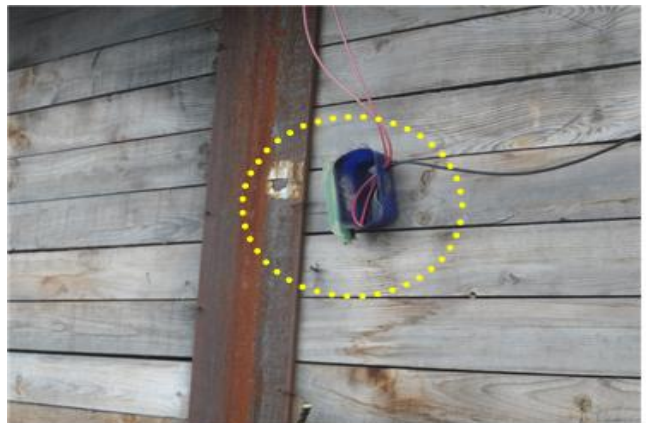

○ 흠막이가시설 안전(토목부)

- 오류IC A1의 흠막이 가시설 일부에서 보걸이와 띠장이 미접합되어 있으니 보완하기 바람.

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제51조(구축물 또는 이와 유사한 시설물 등의 안전유지)

