
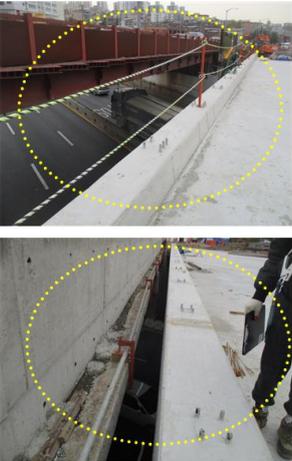


# 정기(기동점검) 점검 조치결과보고

## 〔남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사〕

- 점검일시 : 2019.11.21 (목)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 박수엽

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 낙하·비래 재해 예방</p> <p>- 오류IC(사당) 현장에 사용중인 슬링벨트는 몸체 손상이 심하니 확인 후 반출바람. ※ 건설안전 기본지침 공동-31(벨트슬링)</p>		<p style="text-align: center;">2019.11.21</p> <p>오류IC(사당) 현장에 사용중인 슬링벨트는 즉시 파쇄하여 폐기처리함</p>	
<p>○ 낙하·비래 재해 예방</p> <p>- 오류IC교 연석구간은 하부에 차량이 다니는 도로임을 감안하여 낙하물 방지시설을 설치하여 관리하기 바람. ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)</p>		<p style="text-align: center;">2019.11.26</p> <p>오류IC교 연석구간은 추락방망 + PE메쉬망을 2중으로 설치하여 작은 낙하물도 방지하도록 조치 완료함</p>	
<p>○ 전도재해 예방</p> <p>- 오류IC교 A2 법면 구간은 근로자들이 통행시 전도등의 안전사고 우려가 있으니 출입통제 후 관리바람. ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제20조(출입의 금지 등)</p>		<p style="text-align: center;">2019.11.26</p> <p>- 오류IC교 A2 법면 구간은 강관파이프와 추락방망으로 폐쇄조치 완료함</p>	

○ 전도재해 예방

- 오류IC교 하부 근로자  
통행 구간에 거치된 전  
선은 근로자 통행시 간  
섭되지 않도록 조치 바  
람.

※ 건설안전 기본지침  
공통-17(가설전선)



2019.11.22

오류IC교 하부 가설선은  
가공 설치하여 근로자 통  
행 및 전선관리조치함

