

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	청소행정과-20276
등록일자	2015.7.16.
결재일자	2015.7.16.
공개구분	대시민공개

★주무관	지역청결팀장	청소행정과장	복지문화국장		
정명기	최경희	강현섭	전결 07/16 代 김효길		
협조자	예산팀장 조현석				

임시적환장 개선공사 변경 추진계획

2015. 7. .

강 남 구
(청 소 행 정 과)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까? <ul style="list-style-type: none"> • 추진경위 : 우리구 임시적환장 개선공사와 관련하여 공사추진내용 및 소요예산 등에 변경사항이 있어 이를 반영하여 추진하고자 함
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까? <ul style="list-style-type: none"> • 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까? <ul style="list-style-type: none"> • 대상 : 임시적환장 주변 거주주민 등
분야별 검토사항 (계속 :) (신규 :)	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ① 관련부서 협조 ----- (O) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----- () ③ 추진상 사전 걸림돌 ----- () ④ 미래행정 수요예측 ----- () ⑤ 시장조사 ----- () ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ----- () ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----- () ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----- () ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----- () <ul style="list-style-type: none"> • 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까? <ul style="list-style-type: none"> • 해당사항 없음
전문가 자문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까? <ul style="list-style-type: none"> • 해당사항 없음


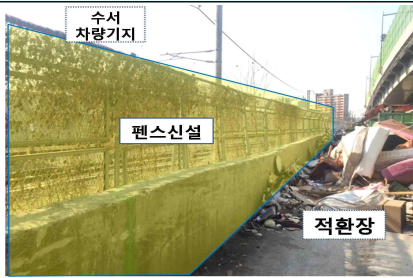
임시적환장 개선공사 변경 추진계획

임시적환장 개선공사 추진과 관련하여 총 공사비가 당초 편성된 예산을 초과하여 우선적으로 기 편성된 예산 내에서 일부구간에 대한 공사가 진행중이며, 현재 미실시 공사구간은 추경예산 편성을 통해 확보된 예산으로 조속히 추진하고자 함

※ 기 추진계획 - 임시적환장 개선공사 추진계획(청소행정과-10696호)

1 현황 및 공사개요

- 위 치 : 수서동 163-5(도로) 수서-분당 고속화도로 하부
- 면 적 : 약 3,600㎡
- 소 유 자 : 서울특별시
- 사용목적 : 생활쓰레기 임시적환 및 대형폐기물 해체 작업 등
- 공사 내용
 - 수서-분당고속화도로에 기 설치된 노후펜스 교체 ⇒ 추진중
 - 적환장-수서차량기지 경계구간 펜스 설치 ⇒ 추진중
 - 적환장 출입문(게이트) 설치 ⇒ 추진 예정

적환장 출입문	수서차량기지 경계구간	고속화도로 진입구간
 <p>출입문설치</p>	 <p>수서차량기지 펜스신설 적환장</p>	 <p>노후펜스교체 (철거 및 신설)</p>

2 변경 사유

- 기 편성예산(70,000천원)으로는 모든 구간에 대한 공사추진이 불가하여 우선적으로 기 편성된 예산 내에서 수서차량기지 경계구간에 펜스 설치와 적환장 출입문(게이트) 설치공사를 우선적으로 실시하고
- 고속화도로 진입구간에 기 설치된 노후펜스 교체공사는 추가경정예산으로 시행

3

변경 사항

구분	당초 계획	변경 내용
공사구간	<ul style="list-style-type: none"> - 출입문(게이트) 설치 - 수서차량기지 경계 펜스 설치 - 고속화도로 진입구간(적환장 동쪽)에 기 설치된 펜스 교체 	좌 동
공사 추진방법	<ul style="list-style-type: none"> - 전체구간 동시에 공사 진행 - 공사감리 없음 	<ul style="list-style-type: none"> - 공사구간을 2개로 나누어 진행 · 출입문(게이트), 수서차량기지경계 펜스 설치공사(현재진행 중) · 고속화도로 진입구간에 기 설치된 펜스 교체공사(실시예정) - 공사감리 실시
예산	70,000천원	120,000천원 (추경예산편성으로 50,000천원 증액)

4

추진 계획

구분	진행중인 공사	시행예정 공사
공사구간	<ul style="list-style-type: none"> - 출입문(게이트) 설치 - 수서차량기지 경계 펜스 설치 	<ul style="list-style-type: none"> - 고속화도로 진입구간(적환장 동쪽)에 기 설치된 펜스 교체
추진내용	<ul style="list-style-type: none"> - 공사시행 : 2015. 7. 20 ~ 8. 10 (공사기간 중 감리 실시) 	<ul style="list-style-type: none"> - 실시설계용역 시행 : 2015. 7월중 - 시공업체 선정 : 2015. 8월중 - 공사실시 및 준공 : 2015. 9월중 (공사기간 중 감리 실시)

5

예산

□ 공사비 ----- 114,000천원

- 예산과목 : 청소행정과, 청소관리, 생활쓰레기 수거 처리, 생활쓰레기 반입 처리, 시설비및부대비, 시설비

감리비 ----- 6,000천원

- 예산과목 : 청소행정과, 청소관리, 생활쓰레기 수거 처리, 생활쓰레기 반입 처리, 시설비및부대비, 감리비

예산변경 내용(감리비 편성)

(단위 : 천원)

구분	예산과목								
	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	예산현액	전용액		전용 후 예산액
							증	감	
변경전	청소관리	생활쓰레기 수거 처리	생활쓰레기 반입처리	시설비및부대비 (401)	시설비 (401-01)	120,000	-	6,000	114,000
변경후	청소관리	생활쓰레기 수거처리	생활쓰레기 반입처리	시설비및부대비 (401)	감리비 (401-02)	6,000	6,000	-	6,000

6

행정 사항

기획예산과에 예산변경 요구
