



사람중심의 행복한 성동

|      |              |
|------|--------------|
| 문서번호 | 안전치수과-11662  |
| 결재일자 | 2014.6.2.    |
| 공개여부 | 대시민공개        |
| 방참번호 | 구청장 방참 제267호 |

|        |        |        |          |      |              |
|--------|--------|--------|----------|------|--------------|
| 주무관    | 하수계획팀장 | 안전치수과장 | 안전건설교통국장 | 부구청장 | 구청장          |
| 윤완노    | 김태현    | 조인호    | 안대희      | 유재룡  | 06/02<br>고재득 |
| 협<br>조 | 재무과장   | 홍성범    |          |      |              |
|        | 기획예산과장 | 박기웅    |          |      |              |
|        | 예산팀장   | 이정희    |          |      |              |

# 성수1가 뚝섬역주변 지선관거개량

## [집행현황보고]



성 동 구

# 성수1가 독섬역주변 지선관거개량

## [집행현황보고]

이면도로포장공사 시행예정인 구간에 노후하수관정비가 시급한 실정이나 예산확보가 곤란하므로 본 사업의 집행잔액을 활용 노후 하수관을 정비하여 민원을 해소하고 도로포장 재굴착을 방지하고자 함

### 1. 사업현황

- 사업명: 성수1가 독섬역주변 지선하수관 개량공사
- 사업기간: 2014. 3.31. ~ 7.28.
- 도급자: (주)드림건설
- 현공정: 80%(5.27현재) - 하수관 676m중 540m 부설완료
- 예산현황: 640백만원

(단위:천원)

| 사업명                           | 예산액     |         |         |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
|                               | 계       | 구비      | 시비      |
| 성수1가동 독섬역주변 지선하수관 개량공사(보조금사업) | 640,000 | 120,000 | 520,000 |

### 2. 예산집행현황

- 집행확정액 (단위:천원)

| 계       | 도급비     | 관급비     | 폐기물처리  | 지장물 이설 | 부대비   |
|---------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 533,722 | 339,249 | 109,600 | 30,173 | 50,000 | 4,700 |

- 집행잔액 (단위:천원)

| 계       | 도급비 낙찰차액 | 폐기물용역 낙찰차액 | 이설비 집행잔액 |
|---------|----------|------------|----------|
| 106,278 | 49,551   | 4,447      | 52,280   |

### 3. 집행잔액 발생사유

- 구의로의 과다한 지장물로 인한 이설비(102,533천원)을 반영하였으나
- 공사기간 단축 및 지장물 이설시 도로굴착기간 장기화에 따른 주민불편사항을 최소화 하기 위해 수회에 걸친 시험굴착과 유관기관 업무협의를 통하여 지장물 이설을 최소화 하는 최적의 노선으로 변경하여
- 이설비(통신케이블선로 이설비 약1억원 소요예상)를 절감하였고, 경쟁입찰에 따른 낙찰차액(54백만원)이 발생하였음.

[뚝섬역 3~4번출구 지장물도]






## 5. 조치계획

- 별도발주시 행정기간 1개월이 소요되어 본격적인 우기인 6월말까지 공사완료가 불가하므로 기 계약되어 공사중인 본 공사 시공자로 하여금 추가공사를 시행토록 하여 성수동 일대 지선하수관거 개량에 만전을 기하고자 함.

[사업 위치도]

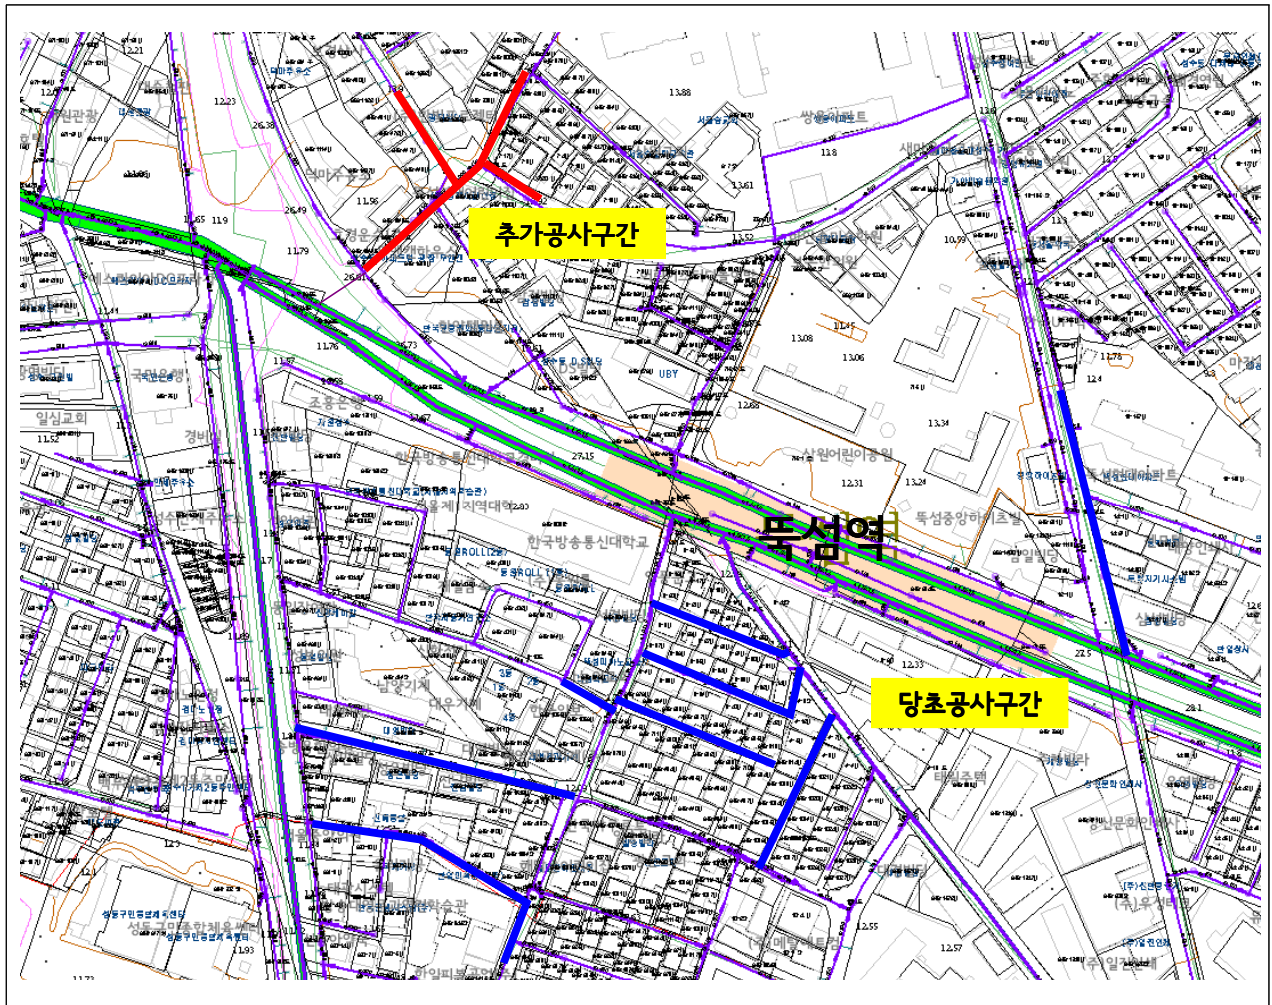

끝.
