

## 주간업무보고(2018.6.18. ~ 6.24.)

### I. 건설사업관리기술자 투입실적

구 분	분야별	지난주까지	금주투입	누계투입	비 고
고급	(책임기술자)	61 인·일	5인·일	66인·일	이 영관
품질관리자	초급	64 인·일	5인·일	69인·일	박 재호
동부도로사업소	중급	63 인·일	4인·일	67인·일	최 성진
	초급	41 인·일	5인·일	46인·일	서 용기
	초급	34 인·일	6인·일	40인·일	김 광중
성동도로사업소	중급	57 인·일	5.5인·일	62.5인·일	장 상수
	초급	57.5 인·일	5인·일	62.5인·일	김 수철
	초급	55 인·일	5인·일	60인·일	김 경옥
계		432.5 인·일	40.5인·일	473인·일	

### II. 건설사업관리 추진 실적

(단위 : 연장m, 면적a)

구 분	지난주 까지			금 주 실적			누 계 실적				
	건수	연장	면적	건수	연장	면적	건 수	연장	면적		
굴 착 복 구	소계	121	11,365	316.1	11	1,702.2	26.44	132	13,067.2	342.54	
	관리청	굴착복구	102	7,738	103.91	8	1,457.2	19.09	110	9,195.2	123
		차로복구	3	1,196	48.5	-	-	-	3	1,196	48.5
	원인자	굴착복구	14	1,647	21.31	3	245	7.35	17	1,892	28.66
		차로복구	2	784	142.38	-	-	-	2	784	142.38
포 장 정 비	소계	165	7,529.9	1,192.34	8	820.5	361.73	173	8,350.4	1,554.07	
	노후포장	9	5,586	1,115	2	796	361	11	6,382	1,476	
	긴급복구	소파	137	1,883.1	75.62-	-	-	-	137	1,883.1	75.62
		동공	19	60.8	1.72	6	24.5	0.73	25	85.30	2.45
	아스콘 공장점검	7	-	-				7			
도로순찰	18	-	-	1			19				

### III. 금주 공사현황

- 굴착복구 공사현황 및 포장정비 공사현황(붙임 참조)

### IV. 주요업무 추진실적

- 시험, 검측, 순찰 및 기타 주요업무 추진 내용(붙임 참조)

2018. 6. 25.

책임기술자 이영관 (인)



동부도로사업소장 귀하

### Ⅲ. 금주 공사현황

#### 1. 굴착복구공사(관리청복구)

##### 가. 공사현황

허가번호	굴착기관	허가현황			굴착현황			복구현황		
		폭	연장	면적	폭	연장	면적	폭	연장	면적
강동-전기-42	한전 강동지사	1.2	220	264	1.2	200	240	1.2	200	240
강동-상수-84	강동수도사업소	1.2	820	984	1.2	36	43.2	1.2	36	43.2
강남-상수-147	한국수자원공사	4.3	10	43	5	5	25	5	5	25
강남-전기-37	한전 강남지사	1.2	712	854.6	1.2~4.0	305	412	1.2~4.0	305	412
강동-상수-138	강동수도사업소	1.2	537	644	1.2~4.0	175.2	240.32	1.2~4.0	175.2	240.32
강남-상수-280	강남수도사업소	1.2	140	168	1.2	90	108	1.2	90	108
송파-상수-315	강도수도사업소	1.2	100	120	1.2	149	178.8	1.2	149	178.8
강남-상수-281	강남수도사업소	1.4	140	1688	1.2	90	108	1.2	90	108

나. 특이사항 : 없 음

#### 2. 굴착복구공사(원인자복구)

##### 가. 공사현황 :

허가번호	굴착기관	허가현황			굴착현황			복구현황		
		폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	폭(m)	연장(m)	면적(㎡)
강남구-2018-상수 00281	강남구청	1.2	120	144	1.2	200	240	1.2	200	240
강동구-2018-기타-00039	대의건설	1.2	38	45.6	1.2	20	24	1.2	20	24
강동구-2018-난방-00001	을묘종합건설	1.2	25	30	1.2	25	30	1.2	25	30

나. 특이사항 : 없음

### 3. 포장정비공사(노후포장도로정비공사)

#### 가. 금주 공사현황

노선명	위치(구간)	두께	폭	연장	면적	비고
연주로	매봉터널사거리~ 세브란스병원	t=5cm	24m	390m	120a	
오금로	오금역~방이교가	t=5cm	18.0m	406m	106a	

나. 특이사항 :

### 4. 포장정비공사(긴급복구공사)

#### 가. 금주 공사현황

노 선 명	위치(구간)	폭	폭	연장	면적	비고
현릉로	강남구 세곡동 35-1	3.0	3.0	3.0	0.09	
현릉로	강남구 세곡동 34-4	3.0	3.0	5.0	0.15	
현릉로	강남구 세곡동 33-6	3.0	3.0	3.0	0.09	
현릉로	강남구 세곡동 579	3.0	3.0	3.0	0.09	
현릉로	강남구 세곡동 579	3.0	3.0	3.0	0.09	
현릉로	강남구 세곡동 579	3.0	3.0	7.5	0.22	

나. 특이사항 : 없음

#### IV. 주요업무 추진실적

##### 1. 시 험

동부도로사업소 (서인 및 경서 아스콘사업 협동조합)									
업체명	공장 점검		자재(아스콘혼합물, 골재)시험					비고	
	점검 일자	점검 결과	대상(시료명)	시험결과	의뢰일자	통보일자			
일진 아스콘(주)	04. 06	적합	WC-3	합격	04. 17.	04. 20.			
			WC-5 개질	합격	04. 17.	04. 20.			
			1등급골재	합격	04. 16	04. 27.			
(주)산하	04. 06	적합	순환BC-1	합격	04. 24.	04. 26.			
			1등급골재	합격	05. 25.	06. 21.			
			WC-3	합격	06. 05	06. 18			
삼덕 산업(주)	04. 10	적합	일반WC-3	1차	불합격	04. 18.	1차	04. 23	
				2차	합격	04. 30.	2차	05. 08	
			일반BB-2	합격	04. 24.	04. 30.			
			1등급 골재	합격	04. 30.	05. 15			
(주)삼일 에코스텍	04. 10	적합	일반BB-2	합격	04. 18.	04. 23.			
			일반WC-3	1차	불합격	04. 30.	05. 08.		
				2차	합격	05. 29	06. 04.		
1등급 골재	합격	04. 30.	05. 17.						
(주)공영사	04. 11	적합	일반BB-2	합격	04. 24.	05. 04.		3등급 골재	
			일반WC-2	합격	04. 24.	05. 04.			
			일반WC-3	합격	05. 11.	05. 16.			
			일반WC-5	합격	05. 11.	05. 16.			
			일반WC-3	합격	05. 30.	06. 07.			
			1등급 골재	합격	05. 29.	06. 20.			
방태(주)	04. 11	적합	일반BB-2	합격	04. 24.	05. 04.			
			순환BB-2	합격	05. 11.	05. 16.			
(주)청광	04. 11	적합	일반BB-2	합격	05. 09.	05. 14.			




## 2. 검측 및 지도점검 실적

□ 지적사항 조치 전후 사진

○ 공사명 : 노후포장도로(경기여고 사거리-개포동역)

허가번호	-		복구기관	㈜영길토건
노 선 명	삼성로		위 치	경기여고 사거리-개포동역
작업규모	지시내역(a)	변경내역(a)	공사기간	2018.06.17
	84	81	관로규모	

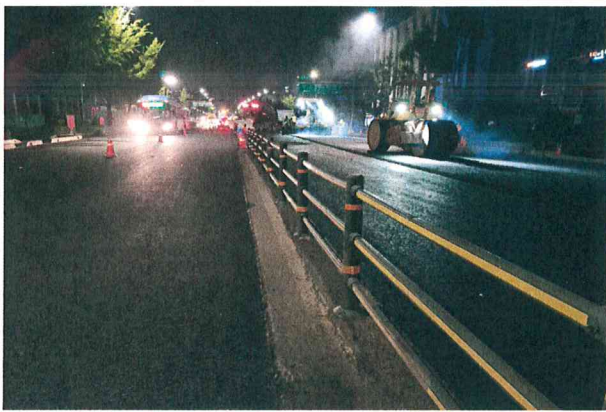

중앙부 울타리 주변 기존포장 추가 절삭 필요



중앙부 울타리 주변 기존포장 추가 절삭 현지시정조치

## 3. 순찰 및 조사

○ 밤고개로(울현동242, 강남-전기-37)

- 순찰내용

· 포장노면 상태 확인

- 순찰자 : 분야별감리원 김광중



시공 양호

#### 4. 기술지원기술자 현장 점검

○ 2018년 도로굴착복구공사 시공 현장 점검

- 굴착복구 2회완료구간 수량(서류검토) 및 현장확인
- 기존도로 포장 접속부 품질관리 및 다짐상태 확인

□ 굴착복구 현장(2회 완료보고 구간 확인) -06월 22일



2-35차 도곡로(한전)현장점검



2-48차 광평로(한전) 현장점검



2-115차 양재대로(통신)현장점검



2-59차 방고개로(한전) 현장점검
