

서울특별시품질시험소

우 137-140 서울시 서초구 태봉로 131 (우면동) / 전화 (02)3462-7213 ~ 4 / 전송 3462-7210
 처리부서 : 토질재료시험과(본관1층) 과장:장동우 , 담당:김득원

문서번호: 토질재료시험과 -

시행일자: 2014. .

수 신 :

참 조 :


제 목 :

시 험 성 적 서

공사명: 시험완료일: 2014.6.30.
 시험번호: 포-16 (NO.) 시료채취장소: 기술책임자: 장동우
 시료종류: 보조기층재 SB-2 시험 대상량 : 1 점 시험자: 김득원
 시험접수일: 2014.6.26. 시료 채취자 : 시료채취일:

밀 도	Density	-	g/cm ³	소성지수 P.I	-	최적함수비 O.M.C	-	(%)
흡수율	Absorption	-	(%)	수정 CBR	-	씻기시험(#200체통과량)	10.0	(%)
마모율	Abrasion	-	(%)	최대건조밀도 (MaxDryDensity)	-	g/cm ³	-	(%)

체가름통과율표
 PERCENT PASSING OF
 SIEVE ANALYSIS

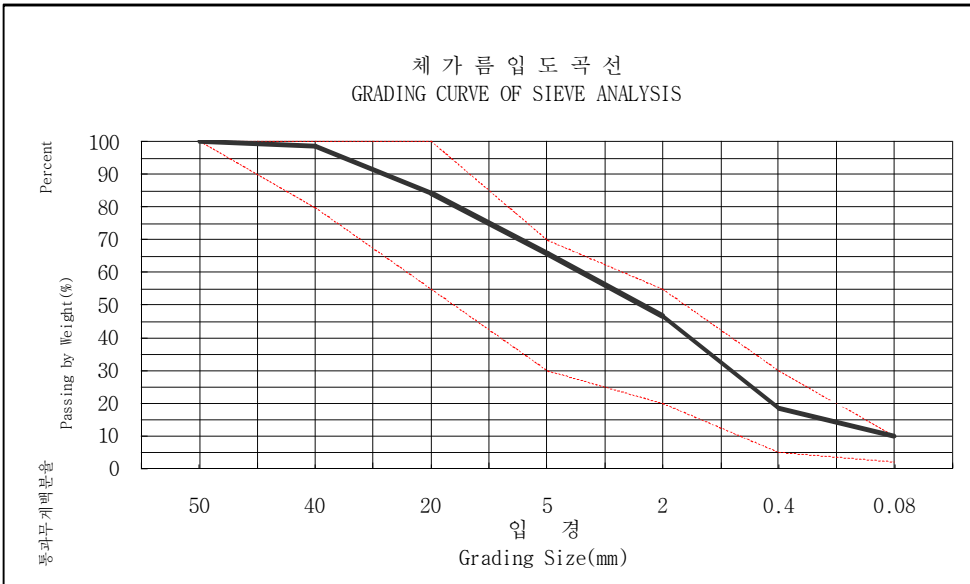

체의크기 (mm)	통과율 (%)
75	-
50	100
40	99
25	-
20	84
15	-
5	66
2.0	47
0.4	18
0.08	10
pan	

※ 시험방법 : KS F 2306:2000, KS F 2502:2005, KS F 2503:2007, KS F 2511:2007, KS F 2303:2000, KS F 2320:2000, KS F 2312:2001

※ 기준 : 서울특별시 전문시방서 참조

※ 위 내용은 의뢰자가 제공한 시료의 시험결과임

서울특별시품질시험소장

골 재 체 가 림 시 험 표

시료번호 : 포-16

시 험 일 : 2014.6.30.

시험방법 : KS F 2502:2005

기술책임자: **장흥규**

시 험 자 : **김득원**

구 분	SB-2	보조기층재(SB-2)			
		통과량 (g)	통과율 (%)	기준	비고
체 크 기 (mm)	잔 유 량 (g)				
0	-	0.0	0%		
0	-	0.0	0%		
-	-	7997.8	100.0%	-	
0	-	7997.8	100.0%		
53.0	-	7997.8	100.0%	100	
37.5	111.8	7886.0	98.6%	80 - 100	
-	-	7886.0	98.6%	-	
19.0	1,142.3	6743.7	84.3%	55 - 100	
0	-	6743.7	84.3%		
0	-	6743.7	84.3%		
4.75	1,476.2	5267.5	65.9%	30 - 70	
0	-	5267.5	65.9%		
2.0	1,540.1	3727.4	46.6%	20 - 55	
0	-	3727.4	46.6%		
0	-	3727.4	46.6%		
0.425	2,255.0	1472.4	18.4%	5 - 30	
0	-	1472.4	18.4%		
0	-	1472.4	18.4%		
0	-	1472.4	18.4%		
0.075				0 - 10	
FAN	1,472.4				
합 계	7,997.8				
비 고					

