


잔여공사예정공정표

현장명 : 시립중랑 노인전문요양원 증축공사

작성일 : 2018년 6월 25일

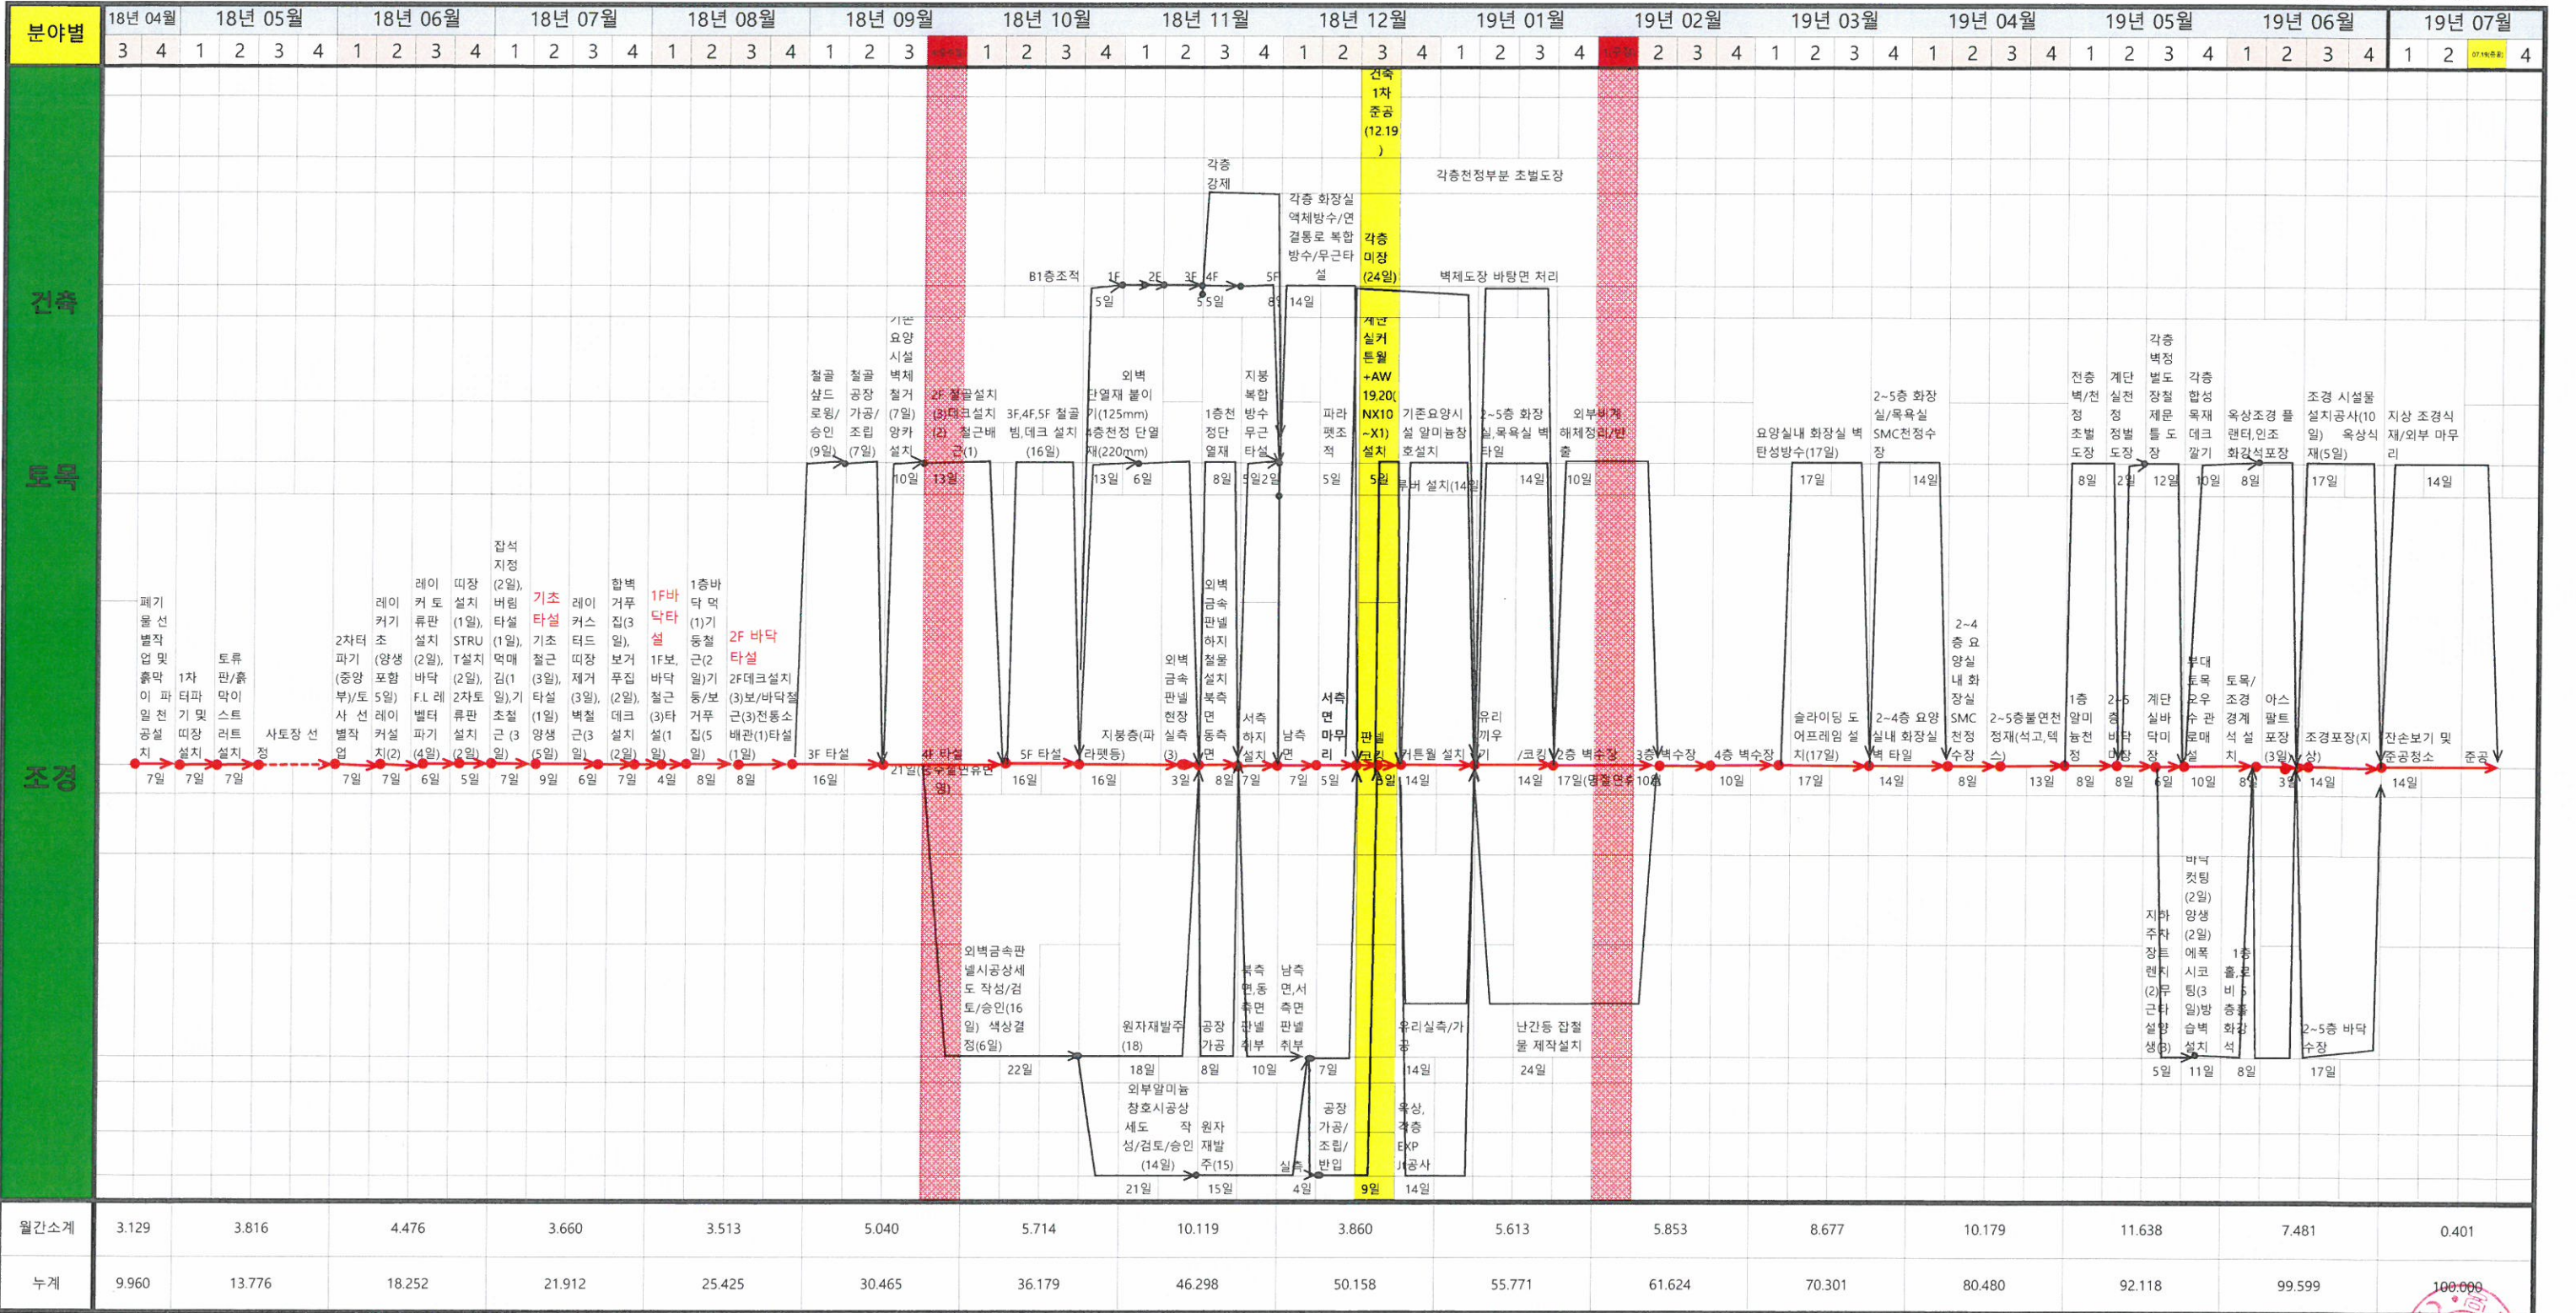

작성자 : 용성종합건설(주) 현장대리인 박재현 (인)

검토 : 책임건설사업관리기술자 이진규 (인)



잔여공사 보할 공정표

현장명 : 시립중앙노인전문 요양원 증축공사

작성일 : 2018년 06월 25일

코드	대분류	작업명	계획시작일	계획종료일	단위	계수	금액(단위:원)	보할(%)	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	보합합계	보합증감			
									12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05			06	07	
A01	건축	가설사무소/참고	2018-01-01	2018-01-30	식	1	23,101,850	0.981											0.981								0.981	0.000			
A02	건축	방음벽설치	2018-01-01	2018-02-28	식	1	26,823,170	1.139			0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.064	0.064	0.064	0.064	0.064	1.139	0.000			
B01	건축	가설공사	2018-07-01	2018-09-30	식	1	61,403,481	2.609							0.200	0.200	0.200	0.200	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	2.609	0.000			
C01	건축	토 및 지점공사	2018-05-28	2018-06-29	식	1	1,275,828	0.054							0.054												0.054	0.000			
D01	건축	철근콘크리트공사	2018-06-11	2018-10-30	식	1	270,159,941	11.496							2.299	2.299	2.299	2.299	2.300								11.496	0.000			
E01	건축	철골공사	2018-06-11	2018-10-30	식	1	66,132,075	2.809							0.121	0.122	0.782	1.002	0.782								2.809	0.000			
F01	건축	조적공사	2018-10-18	2018-11-30	식	1	34,546,632	1.467										0.587	0.880								1.467	0.000			
G01	건축	틀공사	2019-04-01	2019-05-31	식	1	13,238,934	0.562														0.112	0.169	0.169	0.112		0.562	0.000			
H01	건축	타일공사	2019-03-01	2019-04-30	식	1	25,601,260	1.087														0.326	0.326	0.435			1.087	0.000			
I01	건축	목 및 수장공사	2019-01-01	2019-06-30	식	1	283,205,995	12.033												2.006	2.006	2.006	2.006	2.006	2.003		12.033	0.000			
J01	건축	방수공사	2018-11-01	2019-03-31	식	1	79,406,020	3.373										1.011				1.181	1.181				3.373	0.000			
K01	건축	지붕 및 흥룡공사	2019-02-01	2018-02-28	식	1	1,983,298	0.084													0.084						0.084	0.000			
L01	건축	금속공사	2018-12-01	2019-02-28	식	1	124,900,140	5.306											0.531	0.531	1.061	1.061	1.061	1.061			5.306	0.000			
M01	건축	미장공사	2018-11-01	2018-12-31	식	1	52,569,651	2.233										0.782	1.161					0.290			2.233	0.000			
N01	건축	창호 및 유리공사	2018-09-01	2018-11-30	식	1	106,670,776	4.532										0.906	0.906	0.906	0.453	0.453	0.454	0.454			4.532	0.000			
O01	건축	철공사	2018-12-01	2019-05-31	식	1	36,360,791	1.544												0.309				0.463	0.618	0.154	1.544	0.000			
P01	건축	기타공사	2019-05-01	2019-06-30	식	1	42,798,477	1.818									0.180	0.364	0.364	0.182				0.182	0.364	0.182	1.818	0.000			
Q01	건축	철거공사	2018-06-01	2018-10-31	식	1	3,985,462	0.169									0.169										0.169	0.000			
R01	건축	골재비	2018-11-01	2018-12-31	식	1	33,327,004	1.416							0.098				0.328	0.330			0.330	0.330			1.416	0.000			
S01	건축	운반비	2018-06-01	2018-10-31	식	1	2,178,368	0.092							0.015	0.015	0.015	0.015	0.016	0.016							0.092	0.000			
T01	건축	작업부산물	2018-10-01	2018-10-31	식	1	-944,689	-0.040																			-0.040	0.000			
UA01	토목공사	철거공사	2018-01-01	2018-02-28	식	1	2,345,840	0.099		0.049	0.050																0.099	0.000			
UB01	토목공사	토공사	2018-05-01	2019-06-30	식	1	8,316,582	0.353									0.118							0.118	0.117		0.353	0.000			
UC01	토목공사	우수공사	2019-05-01	2019-06-30	식	1	10,179,713	0.432																0.216	0.216		0.432	0.000			
UD01	토목공사	오수공사	2018-05-01	2019-06-30	식	1	4,264,990	0.181						0.090										0.091			0.181	0.000			
UE01	토목공사	포장공사	2018-05-01	2019-06-30	식	1	5,676,715	0.241							0.050									0.098	0.093		0.241	0.000			
UF01	토목공사	주요자재대	2018-05-01	2019-06-30	식	1	5,323,093	0.226							0.043									0.088	0.095		0.226	0.000			
UG01	토목공사	토공사	2018-02-01	2018-05-30	식	1	64,599,565	2.744					0.274	0.686	1.784												2.744	0.000			
UH01	토목공사	흙막이공사	2018-02-01	2018-05-30	식	1	64,580,094	2.743					0.685	0.686	0.686	0.686											2.743	0.000			
UI01	토목공사	운반공	2018-02-01	2018-04-30	식	1	1,258,071	0.053					0.027	0.026													0.053	0.000			
UJ01	토목공사	주요자재대	2018-02-01	2018-02-28	식	1	18,473,422	0.784					0.196	0.196	0.196	0.196											0.784	0.000			
VA01	조경공사	수목제거공사	2018-01-01	2018-01-31	식	1	1,089,735	0.046		0.046																	0.046	0.000			
VB01	조경공사	수목식재공사	2019-05-01	2019-06-30	식	1	39,821,641	1.692																0.846	0.846		1.692	0.000			
VC01	조경공사	시설물/포장공사	2019-05-01	2019-06-30	식	1	40,562,357	1.723																0.862	0.861		1.723	0.000			
W01	간접비	경비/VAT/보철료외	2017-12-20	2019-07-19	식	1	798,293,717	33.919	0.000	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884	1.678	0.864	0.814	1.332	1.183	1.545	0.177	1.906	1.985	2.943	3.452	3.947	2.537	0.136	33.919	0.000	
직접공사비 소계									0.000	0.095	0.113	0.971	1.245	1.932	2.798	2.796	2.699	3.708	4.531	8.574	3.683	3.707	3.868	5.734	6.727	7.691	4.944	0.265	66.081		
직접공사비+간접공사비 소계									0.000	1.979	1.997	2.855	3.129	3.816	4.476	3.660	3.513	5.040	5.714	10.119	3.860	5.613	5.853	8.677	10.179	11.638	7.481	0.401	100.000		
직접공사비+간접공사비 누계									-	1.979	3.976	6.831	9.960	13.776	18.252	21.912	25.425	30.465	36.179	46.298	50.158	55.771	61.624	70.301	80.480	92.118	99.599	100.000			
