



대영유비텍주식회사

수신자 서부도로사업소 소장

(경유)

(참조) 기전과장

제 목 2017년 교통신호기 신설공사(연간단가)-서부 기성준공검사 결과보고

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관련근거
 - 가. 계약번호 20170439775(2017.04.18)2017년 교통신호기 신설, 개량 유지 보수공사 감리용역(서부, 강서권)
 - 나. 계약번호 20170331147-01(17.09.13)17년 교통신호기 신설공사(연간단가)
 - 다. 기전과-5482(2017.05.22)2017년 교통신호기 신설공사(연간단가) 작업지시 및 감리업무지시(1차)
 - 라. 대영GE17A-08-07(2017.08.29)교통신호기 신설공사 1차작업지시 완료보고
 - 마. 기전과-10319(17.09.13)교통신호기 신설공사(연간단가)설계변경승인
 - 바. 동신1709-06(17.09.14)교통신호기 신설공사(연간단가)기성준공서류 제출
 - 사. 대영GE17A-09-13(2017.09.14)2017년 교통신호기 신설공사(연간단가)-서부 기성준공서 제출
 - 아. 대영GE17A-09-15(2017.09.14)2017년 교통신호기 신설공사(연간단가)-서부 기성준공검사계획서 제출
3. 상기 관련 2017년 교통신호기 신설공사(연간단가)의 준공검사 결과를 보고합니다.

- ▣ 검사일자:2017년 09월 18일 ▣ 검사대상:1차작업 완료지역
 - ▣ 확인자:주무관 심예선 ▣ 검사자료:도면, 사진, 검측자료외
 - ▣ 검사자:비상주감리원 이현재
 - ▣ 입회자:책임감리원 강광환 현장대리인 김승구
- 첨부 1.준공 검사조서 1부
2.준공검사 결과 및 사진 1식

대영유비텍주식회사 책임감리원



담당자 나 정 호

책임감리원

강 광 환

협조자

시행 대영CE17A-09-20호 (2017.09.19) 접수

(. . .)

주소 153-801 서울시 금천구 가산동60-25 에이스 하이엔드타워6차703호

전화번호 대표) 070-7432-3000

직통) 070-7432-3121 팩스번호 02) 2633-5838 www.dyeng.net datec@paran.com

기성준공 검사조서

1. 공 사 명 : 2017년 교통신호기 신설공사(연가단가)-서부
2. 계 약 금 액 : ₩ 454,575,610
3. 기 성 금 액 : ₩ 237,413,000
4. 잔 여 금 액 : ₩ 217,162,610

위 공사의 기성부분에 대하여 2017년 09월 18일 검사한 결과 전체공사에 대하여 기성율이 52.2%가 완료되었음을 확인함.

2017년 09월 19일

대영유비텍주식회사

검사자 비상주 감리원 : 이 현 재

확인자 책임 감 리 원 : 강 광 환



서울특별시 서부도로사업소장 귀하

<기성준공검사 CHECK LIST>

공사명: 2017년 교통신호기 신설공사(연간단가)

검사항목

검사장소: 동대문주차장외 17개소

검사일자 2017년 09월 18일

공 종	검 사 내 용	기 준	검 사 결 과	
1	교통신호제어기	1.제어기내 등기선 결선상태 2.부품(LSU외)의 정상설치 확인 3.외관, 시건 및 2010년형 UP-GRADE 확인 4.준공표지 설치 및 DB, 관리대장비치상태 5.ON-LINE 상태(ON-LINE REPORT확인) 6.접지시설 설치상태(안전공사검사필증)	2017년도교 통신호공사 관련자료	적함
2	기초앙카설치 (사진참조)	1.적정위치 및 깊이등 설치 확인 2.굴착깊이, 넓이 및 복구마감 상태	2017년도교 통신호공사 관련자료	적함 (시건대리)
3	지주설치 및 케이블포설	1.적정위치, 방향, 높이상태 2.부착대 방향 및 금구류 설치상태 3.디자인지주 도금, 색상등 외관상태 4.가공선로의 높이, 이도등 설치상태 5.맨홀내 케이블 여장부분 설치상태	2017년도교 통신호공사 관련자료	적함
4	신호등 및 주변기기 설치	1.등면간기준 및 현시고려한 설치상태 2.신호등 밝기 및 각도등 설치상태 3.이설제품 등기구의 청소상태 4.보행, 잔여시간표시기의 작동시간 확인 5.음향신호기의 설치상태 및 음성 확인 6.보행자작동신호기의 정상작동 확인	2017년도교 통신호공사 관련자료	적함
5.	관 로 공 사 (맨홀포함)	1.맨홀 바닥 배수용 자갈포설여부 확인 2.예비관로 관구마개 설치 확인 3.배관내 폼마감 시행 및 선로정리 확인 4.맨홀과 보도면간의 높이 및 방향 확인 5.맨홀위치(경사로)확인-민원예방	2017년도교 통신호공사 관련자료	적함
6	자재검수	1.승인 및 시방서기준 자재사용 확인 2.주요자재 생산년도 년, 월 확인	2017년도교 통신호공사 관련자료	적함
7	기타사항	준공표지는 공공시 일괄부착		* 지적사항 없음

확인자: 서부도로사업소

주 무 관

심 예 선

김대선

검사자: 대영유비텍(주)

비상주관리원

이 현 재

(인) 대영유비텍(주) 서대원 서대원

입회자: 대영유비텍(주)

책임 관리원

강 광 환

(인) 강광환

시공사: 동신전기(주)

현장 대리인

김 승 구

(인) 김승구

2017년 교통신호기 신설공사(연간단가) - 기성준공검사
검사일자:2017년 09월 18일



제어기 L.S.U추가 및 LTE구축 상태 확인



음향신호기 보턴 설치,작동 상태 확인

2017년 교통신호기 신설공사(연간단가) - 기성준공검사
검사일자:2017년 09월 18일



교체제어기 부품수량 및 회선 확인




교량하부 STEEL배관 상태 확인

2017년 교통신호기 신설공사(연간단가) - 기성준공검사
검사일자:2017년 09월 18일




신설맨홀 설치 및 마감상태 확인

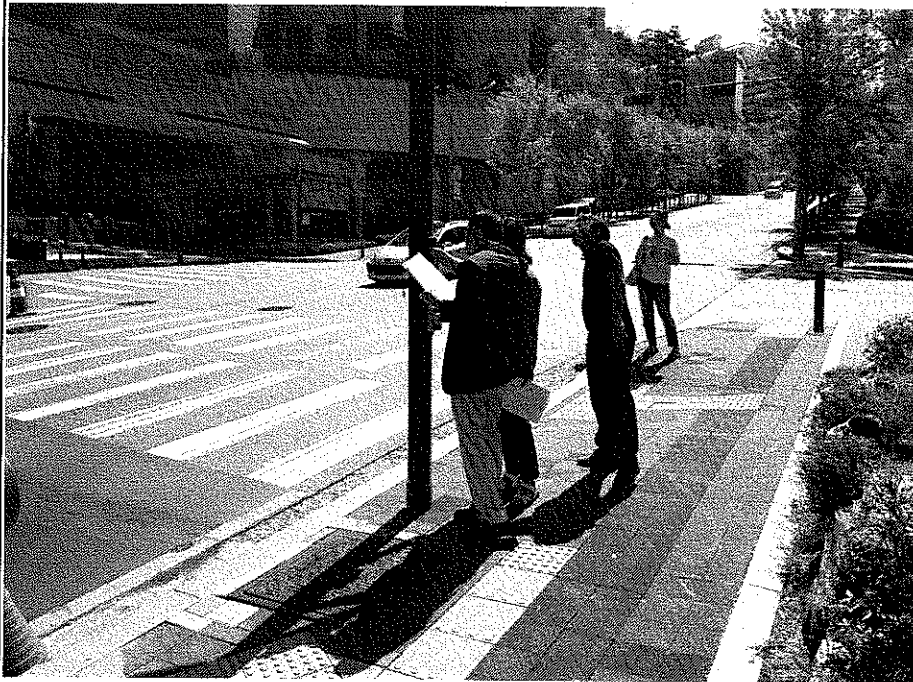

디자인지주 접지시공(연접포함) 확인

2017년 교통신호기 신설공사(연간단가) - 기성준공검사
검사일자:2017년 09월 18일

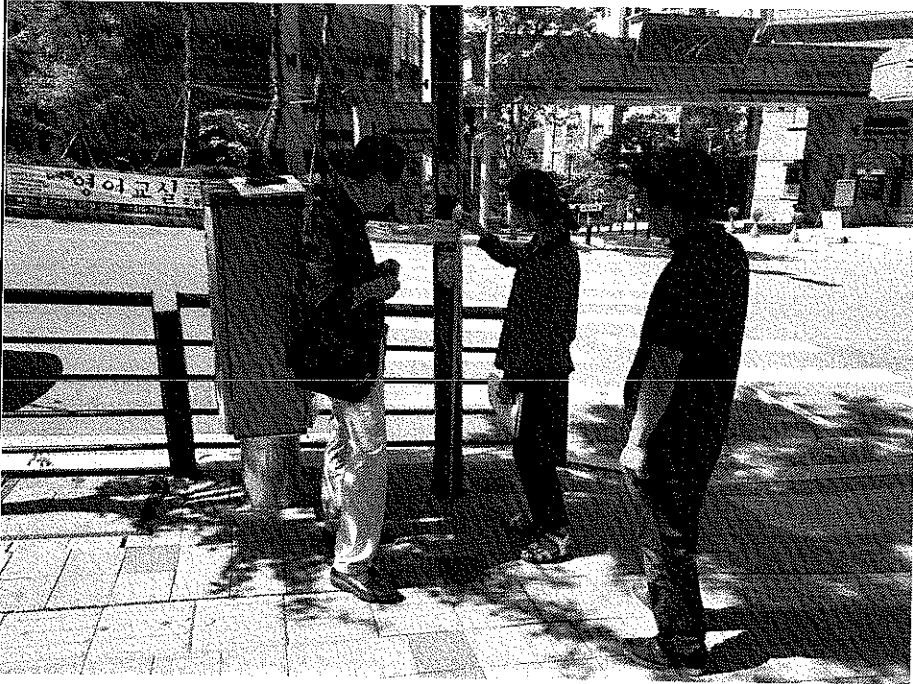

음향신호기 보턴 설치높이 확인



제어기 부품수량 및 DB 상태 확인
