

정기(기동점검) 점검 결과보고

[남산예정자락 재생 기계설비공사[장기-1차]]

□ 점검일시 : 2018.05.28 (월)


□ 점검결과

◆ 점검자 : 홍민철,전용현

○ 감전재해 예방(설비부)

- 설비공사에 사용하고 있는 전기콘센트는 접지선이 단락되어 있고, 접지선이 없는 2선을 사용하고 있어, 여기에 꽂아서 사용하는 모든 기계기구가 미접지되는 상태이니 전수 조사하여 교체 사용하기 바람

※ 건설안전기본지침 공통-017 가설전선

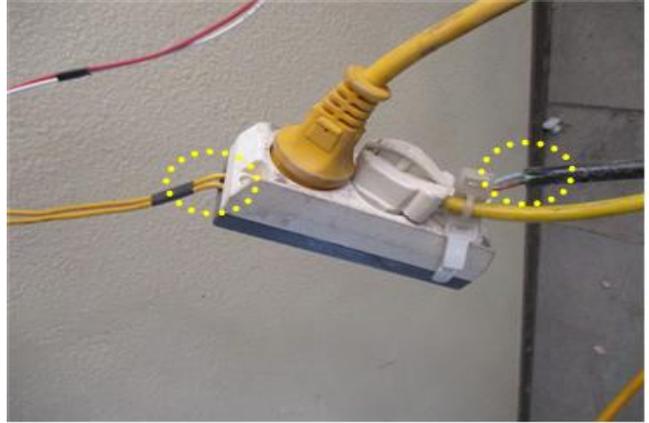

○ 기계기구 안전(설비부)

- 설비공사에 사용하는 핸드그라인더에 보호덮개가 없어 회전날 파단시 안전사고 위험이 있으니 보호덮개를 설치하고 작업하기 바람

※ 건설안전기본지침 V.협착/충돌 재해예방 안전시설 및 작업기준

