

정기(기동점검) 점검 결과보고


[장지하차도~동부간선도로간 연결로 설치 공사]

- 점검일시 : 2018.08.14 (화)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 전용현

○ 가설비계 안전(토목부)

- 설치된 워킹타워 상부에서 근로자 이동 시 흔들림이 발생되고 있으니, 전도 및 추락재해 예방을 위하여 기설치된 구조물에 추가로 고정을 실시하여 유동이 발생되지 않도록 조치 요망.

- ※ 건설안전기본지침 P-45
(작업자 통로확보 및 안전작업기준)
- ※ 건설안전기본지침 공통-8(강관비계)

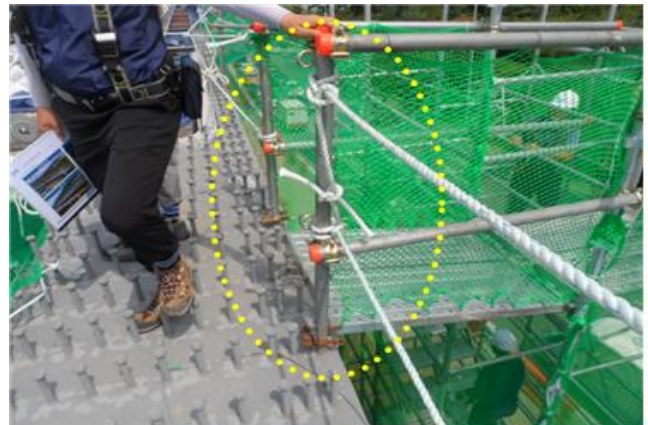

○ 가설통로 안전(토목부)

- U-Type 옹벽 작업구간은 도로면에서 하부 굴착면으로 근로자가 안전하게 이동할 수 있도록 가설계단 형태의 통로를 확보하기 바람.

- ※ 건설안전기본지침 P-45
(작업자 통로확보 및 안전작업기준)



○ 가설통로 안전(토목부)

- U-Type 옹벽 작업구간 시점부는 통로폭이 협소하여 근로자 전도 및 추락재해 우려가 있으니 보완하기 바람.

※ 건설안전기본지침 P-45
(작업자 통로확보 및 안전작업기준)



○ 품질관리(토목부)

- U-Type 옹벽 작업구간은 토공 되메우기용으로 사용하는 골재가 최대관리 기준치(노상 :100mm)를 초과하는 경우가 있으니 다짐도 확보를 위하여 보완하기 바람.

