

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## 〔스페이스 살림 조성공사〕

- 점검일시 : 2020.08.24 (월)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 전해령,이태형

○ 가설비계 안전(건축부)

- 여성가족재단 연결통로 작업을 위해 설치되어 있는 외부비계(H:10M)는 다음사항을 보완 조치  
 요망①비계 벽이음 실시하여 태풍시 피해가 없도록 관리②낙하 및 비산 방지용 천막/분진망은 태풍시 시민들의 피해가 없도록 견고하게 고정 조치 요망  
 ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제59조(강관 비계 조립 시의 준수사항)



○ 감전재해 예방(건축부)

- 폐기물에 묻혀있는 메인 전선은 통전 상태가 불규칙하므로 전기를 차단 후 폐기물반출 등의 주변 작업을 할 수 있도록 관리 요망  
 - 사용하지 않는 분전반은 완전히 해체하거나, 안내문구 등을 붙여 사용 관리하여 감전/화재사고 방지 요망  
 - 전기관련 화재가 재발하지 않도록 관리 요망  
 ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제315조(통로바닥에서의 전선 등의 사용 금지)



○ 전도재해 예방(건축부)

- 시민들이 이용하는 통행로에 적재되어 있는 자재는 고정안되어 있어 태풍시 전도 위험이 있으므로 조치 요망  
※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지)



○ 전도재해 예방(건축부)

- 주차장 램프구간에 보관 된 벽돌은 불안정하게 쌓여있어 전도 위험이 있으므로 조치 요망  
※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지)




○ 화재/폭발/질식 재해 예방(건축부)

- 소화기 점검시기 경과하였음. 전수조사 후 점검표 부착  
※ 건설안전 기본지침  
Ⅶ. 화재/폭발/질식재해예방 안전시설 및 작업기준  
(6)소방시설 설치 및 관리



○ 추락재해 예방(건축부)

- 옥상정원 측 난간 미설치된 부분 추락위험 있음. 안전난간 추가설치요함.  
- 동측 연수동 선큰 공간 안전난간 미설치된 부분 추가설치요함.  
- 마을부역 외부계단 난간 미설치된 상태로 출입통제 되지 않고 있음. 추락위험 있으므로 통제 조치요함.

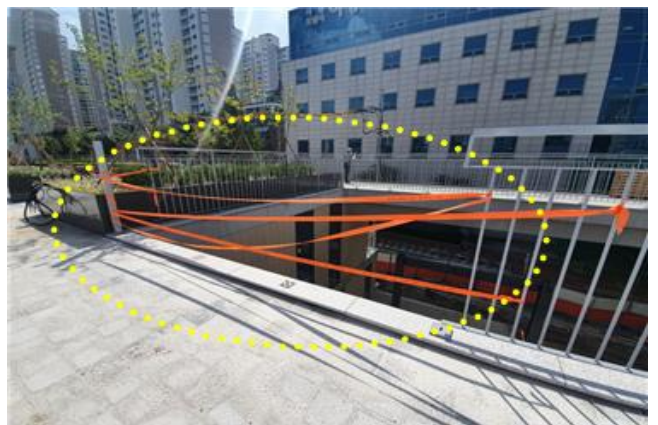

※ 건설안전 기본지침 공통-001  
(안전난간)

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제13조 (안전난간의 구조 및 설치요건)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(건축부)

- 분전반 누전차단기 50A에  
16~20A 콘센트 연결되어 있어  
화재발생 위험 있음. 30A 누전차 단기 설치  
하여 콘센트 연결요함.

- 분전반 미접지 상태임. 접지  
요함. 분전반 충전부 보호커버  
설치요함.

- 분전반 화재가 재발생하지 않도록 분전반 관  
리 요망

※ 건설안전 기본지침 공통-016  
(분전반)





○ 건설기계 안전(건축부)

- 부대토목공사 굴삭기 안전핀 미체결되어 있음. 체결 후 작업요함.
- 장비작업계획서 상 굴삭기 사용기간 만료되었음. 현재 상황에 맞게 수정작성 및 장비실명제 관리카드 부착요함.
- ※ 건설안전 기본지침 공통-032 (굴삭기)



【차량계·리프트계/건설기계/착탈물】작업계획서  
 [표준화된 관리형 안전·사고 조치]

구분	구분명	구분코드	구분내용	구분상태	구분일자
구분명	굴삭기	001	굴삭기	정상	2023-10-10
구분명	리프트	002	리프트	정상	2023-10-10
구분명	차량계	003	차량계	정상	2023-10-10
구분명	착탈물	004	착탈물	정상	2023-10-10

본 계획서 작성 시, 안전관리 담당자 및 작업자 모두가 준수하여야 하며, 작업 전 반드시 안전점검을 실시하여야 합니다. 본 계획서 상의 안전관리 항목을 철저히 준수하여 사고 예방을 위하여 노력하여야 합니다. 본 계획서 상의 안전관리 항목을 철저히 준수하여 사고 예방을 위하여 노력하여야 합니다.

작성: [안전관리팀] / 검토: [안전관리팀] / 승인: [안전관리팀]

작성 일자: 2023-10-10 / 검토 일자: 2023-10-10 / 승인 일자: 2023-10-10
