

# 정기(기동점검) 점검 결과보고



## [강북노동자복지관 증축 및 리모델링공사]

- 점검일시 : 2022.01.19 (수)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 정달영, 이영주

### ○ 가설비계 안전(건축부)

- 1-1) 5층 이동식비계 3개와 중간을 장선재 +합판을 이용하여 사용 중이며 아웃트리거 미설치 되어 있으니 보완 요하며
- 1-2) 안전난간이 변형, 미설치 되어 있으니 보강하고, 발끝막이판 등 설치를 보완
- 1-3) 연결부 장선지지의 안전성을 확인하고 필요시 보완 요함.(길이 및 개수)
- 1-4) 가새재 누락된 곳은 설치 요함.
- 1-5) 단독으로 사용된 이동식비계도 1-1~1-4의 내용을 참고하여 동일하게 보완 요함.
- 1-6) 이 작업을 위한 이동식비계에 대한 위험성평가가 미비하고 조립 등 사항에 대한 누락사항 등이 있으니 보완 요함.

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제58조(비계의 점검 및 보수), 제68조(이동식비계), 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건)

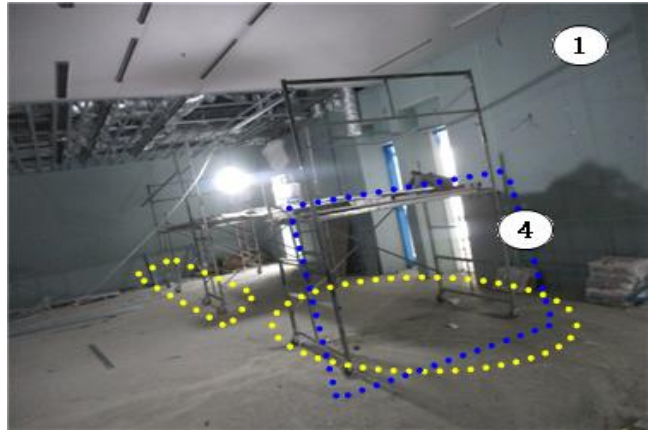

### ○ 감전재해 예방(건축부)

- 2-1) 사무실에 사용된 전선이 2P선이니 접지가 되는 3P선 사용 요함.
- 2-2) 벽체 작업 중인 장소의 누전차단기 설치된 콘센트가 미접지 상태이니 가설전선은 반입 및 사용시 정기적으로 접지상태 확인 요함.

※ 건설공사장 안전관리지침 감전-3(가설전선)



