

⊗ 주식회사 동일기술공사

우05800 서울특별시 송파구 송이로 30길7 / 전화:(02)3400-5813/팩스:(02)431-3151/담당:정병성

문서번호 : 동일(감리) 제 19 - 692호

시행일자 : 2019. 03. 20.

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참 조 : 토목부장

제 목 : 건설폐기물 처리용역 준공기한 연기요청(총차 및 3차공사)

선 결	부 장		지 시		
접 수	일 자 간		결 재 · 공 람	광 역 도 로	
	번 호			과 장	
	처 리 과				
	담 당 자				

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리회사에서 건설사업관리용역 수행중인 『남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사 건설폐기물 처리용역』 과 관련하여 선행공정인 토목공사 공기연장에 따라 용역사인 탄용환경개발(주)로부터 용역기간 연장 요청을 제출받아 불입과 같이 보고드리니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 검토의견서 1부.

2. 용역사 공기연장사유서 1부.

3. 공기연장 근거자료 1부.

4. 탄용관리 1903-033호 공문사본 각 1부. 끝.

서울특별시 송파구 송이로 30길7


주식회사 동일 기술 공사

대표이사 황 주



검 토 의 견 서


용역명	남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사 건설폐기물처리용역		
검토건명	총차 및 3차용역 준공기한 연기요청		
관련문서	탄용관리 제1903-033호(2019.03.20)	작성자	김 정 근 (인)
검토일자	2019. 03. 20	확인자	이 영 모 (인)



□ 사업개요

- 용역명 : 남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사 건설폐기물 처리용역
- 위 치 : 남부순환로 매봉초등학교 ~ 오류IC간
- 규 모
 - ▷ 페콘크리트 : 18,321ton (3차 : 2,899ton)
 - 페 아스콘 : 16,618ton (3차 : 2,106ton)
 - 혼합폐기물 : 733ton (3차 : - ton)
 - 임목폐기물 : 32ton (3차 : - ton)
- 용역기간 : (총차 2016.04.05. ~ 2019.03.30.)
(3차 2018.03.13. ~ 2019.03.30.)
- 도 급 액 : 총차 762,585,000원 (3차 100,000,000원)
- 용 역 사 : 탄용환경개발(주)
- 건설사업관리사 : (주)동일기술공사 외 3개사

□ 위치도 및 조감도

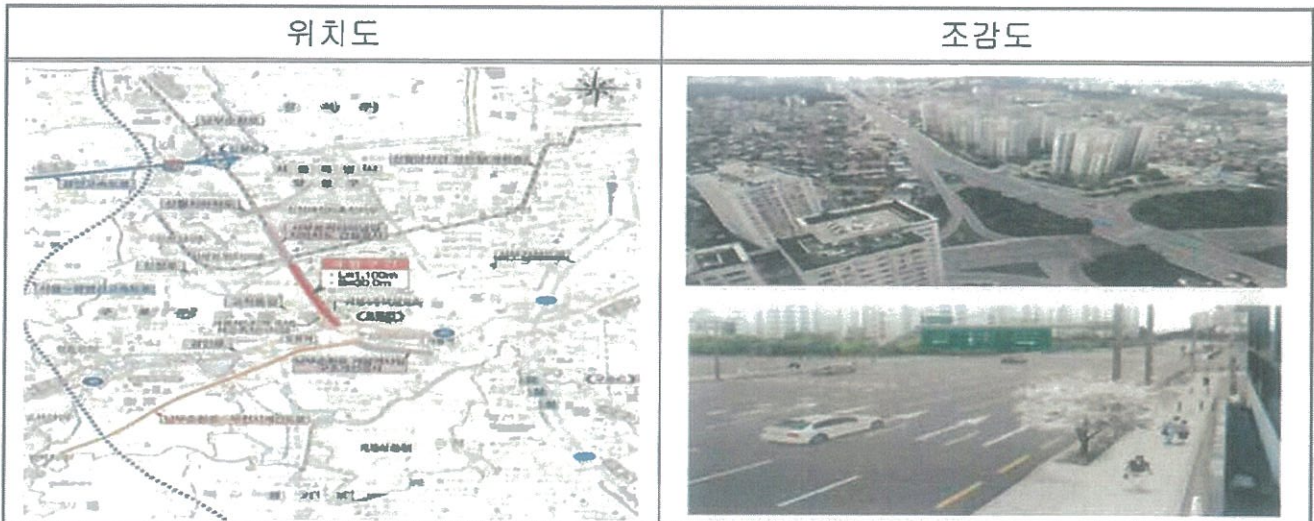

□ 건설폐기물 처리용역 준공기한 연기검토

(1) 준공기한 연기 요청내용

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차	2016.04.05 ~ 2019.03.30	2019.04.01 ~ 2020.12.31	증)642일
3 차 용 역	2018.03.13 ~ 2019.03.30	2019.04.01 ~ 2019.12.31	증)276일

(2) 용역기간 연기요청 산출근거

구 분	산출근거	공기연장 산정일수	비 고
총차2회	2019.04.01 ~ 2020.12.31	642일	
3차2회	2019.04.01 ~ 2019.12.31	276일	

(3) 공기연장 사유

- 총차 공사 : 선행공종인 토목공사 공기연장에 따른 폐기물처리용역 준공기한연기
- 3차 공사 : 선행공종인 토목공사 공기연장 및 구조물철거 물량 시기 미도래에 따른 절대공기 부족에 의한 준공기한 연기

□ 3차 잔여공사 추진계획 공정표

공 종		작업량	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
폐 기 물	폐콘크리트(무근)	585ton	[Shaded]										
	폐콘크리트(철근)	2,314ton	[Shaded]										
	폐 아 스 콘	2,106ton	[Shaded]										
공 사 비		월 계	10백만원		30 백만원			30 백만원			30 백만원		
		누 계	10백만원		40 백만원			70 백만원			100 백만원		

□ 수정 공정계획 검토

구 분	당 초	변 경	비 고
총차 준공기한	2019.03.30	2020.12.31	• 증 642일
3차 준공기한	2019.03.30	2019.12.31	• 증 276일
3차공사 도급비	100백만원	100백만원	• 변경없음
검 토 의 견	<ul style="list-style-type: none"> • 선행공종인 토목공사 공기연장에 따른 폐기물처리용역 총차 및 3차용역 준공기한연기 적용이 타당함. 		

□ 검토의견

- 「남부순환로(개봉1동 사거리주변)평탄화공사 건설폐기물 처리용역」 시행중 총차 및 3차용역연장은 선행 공종인 토목공사 현장에서 발생된 건설폐기물을 처리하는 용역으로서, 용역기간 연장을 시행 하는것이 타당하다고 사료되는바, 원활한 공사수행을 위하여 지방자치단체 공사계약일반조건 제8절 2.(계약기간의 연장)에 의거 준공기한을 연기하는 것이 타당하다고 판단됨.

2019. 03. 20

책임건설사업관리기술자 이 영 모





탄 용 환 경 개 발 주 식 회 사

우 27473 충북 충주시 대소원면 창현로 911 / TEL : 043)856-0050 ~ 1, FAX : 043)856-0052

문서번호 : 탄용관리 1903 - 033 호

시행일자 : 2019년 03월 20 일

수 신 : 책임건설사업관리기술자

참 조 :

제 목 : "남부순환(개봉1동 사거리주변)평탄화공사 건설폐기물처리용역" 준공기한 공기연장신청 건

선결		지시	
접수	일자	결재 · 공람	
	시간		
	번호		
처리과			
담당자			
심사자		심사일	

1. 귀 단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2016년04월04일에 계약하고 시행중인"남부순환로(개봉1동 사거리주변)평탄화공사 건설폐기물처리용역" 관련하여 토목공사 공기에 따른 총차 및 3차2회 공기연장신청서를 붙임과 같이 요청합니다.

- 붙 임 :
1. 준공연기 신청서 1부
 2. 변경 예정공정표 1부
 3. 합의각서 1부 끝.

탄 용 환 경 개 발 주 식 회 사
대 표 이 사 신 동 협

