

- 남산예정자락 재생사업(공원 및 주차장) -

공 사 현 황

2019. 4.



서울특별시
도시기반시설본부

1 공사 조감도

시공 전 현황



조감도



2 공사 개요


- 공사위치 : 서울시 중구 예장동 4-1번지 교통방송 일대(23,494 m^2)
- 공사규모 : 지하주차장(버스 39대, 소형2대), 교량(2개소), 교통체계개선 등
- 공사기간 : 2017년 8월 31일 ~ 2019년 12월 31일
- 도 급 사 : 갑을산업개발(주) 외 3개사
- 감리/설계 : (주)동성엔지니어링 외 2개사 / (주)시아플랜건축
- 도 급 비 : 총괄 32,485백만원(2차 : 3,501 백만원)

3 추진 현황 및 향후 계획 (공정율 : 25%)

- 2017. 08. 31 : 공사착공
- 2017. 10. 26 : 공사중 교통소통대책 자문(조건부 가결)
- 2018. 04. 27 : 교통규제심의 완료(서울지방경찰청)
- 2018. 07. 02 : 소방재난본부 리모델링 완료 및 식당개장
- 2019. 4월 현재
 - 보도육교 교대(1, 2) 시공 완료
 - 신설도로 및 확장도로 구간 지장물이설(도시가스, 한전, 통신 등)
 - 우수BOX 터파기 및 부설 중
 - 퇴계로 및 삼일로 확장공사 시행중
- 2019. 04. 25 : 도로 개설 완료 및 지하차도 폐쇄 예정
- 2019. 12. 31 : 공사 완료 예정

4 교통 체계개선

현재 운영중인 교통체계(현재)

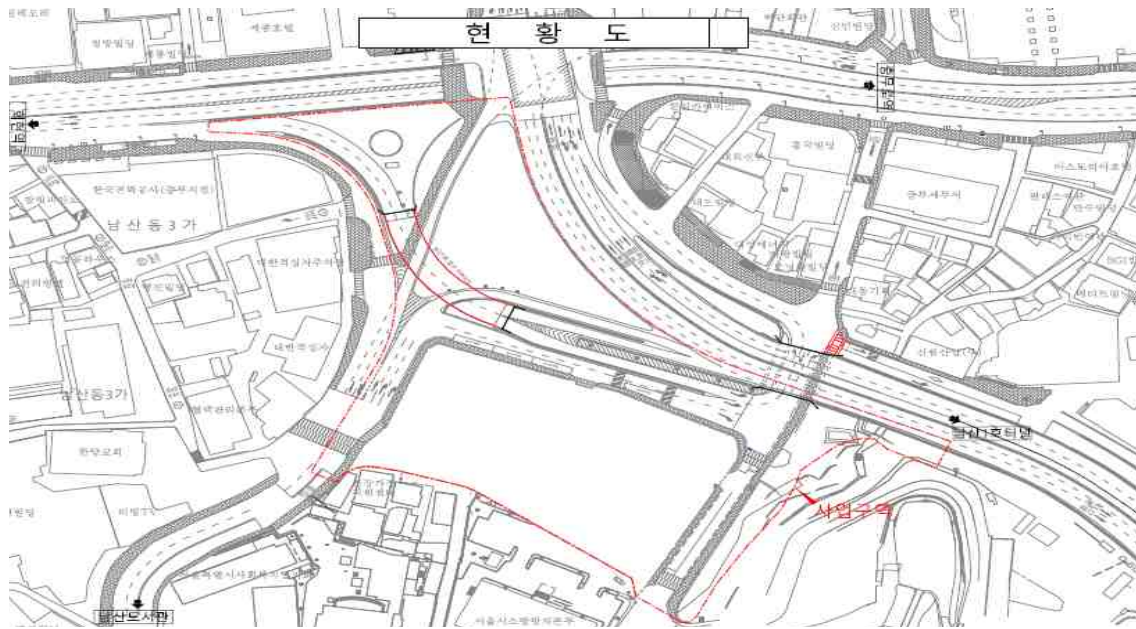

교통체계 개선 후(변경)

