



강 남 구



수신 서울교통공사사장


(경유)

제목 청담역 미세먼지 프리존 조성을 위한 보행통로 일시 차단 협조 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 우리구는 청담역 지하 3층 보행공간의 공기질 개선과 함께 청담역을 이용하는 시민에게 보다 쾌적한 환경을 제공하기 위해 노후 시설물을 개선중입니다.
3. 효율적인 공사 진행 및 시민의 안전을 위해 아래 **환경개선구간의 보행을 일시 차단**코자 하니, 청담역 미세먼지 프리존이 조속히 시민에게 제공될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 보행 차단 개요

- 1). 차단 기간 : 2019. 11. 17. ~ 12. 8.(예정)
- 2). 차단 구간 : 아래 그림 참조

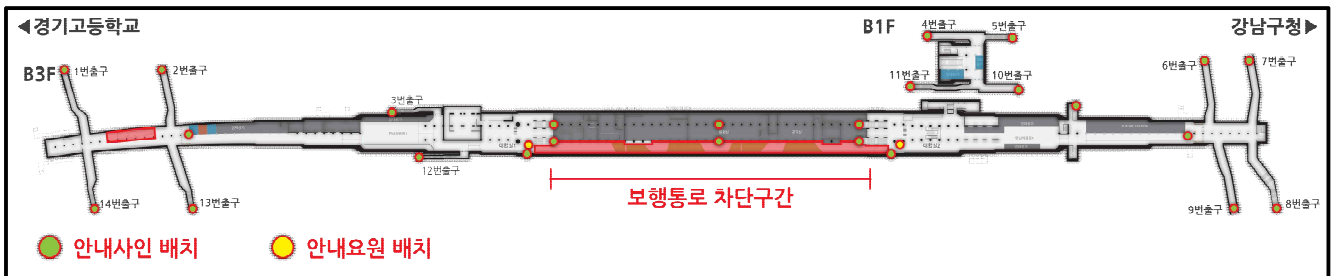

나. 차단 계획

- 1). 차단구간 양측 2개소에 안내요원 배치
- 2). 출구(14개소) 및 승강장(6개소), 엘리베이터(2개소)에 안내문 게시
- 3). 승강장내 화장실 유도 안내문 게시
- 4). 우회 보행자용 임시 출입증 제작
- 5). 직원 공간 6개실 공기청정기 설치(공사 기간)
- 6). 직원 임시 통행로 조성
- 7). 청담역 야간 근무자 숙박비 지급(야간 소음 공사시)
- 8). 집진기 등을 활용한 공사시 환기 유의 등

[붙임]1. 예정 공정표 1부. 끝.

강 남 구 청 장



주무관 **김충현** 주택기획팀장 **조장원** 공동주택과장 직전결 11/12 무대리 代조장원

협조자

시행 공동주택과-33896 (2019.11.12.) 접수 ()
우 06090 서울특별시 강남구 학동로 426 (삼성동) / www.gangnam.go.kr
전화 02-3423-6052 /전송 02-3423-8901 / sharpch@gangnam.go.kr / 대시민공개

청담역 미세먼지 프리존 조성 용역 예정공정표

WORKING SCHEDULE

2019년 10월 28일 월요일

구분	공종명	공정율		10																												11							12							시운전	준공																																																								
		M	W	17주							18주							19주							20주							21주							22주									23주							24주							25주							26주							27주							28주							29주							30주						
				D	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																												
프로젝트 총괄	공정단계 구분	제작 및 현장설치																																																																																																					
		전체	100.00%																																																																																																				
설계	설계진행	5.00%	4.80%																																																																																																				
		전체	38.45%																																																																																																				
환경개선	가설공사	1.00%	0.80%																																																																																																				
	목공사	0.50%	0.48%																																																																																																				
	철거공사	1.00%	0.80%																																																																																																				
	설비공사	3.00%	2.40%																																																																																																				
	공기청정기설치	10.00%	0.00%																																																																																																				
	금속공사	12.00%	7.20%																																																																																																				
	경량공사	1.00%	0.40%																																																																																																				
	습식공사	0.50%	0.24%																																																																																																				
	도장공사	1.50%	0.00%																																																																																																				
	타일공사	0.50%	0.00%																																																																																																				
	기타 마감	0.50%	0.00%																																																																																																				
	준공청소	0.20%	0.00%																																																																																																				
제작 설치	3번출구	1.20%	0.45%																																																																																																				
	12번출구	1.20%	0.15%																																																																																																				
	2~13번출구	3.00%	0.00%																																																																																																				
	4~5번출구	3.00%	0.00%																																																																																																				
	10~11번출구	1.80%	0.00%																																																																																																				
	6~9번출구	1.80%	0.00%																																																																																																				
전기	전기공사	20.00%	5.17%																																																																																																				
조경	바이오월	7.00%	3.22%																																																																																																				
	인조조경 (GRC연출)	4.00%	1.00%																																																																																																				
	인조조경 (인조조경연출)	3.00%	0.98%																																																																																																				
시스템	시스템HW	9.00%	5.55%																																																																																																				
	시스템SW	7.00%	4.07%																																																																																																				
사면	디자인	1.30%	0.74%																																																																																																				

(주)강남구청 귀중
