



문서번호	보육가족과-32566
결재일자	2015. 12. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	보육기획팀장	보육가족과장	주민생활국장	
김자겸	최현복	고영희	12/18 소판수	
협조	지방공업주사 김민홍			

- 왕십리동, 금호동 -

## 장난감세상 신설공사 완료 보고

2015. 12.



**성 동 구**  
(보육가족과)



## 장난감세상 신설공사 완료 보고

영유아에게 다양한 놀잇감을 접할 수 있는 환경과 기회를 제공하고 부모들의 장난감 구매에 따른 재정적 부담을 경감하고자 추진한 「장난감세상(왕십리, 금호) 신설공사」가 완료되어 준공처리 하고자 함.

### I | 추진 근거

- 영유아보육법 시행령 제13조(육아종합지원센터의 기능)
- 영유아 장난감 대여소 확충계획  
(구청장방침 제301호, 보육가족과-13569호 '15.5.15.)
- 영유아 장난감세상 확충 세부계획(보육가족과-22977호 '15.9.1.)
- 왕십리동, 금호동 장난감세상 신설공사 시행계획  
(보육가족과-27910호, '15.10.26.)

### II | 사업 개요

- 위치 및 규모

대상 시설	위 치	규 모	비 고
왕십리동 장난감세상	상왕십리동 346 왕십리교회 내 2층	229.9㎡	
금호동 장난감세상	금호동2가 1212 금호2,3가동 주민센터 내 4층	44.5㎡	

- 공사종별: 개·보수 및 인테리어
- 신설시설: 장난감 전시실, 놀이공간, 소독실, 사무실, 수유실, 화장실 등

계약사항

구 분	시공사	대표자	도급비	공사기간
건 축	(주)창광건설	이미미	104,148,000원	'15.11.16.~'15.12.15.
전 기	대원일렉콘(주)	박운섭	19,100,000원	

### Ⅲ | 추진 경과

- '15. 5. : 市 주민참여예산 사업 선정(장난감대여소 확충)
- '15. 5.12.: 왕십리교회 내 장난감대여소 무상사용 협약 체결
- '15.10.16.: 설계용역 완료
- '15.11.16.: 공사 착공
- '15.12.15.: 공사 준공

### Ⅳ | 준공 내용

- 검사내용
  - 검사자 및 입회자: 보육가족과장 외 3인
  - 주요 점검사항
    - 공사 내용물의 설계도서와의 합치 여부 확인
    - 자재 마감상태 등 정밀시공 여부 확인
  - 검사결과: 시공자로부터 제출한 서류 및 현장을 검토한 결과 상기 공사의 수급시행에 있어서 공사 전반에 걸쳐 설계도서와 품질관리기준 등 약정대로 준공되었음을 확인함.
- 처리의견: 검사결과에 따라 준공검사 처리코자 함.

## V | 소 요 예 산

### 총 사업비

(단위: 원)

합 계	시 비	구 비
200,000,000	200,000,000	-

### 집행내역

(단위: 원)

구 분	합 계	공사비	설계비	기자재비
예 산 액	200,000,000	150,000,000	10,000,000	40,000,000
지출금액	197,342,600	147,342,600	10,000,000	40,000,000
잔 액	2,657,400	2,657,400	0	0

※ 최종 잔액은 자원별 비율로 반납 처리

### ○ 공사비 집행 세부내역

(단위: 원)

합 계	건축공사	전기공사	관급자재비
147,342,600	104,148,000	19,100,000	24,094,600

## VI | 추 진 사 항

- '15. 12. 17.: 육아종합지원센터 사무실 이전

붙임 준공사진 1부. 끝.



장난감 전시실 1



장난감 전시실 2



놀이공간



소독실




화장실



사무실



문서고

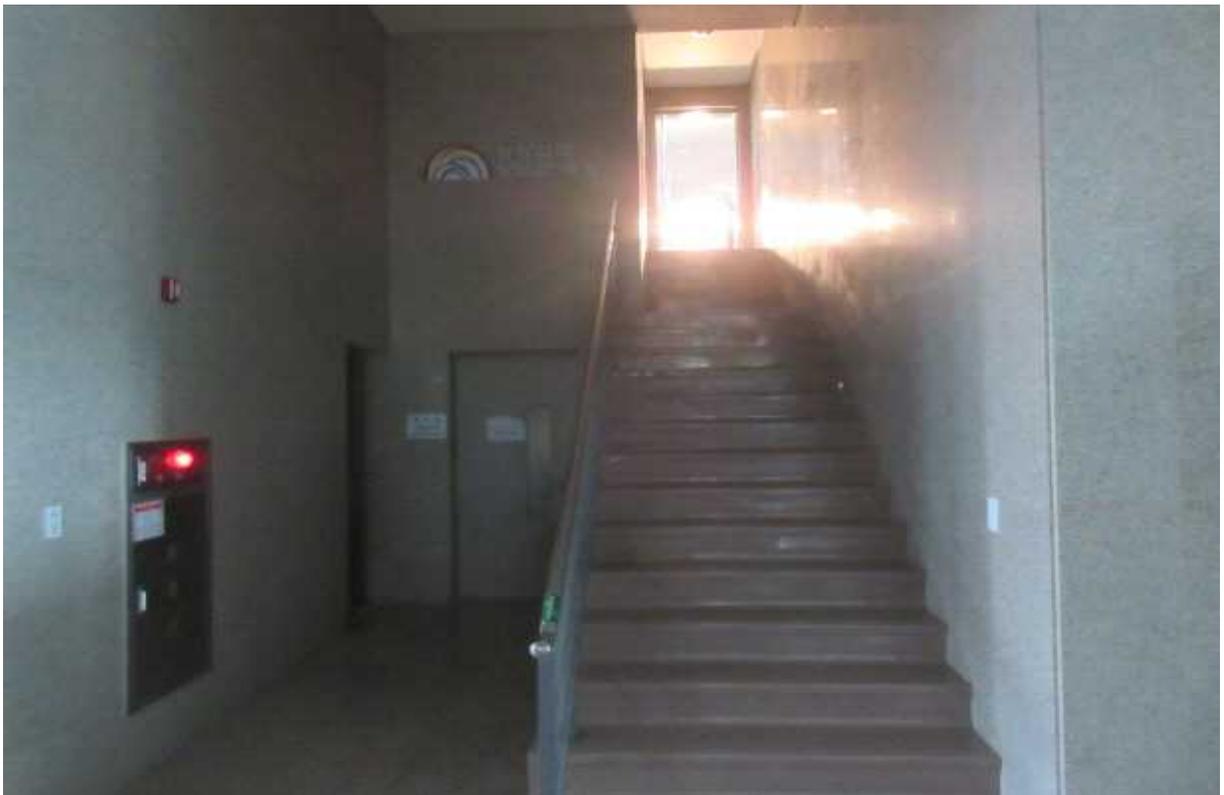

출입구

금호 장난감세상



장난감 전시실



소독실



놀이공간



수유실
