

수 신 서울특별시장  
 참 조 도로계획과장  
 제 목 잠실·천호대교 남단IC 연결체계 개선 기본 및 실시설계 과업기간 연장 요청

1. 귀시의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀시와 계약체결(2016년 6월 3일)하여 시행중인 「잠실·천호대교 남단IC 연결체계 개선 기본 및 실시설계」와 관련입니다.
3. 상기 과업 추진중 아래과 같은 사유와 용역계약일반조건 제7절 규정에 의거하여 과업기간의 연장을 요청하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

과업기간 변경일	과업기간 연장사유
당초 : 2016.06.09.~2018.06.30. 변경 : 2016.06.09.~2019.04.30. (10개월 연장)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 실시설계 일시중지 요청 및 기본설계 보완계획 알림(도로계획과-15772)에 따른 기본설계보완</li> <li>· 천호대교 남단IC 문화재 현상 변경 심의</li> <li>· 설계VE, 마무리 자문, 기술심의 등 행정절차 수행</li> <li>· 상기 사유로 당초 계약기간내 용역업무 수행기간 부족</li> </ul>

붙임. 1. 과업기간 연장 사유 1부. 끝.

(주)제일엔지니어링종합건축사사무소

대표이사 최태희



청림 서울! 이제는 실천입니다.


# 합 의 각 서

1. 계약건명 : 잠실-천호대교 남단IC 연결체계 개선 기본 및 실시설계
2. 계약업체 : (주)제일엔지니어링 종합건축사사무소, (주)동해종합기술공사  
(주)수성엔지니어링, 주식회사 강일엔지니어링
3. 계약금액 : 금 일십삼억팔천오백구십삼만팔천원정(₩1,385,938,000원)
4. 계약연월일 : 2016년 06월 03일
5. 계약기간 : 2016년 06월 09일 ~ 2018년 06월 30일
6. 변경사항


계약금액변경	당 초	금 1,385,938,000원
	변경후	금 1,385,938,000원
	증감액	금 0원
계약기간변경	당 초	2016년 06월 09일 ~ 2018년 06월 30일
	변경후	2016년 06월 09일 ~ 2019년 04월 30일


본 계약에 대하여 위와 같이 계약금액 및 계약기간을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 약속합니다.


2018. 06.


감독 확인	
소 속	도조계획과
직 급	6급
성 명	김전배 

위 계약자

주 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 16길 22-6  
 상 호 : (주)제일엔지니어링종합건축사사무소  
 대표자 : 최 태 희 (인) 

주 소 : 서울시 성동구 광나루로 6길 35  
 상 호 : (주) 동 해 중 합 기 술 공 사  
 대표자 : 정 점 래 (인) 

주 소 : 경상남도 창원시 의창구 창이대로 510, 403호  
 상 호 : ( 주 ) 수 성 엔 지 니 어 링  
 대표자 : 박 미 례 (인) 

주 소 : 강원도 강릉시 보래마하길 59-0 (포남동) 2층  
 상 호 : 주 식 회 사 강 일 엔 지 니 어 링  
 대표자 : 최 상 용 (인) 

서울특별시 재무관 귀하

# 과업기간 연장 사유

## □ 과업개요

- 용역명 : 잠실천호대교 남단IC 연결체계 개선 기본 및 실시설계
- 위치 : 서울특별시 잠실대교 및 천호대교 남단 IC 주변
- 규모 : 잠실대교 및 천호대교 남단 IC 연결로 2개소 개선
  - 연결로(2개소) : 폭 1차로, 연장 6.14km(잠실 3.33km, 천호 2.81km)
  - 교량(2개소) : 폭 1차로, 연장 63m(잠실 33m, 천호 30m)
  - 지하차도(2개소) : 폭 1차로, 연장 353m(잠실 169m, 천호184m)
- 과업기간 : 2016.06.03. ~ 2018.06.30.
- 도급액 : 금1,385,938,000원
- 용역업체 : (주)제일엔지니어링 종합건축사사무소, (주)동해종합기술공사, (주)수성엔지니어링, 주식회사 강일엔지니어링

## □ 추진 경위

- '14.05.~ '15.08. : 한강변 도시고속도로 진·출입램프 개선 기본계획
- '15.09.08. : 투자심사
- '16.06.09. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- '17.08.17.~'17.08.30. : 기본설계(안) 주민공람공고 및 의견수렴(의견 없음)
- '17.08.04. : 실시설계 착수
- '17.10.27. : 특정공법 심사(교량 2개소, 지하차도 2개소)
- '17.11.07. : 실시설계 일시중지 및 기본설계 보완 착수(도로계획과-15772)
- '18.03.30. : 주민간담회
- '18.04.25. : 천호대교 남단IC 연결체계 개선사업 문화재 현상 변경 심의(1차,불허)
- '18.06.현재 : 기본설계 보완 중

## □ 위치도




## □ 연장요청 사유

「잠실·천호대교 남단IC 연결체계 개선 기본 및 실시설계」 과업기간은 당초 '16.6.9~'18.6.30.까지 25개월이나, “실시설계 일시중지 및 기본설계 보완계획 알림(도로계획과-15772)”에 및 천호대교 남단IC 문화재 현상변경 심의(2018.07.11.예정)에 따라 기본설계 보완 및 실시설계를 위한 과업기간이 부족하여 연장요청.(현재 공정률 74.8%)


## □ 기본설계 보완 수행

○ 기본설계 노선계획 보완 및 주민설명회

- 잠실대교 남단 IC 연결로 기본설계 현황

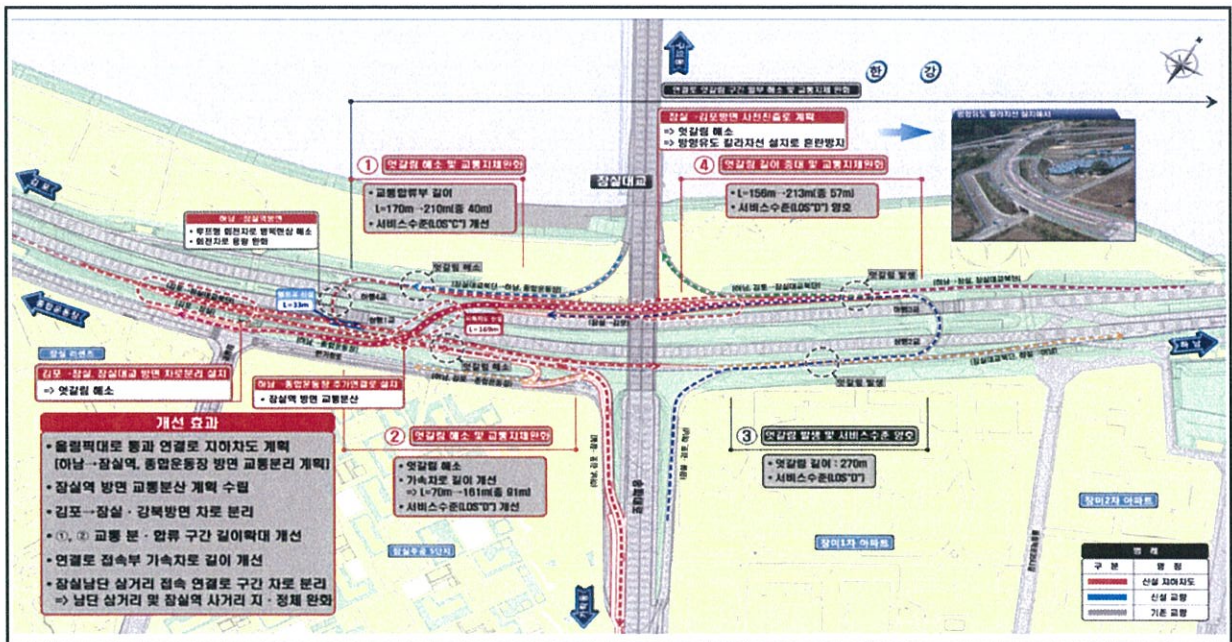

- 천호대교 남단 IC 연결로 기본설계 현황

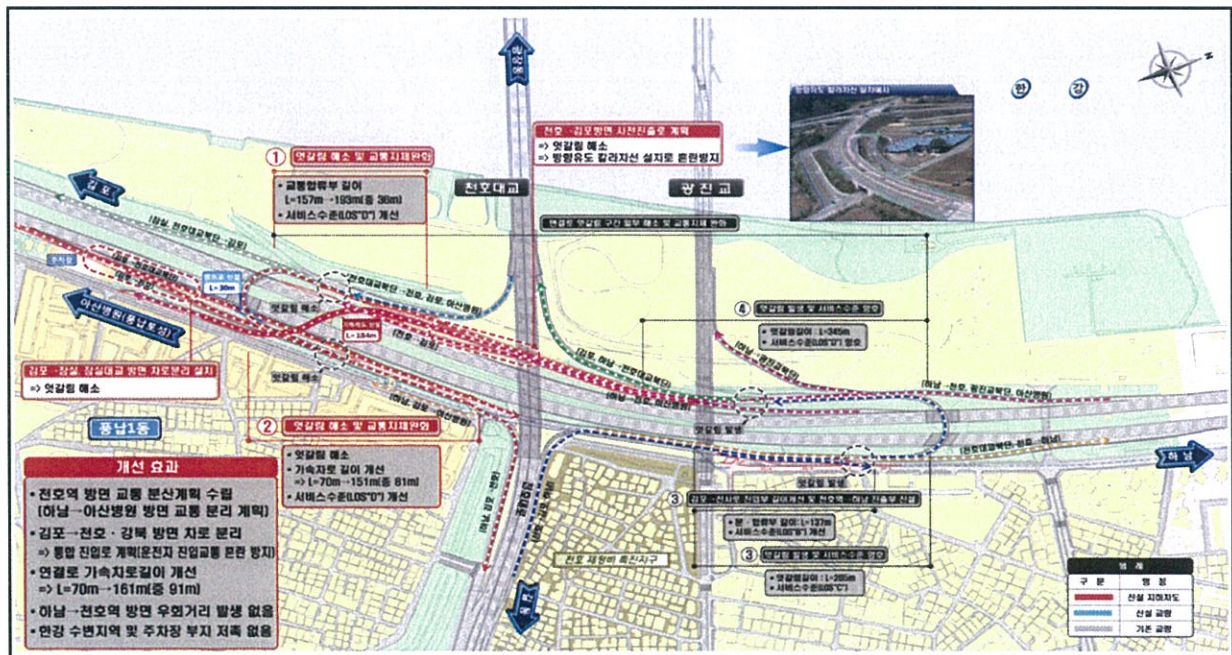

## □ 기본설계(보완) 수행

- 기본설계 경제성 심사
  - 심사방법 : 서울시 계약심사과에 의뢰하여 심사
  - 심사시기 : 2018. 06월
- 천호대교 남단IC 연결체계 개선 문화재 현상 변경심의
  - 1차 : 2018.04.25.(불허)
  - 2차 : 2018.07.11.(예정)
- 설계심의
  - 심사방법 : 서울시 기술심사담당관에 심의 요청
  - 심사시기 : 2018. 8월

## □ 용역기한 연장요청 내역

상기와 같은 사유로 당초 계약기간 내 용역업무 수행기간이 부족하므로 과업기간을 연장하여 과업추진에 만전을 기하고자 함.

- 연장기간
  - 당초 : 2016.06.09. ~ 2018.03.31.
  - 변경 : 2016.06.09. ~ 2019.04.30.

## □ 향후계획

- '18.06. : 기본설계 VE
- '18.07. : 문화재청 심의
- '18.08. : 설계심의
- '18.10. : 기본설계 완료 및 실시설계 착수
- '19.01. : 실시설계 VE
- '19.04. : 실시설계 완료

붙임 : 예정공정표(변경) 1부.

