

[민간대행사업] 디자인박물관 개보수 결과보고

2018 . 2 . 12 .

문서번호	전시사업팀-180	선임	전시사업 팀장	상생본부 장	DDP경영 단장		
결재일자	2018.02.13.	02/13	02/13	02/13	전결02/13		
공개여부	부분공개(6)	이명은	김수정	최구환	유석윤		
방침번호	단장방침 제(68)호	협 조					

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> - 디자인박물관 개보수 (변경) 추진계획(안) (대표이사방침 제3325호, 2017.08.18.) - 디자인박물관 개보수 추진계획(안) (대표이사방침 제2457호, 2017.06.22.) - 동대문디자인플라자 및 동대문역사문화공원 시설 개보수 및 공간 리뉴얼 계획 (디자인정책과-3004, 2017.3.15.) 		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	기획경영팀	민간대행사업 예산협의	협의 완료
	시설관리팀	약세스플로워 관리 협조	협의 완료
사 업 비	'17년 100백만원'		

사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ✓' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검토여부 '✓' 표시
시 민 참 여 고 려 사 항	시 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	옴 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
법 령 및 기타 고 려 사 항	법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>
	고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/>
	기 타 : 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/>
	갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
관 계 기 관 및 단 체 협 의	관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	관 련 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>

[민간대행사업] 디자인박물관 개보수 결과보고

지속적인 디자인 전시 및 소통공간으로의 디자인뮤지엄 운영을 위해 디자인박물관 개보수를 진행하고 그 결과를 보고함

1. 추진근거

- 동대문디자인플라자 및 동대문역사문화공원 시설 개보수 및 공간 리뉴얼 계획 (디자인정책과-3004, 2017.3.15.)
- 디자인박물관 개보수 추진계획(안)(대표이사방침 2457호,2017.06.22.)
- 디자인박물관 개보수 (변경) 추진계획(안)(대표이사방침 3325호, 2017.08.18.)

2. 추진목적

- 시설 개선을 통한 디자인박물관 운영 고도화 및 안정화
 - 원활한 전시 관람 동선 확보를 위한 보수 실시
 - 디자인박물관내 다양한 활동이 가능한 공간 조성
 - 대형 오브제, 작품 등의 설치가 가능한 기획형 전시 공간 조성

3. 추진경과

- '17.03 민간대행사업비 교부
- '17.06 디자인박물관 개보수 추진계획 수립
- '17.07 수장고 수장대 구매
- '17.08 디자인박물관 개보수 (변경) 추진계획 수립
- '17.09-11 시민체험공간 조성(배움터 4층,놀이터사무실) 및 운영
- '17.11 디자인박물관 쇼케이스·구조물 철거 및 복구
- '17.12 디자인박물관 액세스플로워 부분교체,
디자인둘레길 맞춤형 전시대 제작 및 구매

4. 추진내용

1. 디자인박물관

- 쇼케이스·구조물 철거 및 복구
 - 기간 : 2017.11.03.~11.16.
 - 내용 : 기획형 전시공간 조성
 - 고정형 쇼케이스·구조물 철거
 - 전시장내 아트샵, 사무실, 창고 등 공간 철거
 - 노후 시설 개보수(벽면 등) 등



쇼케이스 구조물 철거

- 악세스플로워 교체
 - 기간 : 2017.08.03.~12.07.
 - 추진과정



- 내용 : 악세스플로워 총 670매 구매 및 부분교체
 - 대형 쇼케이스 배치로 바닥 내려앉음 및 부식현상 발생한 악세스플로워 판넬 부분 교체
 - 악세스플로워 세부사양

모델명	LINDNER_NORTEC	
크기	600x600mm, 34.5t(재료 30.5t+원목 4t)	 Access Floor 구조  패널 개폐
재료	황산화 칼슘(100% 재활용 원료, 친환경 인증)	
마감재	BAMBOO	
특징	이중바닥재로 패널 개폐가 가능, 보수용이	

※ 「바람을 그리다; 신윤복·정선」 전시(2017.11.24.~2018.5.24.) 운영 중 부분 교체.

전시 구축 시 악세스플로워 교체 필요한 부분은 악세스플로워 입고 일정 고려하여 전시 운영 중 교체 가능토록 가장자리로 배치

※ 부분 교체 후 나머지 악세스플로워는 디자인박물관 운영에 사용 예정(시설팀 수장고 보관)



악세스플로워 교체

2. 수장고

■ 수장대 구매·설치

- 일시 : 2017.07.12.
- 내용 : ddp 소장품 증가에 따른 추가 수장대 3대 구매 및 설치
 - 기존 수장대와 동일한 수장대로 구매

3. 디자인둘레길

■ 디자인둘레길 맞춤형 전시대 제작 및 구매

- 기간 : 2017.12.01.~12.18.
- 내용 : 효율적이며 다채로운 전시구성 및 디자인둘레길 활성화를 위한 디자인둘레길 맞춤형 전시대 100개 제작
 - 전시대 활용 극대화를 위하여 상판 130개 외 상단 조명 레일(조명 포함) 부속품 구매 및 설치

4. 놀이터사무실

■ 시민체험공간 조성 및 시범운영

- 기간 : 2017.09.01.~11.30.
- 내용 : 건축, 공간, 가구가 조화를 이루는 DDP만의 총체적인 디자인 경험 제공
 - DDP 가구 컬렉션 배치 및 DDP 홍보 동영상 상영
- 운영개요
 - 일정 : 2017.09.08.~11.30. 10:00~19:00(월요일 휴관, 매주 금·토 10:00-21:00)

※ 배움터 운영시간과 동일


- 장소 : 배움터4층 디자인놀이터 운영지원사무실(기존)
- 공간명 : DDP 가구 컬렉션 라운지



수장대



전시대

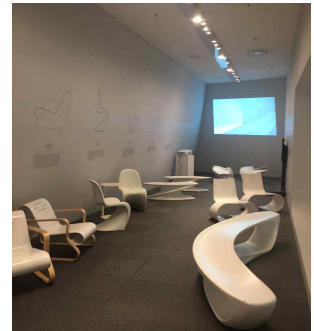

시민체험공간

5. 기대효과

- 디자인박물관 외 디자인둘레길, 수장고 등으로 사업대상 공간 확대하여 배움터 활성화 제고
 - 디자인박물관의 쇼케이스 철거 및 노후된 시설 개보수로 간송과의 계약만료 후 디자인전시 구축에 적합한 환경 조성
 - 수장고 장비보완으로 DDP 소장품의 효율적 보존 가능
 - 둘레길 맞춤형 전시대 제작으로 디자인둘레길 전시 효율성 제고

6. 향후계획

- 디자인박물관 액세스플로워(바닥) 확보로 시설 노후화 또는 전시 구축에 따른 교체 필요시 부분 교체 예정
- '19년 간송과의 계약만료 후, 현재 간송에서 사용중인 수장고 활용 방안 계획(시설상태 확인 필요)

7. 소요예산

- 소요예산 : 일금 일억원정(₩100,000,000)
- 지출금액 : 일금 일억구십삼만칠천원정(₩100,937,000)
- 집행률 : 100.9%

※ 디자인박물관 개보수 예산은 민간대행사업으로 재단 총 예산 범위내 지출되어 별도 사유서 제출없이 진행
_서울시 디자인정책과 협의완료

- 예산과목 : DDP민간대행사업
- 세부내역

(단위 : 천원)

사업명	구분	세부내역	금액	
디자인 박물관 개보수	디자인 박물관	쇼케이스 구조물 철거 및 복구	-인건비, 강관비계, 운송, 바닥보양	13,420
		노후화 및 파손 악세스플로워 교체	-악세스플로워 판넬 670매 구매 -운송비, 인건비	53,262
	디자인 둘레길	전시대 제작 및 구매	-둘레길 맞춤형 높이조절 전시대 100개 제작 및 구매	28,999
	수장고	수장고 장비 보완	-수장대(목재선반 포함) 3대	3,410
	놀이터 사무실	시민체험공간 조성	-시트제거, 문자컷팅 -조명설치 및 가구이동 -TV 스탠딩 브라켓 구매	1,846
총 예 산			100,937	

붙임 1. 관련기안 각1부. 끝.
