

문서번호	환경과-19263
결재일자	2015.6.25.
공개여부	대시민공개

주무관	에너지담당	환경과장	도시환경국장	부구청장	
정낙문	안은섭	하순호	김장수	06/25 김병환	
협 조	도로시설과장	송기민			
	하수담당	류연춘			
	도로굴착담당	백영철			

『정릉4동 810번지 일대』
도시가스 공급요청 민원해소 대책

2015. 06.

도시환경국
환경과

『정릉4동 810번지 일대』
도시가스 공급요청 민원해소 대책

- 도시가스 공급배관 매설계획 구간내 도로가 도로법 규정의 굴착허가 통제로 도시가스 공급을 받지 못하고 있어 주민생활 불편 민원이 발생되고 있음.
- 이에따라 해당지역 굴착통제를 완화하여 경제적이고 편리한 도시가스를 적기에 공급함으로써 주민의 삶의 질 향상과 대기오염 방지에도 기여하고자 함.

I 도시가스 공급민원 현황

□ 민원현황


- 공급민원 지역현황

연번	공급민원 지역	용도	세대수	굴착연장	민원인
1	성북구 정릉4동 810번지	가정용 영업용	8세대 5세대	200m	박원훈 외 다수

- 상기 구간은 지역주민의 도시가스 공급요청 민원이 지속적으로 발생하는 지역으로, 현재 본 구간에 하수관 신설공사가 진행 중이며, 공사 완료 후 전면 포장공사 예정으로 하수관 공사와 병행하여 도시가스 공급관 공사를 긴급하게 진행하여 지역주민의 공급 민원을 조기에 해소코자 함.

□ 위치도면 현황

1. 정릉4동 810번지 일대

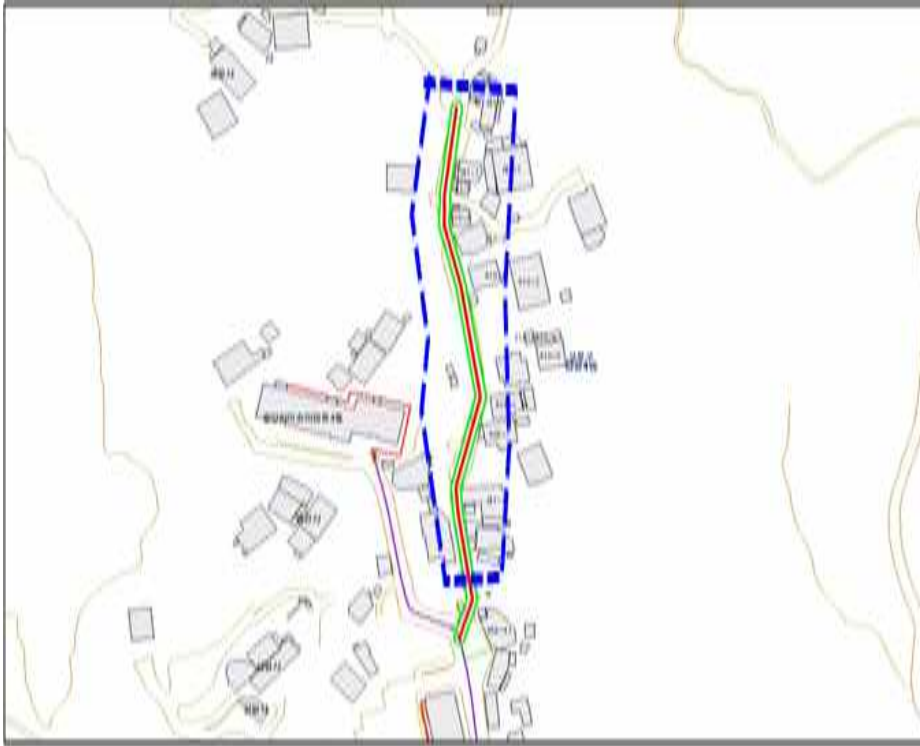

□ 공급민원 추진경과

- 상기 지역의 주민으로부터 도시가스사(주 예스코)로 지속적으로 공급민원 요청이 접수되어 공급관 설치공사를 검토 중, 주민으로부터 상기 지역에서 하수관 신설공사가 진행중으로 하수관 신설공사와 병행하여 도시가스 공급관공사 추진요청 민원발생

Ⅱ 도시가스 공급 애로사항

□ 애로사항

- 민원지역에 대한 도시가스 공급배관 매설을 위하여 필수적으로 도로굴착 공사가 수반되나,
- 동 구간은 하수관 신설공사가 진행 중이며 공사 완료 후 전면 포장공사가 이루어질 예정으로, 하수관 신설공사와 병행하여 도시가스 공급관 매설공사가 불가피하며, 또한 금회에 하수관공사와 병행하여 도시가스 매설공사가 진행되지 않을 경우 도로포장으로 인한 굴착통제기간 3년 동안 굴착불허로 주민의 경제적인 부담 및 불편이 예상됨.

Ⅲ 민원해소 대책 및 추진계획

□ 민원해소의 필요성

- 청정연료인 도시가스 보급을 적극 추진하고 있으나 아직까지 미공급된 지역은 주민의 경제적 부담이 가중되고 있어 경제성 고려
- 도로굴착 및 복구허가 통제기간 동안 도시가스 공급이 되지 않은 경우 주민의 경제적 부담 및 불편이 예상됨.

□ 민원해소 대책

- 상기 도시가스 공급배관 매설계획구간에 대하여 하수관 신설공사와 병행공사로 도로 굴착 및 직접 복구비·간접 복구비 지원검토, 공사일정 등을 고려하여 포장 공사 일정을 7월 24일까지 연기 요청
- 조속한 시일내에 도시가스 공급배관 공사를 완료로 민원해소

□ 추진계획

- 추진기간 : 2015. 6월
- 도로굴착허가 신청 : 도시가스공급사 ⇨ 도로시설과
- 도시가스공급시설 공사시행 : 도시가스공급사
- 도시가스 공급관 공사 후 도로포장 : 안전치수과

IV 기대 효과

- 도시가스의 공급으로 주민의 경제적 부담 완화
- 청정연료인 도시가스 보급 확대로 온실가스 감축 효과 기대
- 도시가스 보급행정에 대한 주민의 만족도 제고 및 행정서비스 제공

V 행정 사항

- 동 민원해소대책을 도로시설과 및 도시가스공급사(주 예스코)에 통보하여 공급관 공사가 적기에 시행될 수 있도록 협조 요청. 끝.
