

문서번호	안전치수과-4962
결재일자	2014.04.30.
공개여부	공개

주무관	치수담당주사	안전치수과장	안전건설교통국장	부구청장	구청장
조상원	정준용	정동락	유경애	김광례	04/30 문병권
협 조	예산담당주사 이미경 기획홍보과장 김미경				

『도심속 실개천 만들기 사업』

망우로 실개천 및 찬수공간 조성공사 정산보고



중 랑 구 청
(안전치수과)

망우로 실개천 및 친수공간 조성사업 정산보고

망우로 한전전력구에서 나오는 지하수를 활용하여 망우로에 실개천을 조성하고 지하수를 중랑천에 직접 방류함으로써 하천수질 개선 및 쾌적한 휴식공간을 제공하기 위하여 시행한 망우로 실개천 및 친수공간 조성사업의 정산보고임

I. 사업근거

- 도심속 실개천 만들기 사업계획('08.9.23 부시장방침)
- 망우로 실개천 및 친수공간 만들기 사업계획('09.9.2 구청장 방침)

II. 사업개요

- 사업명 : 망우로 실개천 및 친수공간 조성
- 사업위치 : 중랑구 망우역 ~ 중랑교간
 - ※ 실개천 조성구간 : 중랑구 망우역 엠코 앞
- 사업개요
 - 실개천 조성 : B=0.6~1.0m L=180m
 - PS관 부설 배출관로 D110~160mm L=2.04km
 - 수경펌프 및 맨홀펌프장 설치 3개소
- 사업기간 : 2008. 7. ~ 2013. 12.
- 사업비 : 당초) 3,000백만원(시비 2,100백만원, 구비 900백만원)
변경) 1,536백만원(시비 1,075백만원, 구비 461백만원)

III. 추진현황


- 2008. 07. 15 : 실개천 조성사업 대상지 제출
- 2009. 02. : 투자심사
- 2009. 09. : 실시설계용역 타당성심사

- 2009. 11. ~ 2011. 02. : 실시설계 용역시행
- 2009. 10. 12 : 망우로 실개천 조성위치 변경 및 규모축소 승인(서울시)

▶ 당초) 망우역사거리 ~ 동일로 → 변경) 망우역 ~ 상봉지하차도

- 2009. 11. 11 : 서울시 디자인위원회 심의완료
- 2010. 05. ~ 12. 30 : 상봉지하차도~동일로지하차도 배출관로 부설
※ 망우로 디자인거리 조성구간 병행시행(도시디자인과)
- 2011. 12. ~ 2013. 12. : 망우로 실개천 및 친수시설 조성공사 시행

< 평면도 >

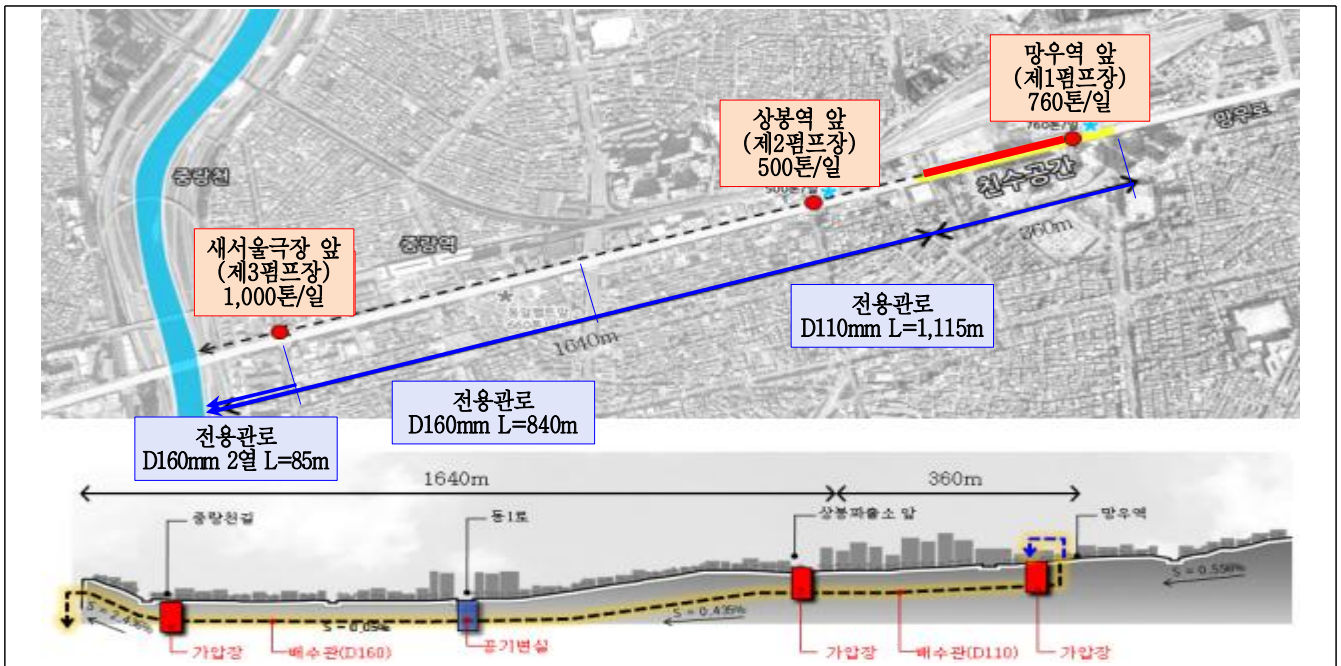

< 실개천 현황사진 >



IV. 사업비 정산결과 (재원분담율 : 시비 70%, 구비 30%)

● 예산배정 및 집행현황 (단위 : 원)

구분	예산액	지출액	집행잔액	사업비 분담액	비고
시비	2,100,000,000	1,273,917,620	826,082,380	1,075,429,790	
구비	300,000,000	262,410,650	37,589,350	460,898,480	
계	2,400,000,000	1,536,328,270	863,671,730	1,536,328,270	

● 사업비 분담내역 및 시비보조금 반납액

구분	예산액	사업비 분담액	사업비 정산액 (예산액-분담액)	기 반납액	반납액 (정산액-반납액)
시비	2,100,000,000	1,075,429,790	1,024,570,210	29,885,510	994,684,700
구비	300,000,000	460,898,480	-160,898,480		
계	2,400,000,000	1,536,328,270			

V. 조치의견

- 망우로 실개천 및 친수공간 조성공사사업은 재원분담율(시비70%, 구비 30%)에 맞춰 시비보조금을 지원받아 시행한 매칭사업으로,
- 실개천 조성사업 추진시 위치변경 및 규모축소에 따라 사업비가 3,000백만원에서 1,536백만원으로 축소되었고 재원분담율의 집행금액에 맞춰 시비보조금을 반납해야 하는 상황으로 시비보조금 994,685천원을 본 방침에 의거 반납코자 함.

VI. 행정사항

- 기획홍보과 : 시비보조금 반환금 예산편성
- 안전치수과 : 실개천 조성사업 정산보고 및 시비보조금 반환금 반납조치

붙임 : 1) 망우로 실개천 및 친수시설 정산자료 1부.
2) 연도별 지출부 각 1부. 끝.
