

# 주식회사 동일기술공사

우058000 서울특별시 송파구 송이로 30길7/전화:(02)3400-5716/팩스:(02)3402-3742/담당:김명기

문서번호 : 동일(구조) 제 19 - 3485호

시행일자 : 2019. 12. 16

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참 조 : 토목부장

제 목 : 양재대로 지하차도 기본 및 실시설계 과업기간 연장 요청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사와 계약체결(2013년 7월 5일)하여 시행중인 『양재대로 지하차도 기본 및 실시설계 용역』 과 관련입니다.

3. 상기 과업 추진중 아래와 같은 사유와 용역계약일반조건 제7절 규정에 의거하여 과업기간의 연장을 요청하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

과업기간 변경일	과업기간 연장 사유
· 당초 : 2013.07.08~2019.12.31 · 변경 : 2013.07.08~2020.03.31 ∴ 3개월 연장	· '일원 및 대청지하차도 건설사업 타당성조사'로 인해 일시 과업이 중단되었던 용역 재착수 → 일원지하차도 구조개선 설계 완수 및 용역행정절차 이행(계약심사)

붙임 : 1. 과업기간 연장 요청 사유서 1부. 끝.

서울특별시 송파구 송이로 30길7

주식회사 동일기술공사

대표이사 황 토목 주



청렴 서울! 이제는 실천입니다.

# 합 의 각 서

1. 계약건명 : 양재대로 지하차도 기본 및 실시설계용역
2. 계약업체 : (주)동일기술공사, (주)제일엔지니어링 종합건축사사무소  
(주)진우엔지니어링코리아, (주)신우디엔시, (주)에스앤피이엔씨
3. 계약금액 : 금 이십일억구천칠백일십이만오천원(₩2,197,125,000원)
4. 계약연월일 : 2013년 07월 05일
5. 계약기간 : 2013년 07월 08일 ~ 2019년 12월 31일
6. 변경사항

계약금액변경	당 초	금 2,197,125,000원
	변경후	금 2,197,125,000원
	증감액	금 0원
계약기간변경	당 초	2013년 07월 08일 ~ 2019년 12월 31일
	변경후	2013년 07월 08일 ~ 2020년 03월 31일

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준 공할 것을 약속합니다.

2019. 12.

감독 확인	
소 속	토목부
직 급	6급
성 명	배 우영 (인)

위 계약자

주 소 : 서울특별시 송파구 송이로 30길 7  
 상 호 : (주)동 일 기 술 공 사  
 대표자 : 황 주 환 (인)

주 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 16길 22-6  
 상 호 : (주)제일엔지니어링종합건축사사무소  
 대표자 : 임 중 선 (인)

주 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 151  
 상 호 : (주)진 우 엔 지 니 어 링 코 리 아  
 대표자 : 김 명 철 (인)

주 소 : 서울특별시 송파구 법원로 114  
 상 호 : (주)신 우 디 엔 시  
 대표자 : 이 기 환 (인)

주 소 : 충청남도 홍성군 홍성읍 법원로 47(303호)  
 상 호 : (주)에 스 앤 피 이 엔 씨  
 대표자 : 정 중 민 (인)

서울특별시도시기반시설본부 분임재무관 귀하

## 과업기간 연장 요청 사유서


### 과업개요

- 용역명 : 양재대로 지하차도 기본 및 실시설계 용역
- 위치 : 강남구 구룡마을입구 교차로~일원터널 교차로(양재대로)
- 규모 : 전체 연장 2,700m
  - 양재대로 지하차도 : 폭20.0m(4차로), 연장1,174m (Box800m, U-Type374m)
  - 토공구간 : 폭36.6~43.1m(8~10차로), 연장1,056m
  - 일원지하차도 종단개선 : 폭6차로→4차로, 연장470m (Box190m, U-Type280m)
- 과업기간 : 2013.07.08. ~ 2019.12.31.
- 도급액 : 금2,197,125,000원
- 용역업체 : (주)동일기술공사, (주)제일엔지니어링 종합건축사사무소  
(주)진우엔지니어링코리아, (주)신우디엔시, (주)에스애피이엔씨

### 추진 경위

- '10.03.~ '12.02. : 양재대로 지하화 타당성조사 및 기본계획
- '12.10.30. : 투자심사
- '13.07.05. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- '15.07.24. : 기본설계 완료
- '16.11.29. : 실시설계 자문회의
- '17.02.20. : 양재대로 지하화 사업 타당성 재조사
- '17.08.31 : 실시설계VE
- '17.09.29 : 양재대로 지하차도 투자심사(조건부)
- '17.12.27 : 양재대로 지하차도 특정제품(공법) 심의
- '18.02.05 : 양재대로 지하차도(일원지하차도) 중지
- '18.02.08 : 공사 중 교통처리계획 심의
- '18.03.30 : 대모지하차도 설계완료
- '18.04.09 : 대모지하차도 성과품 조달청 제출
- '18.04.30 : 대모지하차도 성과품 제출

□ 위치도

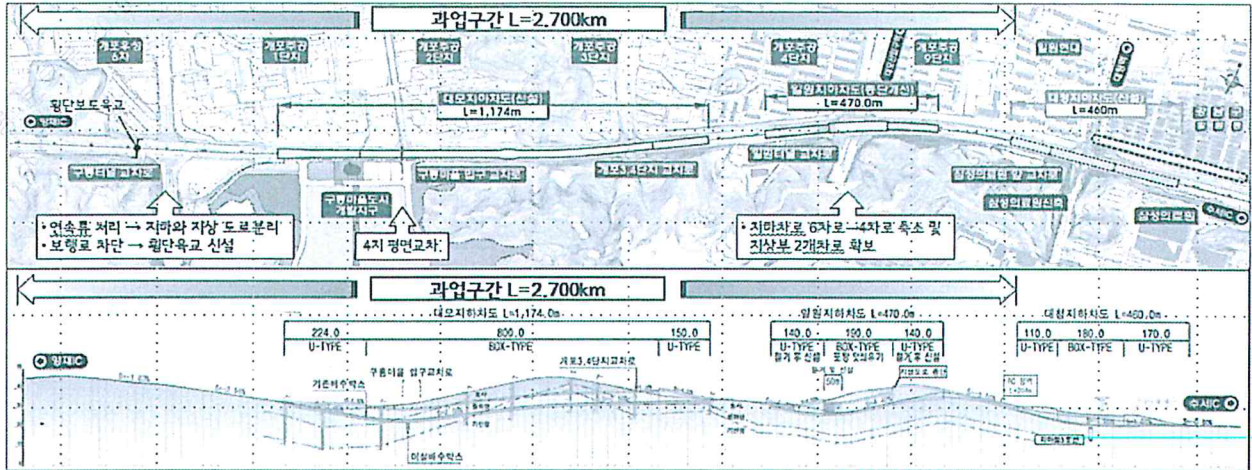

□ 과업기간 연장 요청 사유

본청 市 도로계획과에서 '일원 및 대청지하차도 건설사업 타당성조사'로 인해 일시 과업이 중단되었던 용역이 재착수 되어 과업에 포함된 일원지하차도 구조개선 설계 완수 및 용역행정절차 이행(계약심사)을 위해 과업기간을 20.3.31까지 연장하고자 함

1) 설계 현황

- 대모지하차도 2018년 4월 30일 설계 완료(부분준공)
- 일원지하차도 과업 중지(2018년 2월 5일)
- 일원지하차도 과업 재착수(2019년 12월 2일)

2) 연장기간

- 당초 : 2013.07.08. ~ 2019.12.31.
- 변경 : 2013.07.08. ~ 2020.03.31.

□ 향후계획

- '20.01. : 일원지하차도 종단개선 실시설계 재착수
- '20.03. : 설계 완료 예정

붙임 : 예정공정표(변경) 1부.

