

- 2020년 하반기 지역교통안전환경개선사업 -  
현장점검 결과보고서

2020. 12.

서울특별시  
(보행정책과)

- 2020년 하반기 지역교통안전환경개선사업 -  
**현장점검 결과보고서 (서울특별시)**

**I** 점검 개요

- 점검기간 : 2020. 11. 23. ~ 12. 4
- 점검반 : 보행안전팀 5명
- 점검대상 : 지역교통안전환경개선사업 588개소

(단위 : 개소, 백만원)

사업명	합 계		신규사업	이월사업	비고
합 계	사업량	588	587	1	
	사업비	15,264	15,179	85	
어린이보호구역개선	사업량	55	54	1	
	사업비	2,521	2,436	85	
무인단속장비등 설치	사업량	512	512		
	사업비	11,143	11,143		
노인보호구역	사업량	15	15		
	사업비	600	600		
보행환경개선지구	사업량	1	1		
	사업비	200	200		
보행자 우선도로	사업량	5	5		
	사업비	800	800		

□ 점검내용

- 어린이보호구역 개선사업의 시설물 적정설치 여부
- 현장조사, 계획수립, 타당성심사, 특정기술 선정심사, 경찰서 협의 등 절차이행 과정에서 문제점 등 지연사유
- 금년내 사업완료 가능성

## Ⅱ 점검 결과

### < 총 평 >

#### □ 잘 된 점

- '19년에 비해 사업량이 많음에도 자치구별 사업진행을 원활하게 진행해 왔으며, '20년 12월까지 사업추진에 차질없이 완료예정

#### □ 미흡한 점

- 학교부지를 활용하여 보행로를 설치하는 사업은 관계기관의 협의과정 지연으로 일부 발주를 이행하지 못한 사업이 발생 (광진구 동작초→사업비는 신현초보행로 사업으로 대체)

#### □ 보완할 점

- 교육청, 시의원 등 관계기관과 긴밀한 협의를 통해 사업추진 방안을 적극적으로 해결하려고 노력하였으나 사업변경 추진

#### □ 우수 사례

- 동작구 영화초는 교육청 및 학교관계자 설득을 통해 사업이 원활히 추진되어 9월 공사발주하여 공사진행중에 있음

### 가. 사업 추진현황

- 총 588개소(공사중 46, 준공 542) - 보호구역 사업

- (신규사업) 587개소 318억원 / 공사중 46, 준공 541개소

- (이월사업) 1개소 0.85억원 / 공사중 1개소

(단위 : 천원)

사 업 명	사업량 (개 소)	예산액 (이월액)	집행액 (국 비)	추진현황('20.11.20.기준)				
				계획중	실계중	공사중	준 공	
<b>합 계</b>	<b>588</b>	<b>31,889,000</b>	<b>10,508,488</b>			<b>46</b>	<b>542</b>	
신규 사업	소 계	587	31,804,000	10,423,488			46	541
	교통사고 잦은 곳							
	회 전 교 차 로							
	어린이보호구역	54	4,872,000	3,399,761			20	34
	무인교통단속장비	512	23,732,000	6,101,985			12	500
	노인보호구역	15	1,200,000	311,742			10	5
	보행환경 조성지구	1	400,000	400,000				1
	보행자우선도로	5	1,600,000	210,000			4	1
이월 사업	소 계	1	85,000	85,000				1
	교통사고 잦은 곳							
	회 전 교 차 로							
	어린이보호구역	1	85,000	85,000				1
	노인보호구역							
	보행환경 조성지구							
	보행자우선도로							

## 나. 사업대상지 현장점검 결과

### 지적사항(총괄표)

사 업 명	전 체 사업량 (개 소)	분야별 지적사항(개소)							
		계	지방비 미확보	대상지 변경 적정성 여부	실계상 규정 미준수	사공상 규정 미준수	준공시 규정 미준수	사업지연 (주민민원 등)	기 타
<b>계</b>	<b>3</b>	<b>3</b>						<b>3</b>	
신규 사업	소 계	2	2					2	
	교통사고 잦은 곳								
	회 전 교 차 로								
	어린이보호구역	2	2					2	
	무인교통단속장비								
	노인보호구역								
	보행환경 조성지구								
	보행자우선도로								
이월 사업	소 계	1	1					1	
	교통사고 잦은 곳								
	회 전 교 차 로								
	어린이보호구역	1	1					1	
	노인보호구역								
	보행환경 조성지구								
	보행자우선도로								

### 분야별 지적사항

○ 지방비 미 확보 : 해당없음

○ 대상지의 학교부지 활용 승인 지연

- ① 서울특별시 광진구 동자초교 학교부지활용 통학로 확보사업
  - 학교부지활용 통학로 확보에 대한 학교장은 찬성하나 교육지원청의 부지 승인을 반대하여 사업계획 변경 타사업 시행 (동자초 학교부지활용통학로 → 신현초 보행로 사업)

○ 대상지 변경 적정여부

- ① 송례초교 (서울시 송파구)
  - LH 개발사업구간으로 사업이 진행되는 시기가 맞지 않아 사업비 타사업 투자
  - 사업비 변경하여 타 구역 개선사업으로 시행함
- ② 일민유치원(서울시 용산구)
  - 사업설계는 완료하였으나 계획보다 사업비 과다 산정하여 타사업을 시행

○ 사업 지연 (주민민원, 토지보상 협의, 관계부처 협의 등)

- ① (서울특별시 동작구 영화초)
  - (지연사유) 교육청 반대에 따라 이해 설득 협의 시간소요
  - (조치계획) 업체선정완료 되어 사고이월하여 공사시행
- ② (서울특별시 성동구 경동초)
  - (지연사유) 교육청 반대에 따라 이해 설득 협의 시간소요
  - (조치계획) 업체선정완료 되어 사고이월하여 공사시행

※ 지적사항별 사진첨부



- '20년 상반기 합동점검 지적사항 : 해당없음
- 분야별 점검결과 : 해당없음

라. '20년 내역사업별 추진지침 준수여부 점검결과

- 지적사항 : 해당없음
- 분야별 점검결과 : 특이사항 없음

**Ⅲ** 건의사항 및 우수사례

《사업명 : 영화초등학교 부지활용 통학로 확보》 \_ 우수사례

- 추진배경**
  - 영화초등학교 정문 앞 통학로의 협소한 도로폭원과 보행로 개선을 통해 교통사고 예방 등 쾌적한 통학환경 조성 필요
- 문제점 및 해결방안**
  - 협소한 도로폭원으로 초등학교 진출입 차량의 원활한 회전이 불가해 정문 앞 교통사고 위험성 내재
    - ⇒ 영등포중학교 옹벽 후퇴(철거)를 통한 도로확장 및 회전반경 확보
  - 보차혼용도로 구간이나, 보행로 구분 및 차량속도 저감 시설 부존재
    - ⇒ 도로 전체에 대한 차도블록 포장으로 보행자우선도로 조성(차량속도 저감 및 보행권 강화)

## □ 사업개요

- 위 치 : 동작구 대방동 17-26 일원
- 기 간 : 2020. 2 ~ 11월
- 내 용 : 옹벽 및 도로포장 공사, 차도블록 설치
- 규 모 : 옹벽공사(L=30m, H=200 ~ 9.0m), 포장공사(A=135.0㎡, B=8m)

## □ 추진경위

- 2018. 9. 18. : 영화초 정문 통학로 개선요청에 따른 통학로 합동점검 실시
- 2018. 9. 27. : 통학로 어린이보호구역 노면표시 설치 및 재도색 등 정비
- 2018. 10. 9. : 통학로 편측 보행로 구간 유색포장 설치
- 2018. 10.17. : 영화초 정문 앞 횡단보도 설치
- 2019. 1. 30. : 통학로 부지 확보를 위한 경계측량 실시
- 2019. 2. 1. : ‘학교부지 활용 통학로 조성사업’ 대상 및 계획서 제출
- 2019. 2. 20. : 영등포중학교 옹벽 철거 관련 관계기관 합동점검
- 2019. 2. 26. : 중학교 옹벽 일부철거 후 도로로 사용 동의
- 2019. 9. 19. : 변경 사업계획 추진을 위한 관계기관 간담회 개최
- 2020. 2. 20. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2020. 3. 24. : 실시설계 관련 관계기관 간담회 개최
- 2020. 6. 24. : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2020. 7. 10. : 공사발주(예정)

## □ 기대효과

- 원활한 차량통행 폭원 확보를 통한 학교 앞 정체현상 방지로 보행자와 차량 간 상충 최소화
- 차량 주의 및 보행권 강화를 통한 보행자우선도로 조성으로 교통약자 보행안전 확보

◇ 현황사진




▶ 보차혼용도로로 보행로 구분 미흡



▶ 옹벽 및 사유지 오토바이 적치로 도로협소

◇ 개선계획

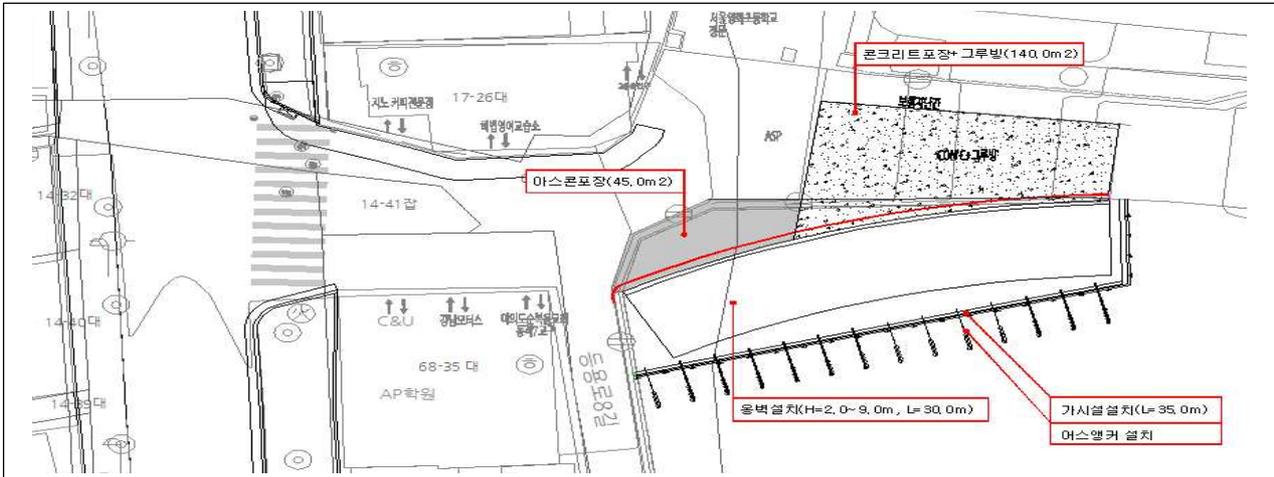

공사계획 평면도



차도블록 포장 계획

□ 어린이보호구역 개선 공사중 현황

(단위 : 백만원, 개소)

시군구	사업명	자치구	예산액			집행액 (국비기준)	착공일	준공 예정일	공정율 (%)
			계	국비	지방비				
계			1,471	381	1,090	166			
1	서울독일학교	용산구	10	5	5	-	'20. 10.19	'20. 12.20	90
2	계성유치원	용산구	10	5	5	-	'20. 10.19	'20. 12.20	90
3	경동초등학교	성동구	200	-	200	-	'20. 12.	'21. 5.	10
4	장안초교	광진구	48	24	24	-	'20. 11. 5	'20. 12. 31	80
5	자한몽골학교	광진구	58	29	29	-	'20. 11. 5	'20. 12. 5	80
6	구립늘푸른꿈맞이	광진구	58	29	29	-	'20. 11. 5	'20. 12. 31	80
7	장안초교	광진구	48	24	24	-	'20. 11. 5	'20. 12. 31	80
8	용마초교	광진구	54	27	27	-	'20. 11. 5	'20. 12. 31	80
9	구립늘푸른꿈맞이	광진구	58	29	29	-	'20. 11. 5	'20. 12. 5	80
10	대림늘푸른어린이	동대문구	8	4	4	4	'20.10.31.	'20. 12. 14	80
11	키즈월어린이집	동대문구	50	25	25	25	'20.10. 5.	'20. 12. 14	80
12	언덕위의 하얀어	동대문구	16	8	8	8	'20.10.15.	'20. 12. 14	80
13	장안현대어린이집	동대문구	16	8	8	8	'20.10.15.	'20. 12. 14	80
14	구립행복한우리	은평구	36	18	18	-	'20.10.12.	'20.12.20.	30
15	보듬손어린이집	은평구	26	13	13	-	'20.10.12.	'20.12.20.	30
16	자연유치원	은평구	10	5	5	-	'20.10.12.	'20.12.20.	50
17	서문유치원	은평구	14	7	7	-	'20.10.12.	'20.12.20.	30
18	영화초(통학로확보)	동작구	679	85	594	85	'20. 10. 22	'21. 4. 2	23
19	나래학교	서초구	42	21	21	21	'20. 11. 5	'20. 12. 18	80
20	예뵤 어린이집	서초구	30	15	15	15	'20. 11. 5	'20. 12. 18	80

## □ 어린이보호구역 개선 준공 현황

(단위 : 백만원, 개소)

시군구	사업명	사업위치	예산액			집행액 (국비기준)	착공일 (지정일)	준공일 (예정일)	공정율 (%)
			계	국비	지방비				
계			2,029	954	1,079	52			
1	명신초교	종로구	42	21	21	8	'20. 5.	'20. 5. 30	100
2	한양초교	성동구	50	25	25	25	'20. 9. 9 ( '20. 8. 4.)	'20. 10.15	100
3	구남초교	광진구	18	9	9	9	'20. 5. 25.	'20. 6. 29.	100
4	신현초교	중랑구	72	36	36	36	'20.10.22. ( '20.10.15.)	'20. 11. 10.	100
5	목동초등학교	중랑구	35	17.5	17.5	17.5	'20.10.22. ( '20. 9. 5.)	'20. 11. 10.	100
6	면목초교	중랑구	30	15	15	15	'20.10.22. ( '20.10.15.)	'20. 11. 10.	100
7	중랑초교	중랑구	72	38	38	38	'20.10.22. ( '20.10.15.)	'20. 11. 10.	100
8	신내초교	중랑구	96	48	48	48-	'20. 9. 23	'20. 10.30	100
9	새솔초등학교	중랑구	140	70	70	40	'20. 9. 15	'20. 9. 25	100
10	신현초(보행로)	중랑구	389	132	257	-	'20. 10. 20	'20. 12. 4	100
11	장위 어린이집	성북구	50	25	25	25	'20. 10.20	'20. 12. 4	100
12	길음빛 어린이집	성북구	40	20	20	20	'20. 10.20	'20. 12. 4	100
13	하은 어린이집	성북구	40	20	20	20	'20. 10.20	'20. 12. 4	100
14	미양초로	강북구	68	34	34	34	'20. 6. 16. ( '20. 5. 28.)	'20. 6. 23.	100
15	중계미래탐구등16	노원구	193	96.5	96.5	96.5	'20.10.16. ( '20. 8. 4.)	'20. 11. 2.	100
16	역촌초교	은평구	250	125	125	125	'20. 7. 8.	'20. 11. 30.	100
17	정남유치원	마포구	84	42	42	42	'20. 5. 1. ( '20. 5. 1.)	'20. 5. 30	100
18	목동어린이집	양천구	8	4	4	4	'20. 7. 13. ( '20. 7. 13)	'20. 6. 30	100
19	송화초교	강서구	36	18	18	18	'20. 5. 26.	'20. 7. 31.	100
20	하늘숲어린이 등7	강서구	170	85	85	85	'20. 9.	'20. 10.31.	100
21	성미유치원	영등포구	42	21	21	21	'20. 6. 1.	'20. 7. 31.	100
22	도래미어린이집	동작구	16	8	8	8	'20. 5. 1. ( '20. 4. 20)	'20. 6. 30	100
23	대방유투엠 학원	동작구	16	8	8	8	'20. 5. 1. ( '20. 4. 6)	'20. 6. 30	100
24	동작시사어학원	동작구	16	8	8	8	'20. 5. 1. ( '20. 4. 6)	'20. 6. 30	100
25	참음악학원	동작구	16	8	8	8	'20. 5. 1. ( '20. 4. 6)	'20. 6. 30	100
26	미래연미술학원	동작구	20	10	10	10	'20. 5. 1. ( '20. 4. 6)	'20. 6. 30	100
27	튼튼영어 마스트	동작구	20	10	10	10	'20. 5. 1. ( '20. 4. 6)	'20. 6. 30	100
28	흑석어린이집 (월인자 사업)	동작구	-	-	-	-	'20. 5. 1. ( '20. 3. 3)	'20. 6. 30	100

시군구	사업명	사업위치	예산액			집행액 (국비기준)	착공일 (지정일)	준공 예정일	공정율 (%)
			계	국비	지방비				
계			2,225	1,101	1,138	1,098			
29	사당초교	관악구	48	24	24	24	'20. 8. 21. (20. 8.26)	'20. 9. 17.	100
30	강남예일보습등 5	관악구	160	80	80	80	'20. 8. 21. (20. 8.26)	'20. 9. 17.	100
31	서초초교	서초구	54	27	27	27	'20. 5 26. ( '96. )	'20. 7. 30	100
32	은송어린이집	송파구	40	20	20	20	'20. 11. 4	'20. 12. 5	100
33	오금초교	송파구	28	21	21	21	'20. 11. 4	'20. 12. 5	100
34	양전초교	강남구	46	23	23	20	'20. 11. 13	'20. 11. 27	100
35	최강학원 등 17	강남구	163	63	100	63	'20. 10. 19 ( '20. 9.16.)	'20. 11. 27	100
36	한영유치원	강동구	28	14	14	14	'20. 10. 14. ( '20.10.13)	'20. 11. 17	100
37	구립다은어린이집	강동구	28	14	14	14	'20. 10. 14. ( '20.10.13)	'20. 11. 17	100
38	그리새 유치원	강동구	30	15	15	15	'20. 10. 14. ( '20.10.13)	'20. 11. 17	100
39	초등학교 주변	주민신고제	1,600	800	800	800	2020. 7. 1.	2020. 9.10.	100
40	규전어린이집	동대문구	-	-	-		민원발생으로 미추진		

서식 1-2

‘20년 노인·장애인 보호구역 개선사업 추진현황

□ 공사중 현황

(단위 : 백만원, 개소)

시군구	사업명	사업위치	예산액			집행액 (국비기준)	착공일	준공 예정일	공정율 (%)
			계	국비	지방비				
계			2,789	413	2,376	420			
1	은천요양원	동대문	41	16	25	16	'20. 7. 17	'20. 12. 14	80
2	여기소경로당	은평구	60	30	30	-	'20. 10. 12	'20. 12. 20	50
3	연희시니어스	서대문	368	100	268	117	'20. 7. 22	'20. 12. 30	32
4	시니어스가양타워	강서구	99	17	82	17	'20. 11. 15	'20. 12. 20	80
5	내곡 느티나무쉼터	서초구	65	35	30	35	'20. 11.	'20. 12. 18	80
6	양재 느티나무쉼터	서초구	35	35	-	35	'20. 11.	'20. 12. 18	80
7	왕천경로당	송파구	130	50	80	50	'20. 11. 4	'20. 12. 11	60
8	방이경로당	송파구	125	50	75	50	'20. 11. 4	'20. 12. 11	60
9	마천경로당	송파구	125	50	75	50	'20. 11. 4	'20. 12. 11	60
10	거여새마을경로당	송파구	105	30	75	50	'20. 11. 4	'20. 12. 11	60
11	순천향대병원	용산구	400	-	400	-	'20. 11. 15	'20. 12. 20	80
12	경동초LED, 사업소	성동구	220	-	220	-	'20. 11. 15	'21. 5. 30	사고이월
13	노인사고다발지점	광진구	224	-	224	-	'20. 11. 15	'20. 12. 20	80
14	정릉우체국	성북구	200	-	200	-	'20. 11. 15	'20. 12. 20	60
15	한성대입구역	성북구	250	-	250	-	'20. 11. 15	'20. 12. 20	60
16	홍은사거리	서대문구	258	-	258	-	'20. 11. 15	'20. 12. 20	60
17	오류동역	구로구	62	-	62	-	'20. 11. 15	'20. 12. 20	60
18	신이문역	동대문구	22	-	22	-	'20. 11. 15	'20. 12. 20	60

□ 준공 현황

(단위 : 백만원, 개소)

시군구	사업명	자치구	예산액			집행액 (국비 기준)	착공일 (지정일)	준공일
			계	국비	지방비			
계			461	187	274	185		
1	삼선실버복지센터	성북구	100	50	50	50	'20. 8. 24	'20. 12. 4
2	궁동종합사회복지관	구로구	82	31	51	31	'20. 9. 2.	'20. 11. 30.
3	시흥사거리 주변 등	금천구	82	-	82	-	'20. 10. 23	'20. 11. 27
4	예촌경로당 노면표시(안전표지) 등	관악구	82	31	51	31	'20. 10. 21. ( '20. 7. 28.)	'20. 11. 19.
5	관악장애인복지관	관악(남부)	30	-	30	-	'20. 10. 1	'20. 11. 19
6	강남70플러스라운지	강남구	65	65	-	63	'20. 10. 19	'20. 11. 27
7	강암경로당	강동구	20	10	10	10	'20. 10. 21.	'20. 11. 17.

서식 1-3

‘20년 방법 및 주정차 단속 카메라 설치 현황

□ 공사중 현황

(단위 : 백만원, 개소)

시군구	사업명	사업위치	예산액			집행액 (국비 기준)	착공일	준공 예정일	개소	공정율 (%)
			계	국비	지방비					
계			754	-	754	339			24	
1	주정차단속카메라	용산구	136	-	136	68	'20. 9.16.	'20.12.24.	4	95
2	방법카메라 주정차단속카메라	광진구	102	-	102	65	'20.11.25.	'20.12.25.	3	70
3	주정차단속카메라	노원구	68	-	68	68	'20.10.00	'20.12.10.	2	90
4	주정차단속카메라	마포구	52	-	52	26	'20.10.15.	'20.12.21.	2	80
5	주정차단속카메라	양천구	34	-	34	-	2020. 11.	'20.12.20	1	25
6	방법카메라	구로구	44	-	44	44	'20.11.16.	'20.12.16.	2	30
7	주정차단속카메라	금천구	250	-	250	-	2020.9.24	'20.12.22	8	50
8	주정차단속카메라	영등포구	68	-	68	68	'20.11.25.	'20.12.25.	2	80

□ 준공 현황

(단위 : 백만원, 개소)

시군구	사업명	사업위치	예산액			집행액 (시비)	착공일	준공일	개소
			계	국비	지방비				
계			874.8	-	874.8	847.9			35
1	주정차단속카메라	종로구	64	-	64	64	'20. 4. 0	'20. 7. 0	5
2	주정차단속카메라	성동구	68	-	68	55.3	'20.10.14	'20.11.20.	2
3	주정차단속카메라	성북구	68	-	68	68	'20. 8. 0	'20.10. 0	3
4	주정차단속카메라	중랑구	68	-	68	68	'20. 5. 0	'20. 6. 0	4
5	주정차단속카메라	도봉구	67.8	-	67.8	67.8	'20. 8. 0	'20. 9.28	2
6	주정차단속카메라	서대문구	68	-	68	68	'20. 7.22.	'20.10.31.	3
7	주정차단속카메라	은평구	68	-	68	68	'20.10. 0	'20. 9. 3	2
8	주정차단속카메라	강서구	68	-	68	67	'20.10.28	'20.11.19	2
9	주정차단속카메라	관악구	15	-	15	15	'20. 7. 0	'20. 8.24	3
10	방법카메라 주정차단속카메라	동작구	68	-	68	55.4	'20. 5.20.	'20. 8. 5.	2
11	주정차단속카메라	서초구	68	-	68	68	'20.10. 5.	'20.11.30.	2
12	주정차단속카메라	송파구	68	-	68	67.4	'20. 5.12..	'20. 7.11	2
13	방법카메라, 주정차단속카메라	강동구	116	-	116	116	'20.10.5.	'20.10.31.	3

□ 공사중 현황

(단위 : 백만원, 개소)

시군구	사업명	사업위치	예산액			집행액 (국비 기준)	착공일	준공 예정일	개소	공정율 (%)
			계	국비	지방비					
계			7,517	5,356	2,164	3,442			192	
1	과속단속 CCTV	종로구	430	400	30	400	'20. 9. 0	'20. 12. 31	12	90
2	과속단속 CCTV	중구	330	-	330	-	'20. 9. 7.	'20. 11. 19.	9	90
3	과속단속 CCTV	용산구	375	350	25	319	'20. 9. 6.	'20. 12. 5.	10	80
4	과속단속 CCTV	동대문구	697	650	47	-	'20. 10. 15	'20. 12. 14	19	85
5	과속단속 CCTV	도봉구	630	469	165	228	'20. 8. 0	'20. 12.15.	18	95
6	과속단속 CCTV	성북구	835	790	45	163	'20. 9. 0	'20. 12. 4.	20	95
7	과속단속 CCTV	강북구	485	210	275	210	'20. 10. 0	'20. 12. 0	6	80
8	과속단속 CCTV	은평구	747	640	107	496	'20. 6. 15.	'20. 12.31.	29	80
9	과속단속 CCTV	양천구	867	363	504	363	'20. 11.19.	'21. 1. 28.	14	20
10	과속단속 CCTV	강서구	847	605	241	443	'20. 11.23	20. 12.31	11	50
11	과속단속 CCTV	송파구	749	462	287	403	'20. 7.15	'20. 12.10	24	70
12	과속단속 CCTV	강남구	525	417	108	417	'20. 8.10	'20. 12.10	20	80

□ 준공 현황

(단위 : 백만원, 개소)

시군구	사업명	자치구	예산액			집행액 (국비 기준)	착공일	준공일	개소
			계	국비	지방비				
계			9,213	5,787	3,705	5,705			209
1	과속단속 CCTV	성동구	287	265	22	235	'20. 6. 26	'20. 11. 30	9
2	과속단속 CCTV	광진구	422	393	29	393	'20. 6. 19	'20. 11. 5	12
3	과속단속 CCTV	중랑구	387	387	-	387	'20. 9. 28	'20. 12. 31	11
4	과속단속 CCTV	강북구	242	132	110	125	'20. 9. 0	'20. 10. 12	14
5	과속단속 CCTV	노원구	534	499	35	499	'20. 7. 0	'20. 10. 12	14
6	과속단속 CCTV	마포구	436	406	30	406	'20. 8. 0	'20. 9. 25.	12
7	과속단속 CCTV	서대문구	390	270	120	265	'20. 3. 27.	'20.11.17.	27
8	과속단속 CCTV	양천구	567	363	504	363	'20. 7. 0	'20. 8. 24.	12
9	과속단속 CCTV	구로구	1,209	483	726	483	'20. 6. 0	'20. 7. 16.	14
10	과속단속 CCTV	금천구	340	308	32	308	'20. 8. 0	'20. 10. 27	10
11	과속단속 CCTV	영등포구	686	460	226	460	'20. 8. 0	'20. 11. 27	21
12	과속단속 CCTV	동작구	667	411	256	398	'20. 7. 0	'20. 9. 2	12
13	과속단속 CCTV	관악구	508	390	117	390	'20. 8. 0	'20. 9. 24.	11
14	과속단속 CCTV	서초구	1,616	500	1,116	500	'20. 8. 0	'20. 9. 25	15
15	과속단속 CCTV	강동구	922	520	382	493	'20. 8.14.	'20. 9. 21.	15

서식 2

'18 ~'19년 이월사업 추진현황

□ 어린이보호구역 개선사업 이월 내역

(단위 : 개소, 백만원)

시군구	사업명*	이월현황 ('20. 11. 15. 기준)			집행현황 ('20. 11. 15. 기준)			추진상황 ('20. 11. 15. 기준)		
		계	국비	지방비	계	국비	지방비	공정률 (%)	이월사유	향후계획
계		679	85	594	153	85	68			
서울시	동작구 영화초	679	85	594	153	85	68	22.5	학교관계기관 협의지연	공사진행중으로 금년내 공사기간 부족하여 사 고이월하여 공사마무리
