

정기(기동점검) 점검 결과보고


[신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)]

- 점검일시 : 2020.09.03 (목)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 김동수

○ 화재/폭발/질식 재해 예방(토목부)

- 위험물저장소의 물질안전보건자료(MSDS)는 비에 젖어 활용이 불가하므로 재정비 하시기 바랍니다.


- 훼손된 용접 호스는 가스가 샐 우려가 있으므로 가스압이 안정적으로 유지될 수 있도록 정비 하시기 바랍니다.

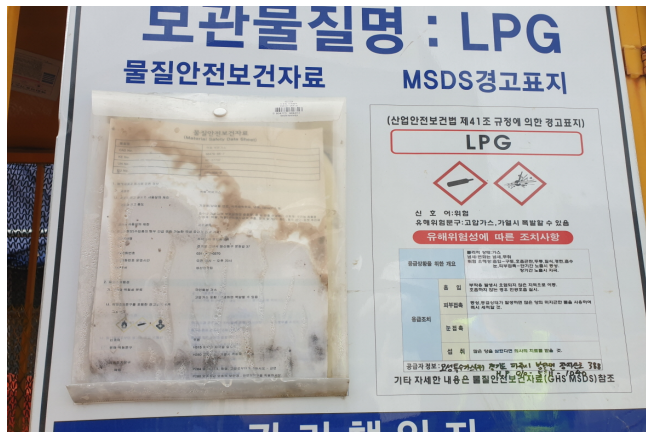

○ 감전재해 예방(토목부)

- 터널 내부에 설치된 가설전선은 감전으로 인한 안전사고가 발생하지 않도록 반드시 접지하시기 바랍니다.



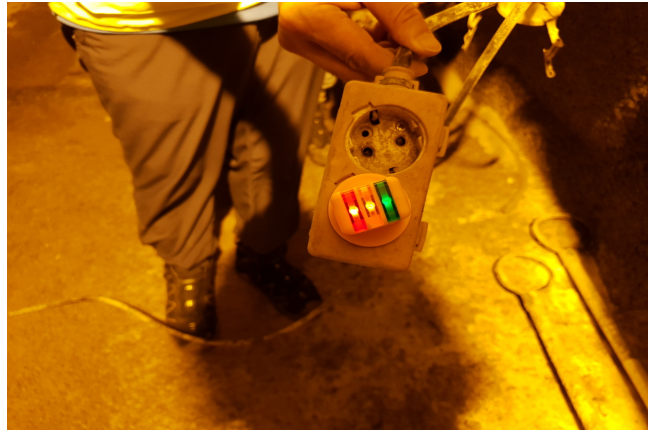

○ 기타 안전관리(토목부)

- 터널 입구 점검통로에 워카를 설치하여 근로자의 통행안전을 확보하시기 바랍니다.

- 작업계획서 및 위험성평가서 등 작업허가서가 비에 젖어 훼손이 심하니 교체 정비하시기 바랍니다.

- 제10호 태풍 “하이선”이 북상하고 있으니 전도, 낙하, 비래의 위험이 있는 시설물 및 장비에 대하여 안전조치를 하시기 바랍니다.



○ [모범사례]기타 안전관리(토목부)

- 연락갱 주변 바닥 및 터널 벽면에 안전경고 파사드를 설치하여 근로자 및 장비 운전자에게 안전홍보





○ 건설기계 안전(토목부)

- 건설기계(덤프트럭 및 점보드릴)의 운전자가 운전위치를 이탈하는 때에는 시동열쇠는 별도로 관리하시기 바랍니다.

