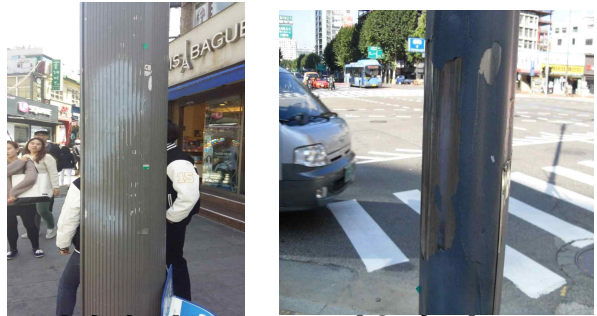



주요 적출사항 및 조치 계획

1	<p>○ 가로등주 도색 벗겨짐 및 변색 발생</p> <ul style="list-style-type: none"> - 서애로 및 동대후문 가로등주 변색 - 을지로(시청~을지로3가) 가로등주 도색 벗겨짐 	
조치계획		<ul style="list-style-type: none"> - 서애로 가로등 도색 - 을지로 벗겨지는 도색 제거작업 지시 - 소요예산 : 약4,000천원

2	<p>○ 광고물부착방지 플라스틱 성형 파손</p> <ul style="list-style-type: none"> - 청구로, 퇴계로 등 	
조치계획		<ul style="list-style-type: none"> - 우선 상대적으로 심한 청구로 광고물부착방지 성형물 제거후 광고물 부착방지 시트 작업 - 청구로의 광희문 앞 스톤 가로등주에 무단 광고물 부착방지를 위해 병행 실시 - 소요예산 : 약12,000천원

3	<p>퇴계로 양방향 감시기 노후로 인해 누전차단기 동작 오류 및 분전반 및 등주내 복잡한 선로로 유지관리 난해</p> <p>[시설현황]</p> <ul style="list-style-type: none"> -분전반감시기 8면, 등주감시기 164개 	
조치계획		<ul style="list-style-type: none"> - 퇴계로의 노후 된 가로등 양방향제어기를 등주감시기는 제거하고, 분전반만 감시하는 양방향 제어기를 8대를 교체 관리의 효율성 제고 - 소요예산 : 약17,000천원

4	<p>가로등 표찰 구 노선명 표기 및 구 CI 표찰, 미부착 표찰 등</p> <ul style="list-style-type: none"> - CI교체 대상 : 약554개 - 변색 및 미설치 : 약900개 	
조치계획	<ul style="list-style-type: none"> - 가로등 표찰 구매하여 일제 정비 시행 - 소요예산 : 약21,000천원 	
