

# 5호선 마천역 간이화장실 점검 보고

(2016.03.09 / 운전계획처)


## □ 일시 및 장소

- 마천역 회차선 간이화장실 3월09일 오전 09:30~10:30
- 참석대상 : 운전계획처 총괄부장 박기연 외 2명, 신호처 차장 권영오 외 2명

## □ 점검 안전

- 마천역 간이화장실과 열차 간 실측 거리 측정 및 열차 회차 위치 변경

## □ 실측 거리

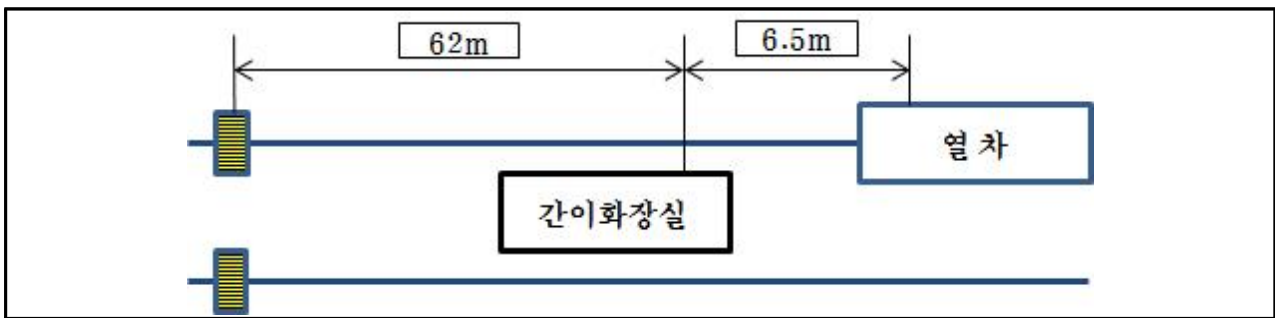

## □ 부서별 견해

운전계획처	신호처
1. 화장실 위치에 맞는 회차 위치 변경	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 미니본드 이설(6R, 8X)</li> <li>2. TWC LOOP 이설</li> <li>3. 976T와 978T 절연 이설 및 본드류 재 설치 공사 시행</li> <li>4. 향후 6번 신호기 이설 상황 잠재</li> <li>5. 자동운전 차량 DB변경 예상</li> <li>6. 열차 차단막이와 안전거리 미확보</li> <li>7. 열차 무인운전시 테스트 필요</li> </ol>

## □ 향후 계획

- 간이 화장실 활성화를 위한 대책 지속적 검토. 끝.



점검 사진



점검 사진
