

중랑구 가로수 조성 · 관리계획 변경 및 숙선옹주로 가로수 바꿔심기 계획

2019. 4.

요구기관 : 중랑구

□ 노선 현황

- 도로명 : 숙선옹주로
- 구간 : 공릉로(묵동자이) ~ 대림아파트 교차로
- 규 모 : 길이 2,400m(양방향), 도로폭 20m, 보도 폭 1.5~2.0m
- 관리구분 및 가로유형 : 구도로, 일반생활가로

□ 가로수 및 식재현황

- 식재 현황 : 180주
 - 양버즘나무 168주, 은행나무 12주

□ 기본계획-중량구 가로수 조성. 관리 계획(2011.09.)

- 조성관리계획 : 기존 가로수 유지관리 노선 설정
- 우점수종 : 양버즘나무

상 정 안 건 개 요

중 량 구

□ 가로수 바꿔심기 계획 노선 현황

- 위 치 : 먹골파출소 사거리 ~ 묵동체육관삼거리
- 규 모 : 길이 250m(남측보도), 폭 20m, 보도 폭 1.0~2.0m
- 현 황 : 양버즘나무 20주, 결손주 2주

□ 심의내용

- 기본계획 수종 변경
 - 당초 : 유지관리노선
 - 변경 : 장기변경(이팝나무)
- 바꿔심기 내용
 - 양버즘나무(B25~35) 20주 (8m간격)
 - 이팝나무(H4.0xR15) 32주 (6m간격)

수 종	규 격	수 량	단 위	비 고
이팝나무	H4.0xR15	32	주	

□ 가로수 바꿔심기 상정사유

- 2019년 보도정비사업에 따라 가로수 이식 필요
- 보도 폭에 비해 지나치게 커진 양버즘나무로 인해 쾌적한 보행환경 유지와 차량의 시야 확보가 어려우므로 보행환경에 적합한 가로수로의 교체가 필요함
- 보행약자(휠체어, 유모차 이용자)등 주민들의 보행불편에 대한 민원이 지속적으로 발생하는 지역으로 가로미관 향상을 위해 가로수 수종교체가 필요함
- 양버즘나무 뿌리 성장으로 인한 보도용기로 보행에 불편을 초래하고 있으며 안전사고에 위험이 있으므로 수종교체가 필요함

추진경위

중랑구

- '11. 09 : 중랑구 가로수 조성 및 관리기본계획 수립 및 공표
- '19. 03 : 2019년 보도정비사업 시행(숙선옹주로 일부구간)
- '19. 04 : 중랑구 가로수 이식 및 수종교체사업 추진
- '19. 04 : 2019년 도시공원위원회 심의 상정
- '19. 04. ~ '19. 06 : 2019년 보도정비사업 사업 공사시행(예정)

위 치 도

중 량 구



수종별 현황

중랑구



가로수 범례	양버즘 —	은행 —	감나무 —	메타세쿼이아 —	중국단풍 —
--------	-------	------	-------	----------	--------

전 체 현 황 전 경

중 랑 구



구 간 현 황

중 량 구

□ 목동120-1, 숙선옹주로 66(먹골파출소 사거리 ~ 목동체육관삼거리)

- 연 장 : 250m(남측보도)
- 보 도 폭 : 1.0~2.0m
- 수 종 : 양버즘나무 20주
결손주 2주

1x1 보호판	1x4 보호판	결손주	소계
6주 (27.3%)	14주 (63.6%)	2주 (9.1%)	22주 (100%)



구 간 현 황

중 랑 구




□ 사업방향

- 공간적 : 숙선 응주로의 보행환경 쾌적성을 개선하기 위해 보도폭 확장사업과
더불어 양버즘나무를 이팝나무로 교체
- 기능적 : 서울의 기후와 토양에 적합하며 보행 방해의 위험이 적고 관리가 용이한
이팝나무 선정

□ 수종 선정 사유

- 현 양버즘나무는 수형이 불량하고, 뿌리성장으로 인한 보도용기로 보행에 불편을
초래하고 있으며 안전 사고에 위험이 있음.
- 주민의견 고려 및 대상지 주변여건을 반영하여 이팝나무 가로수를 식재하여 아름
다운 가로경관을 조성하는데 그 목적이 있음.

□ 숙선옹주로 (먹골파출소 앞)

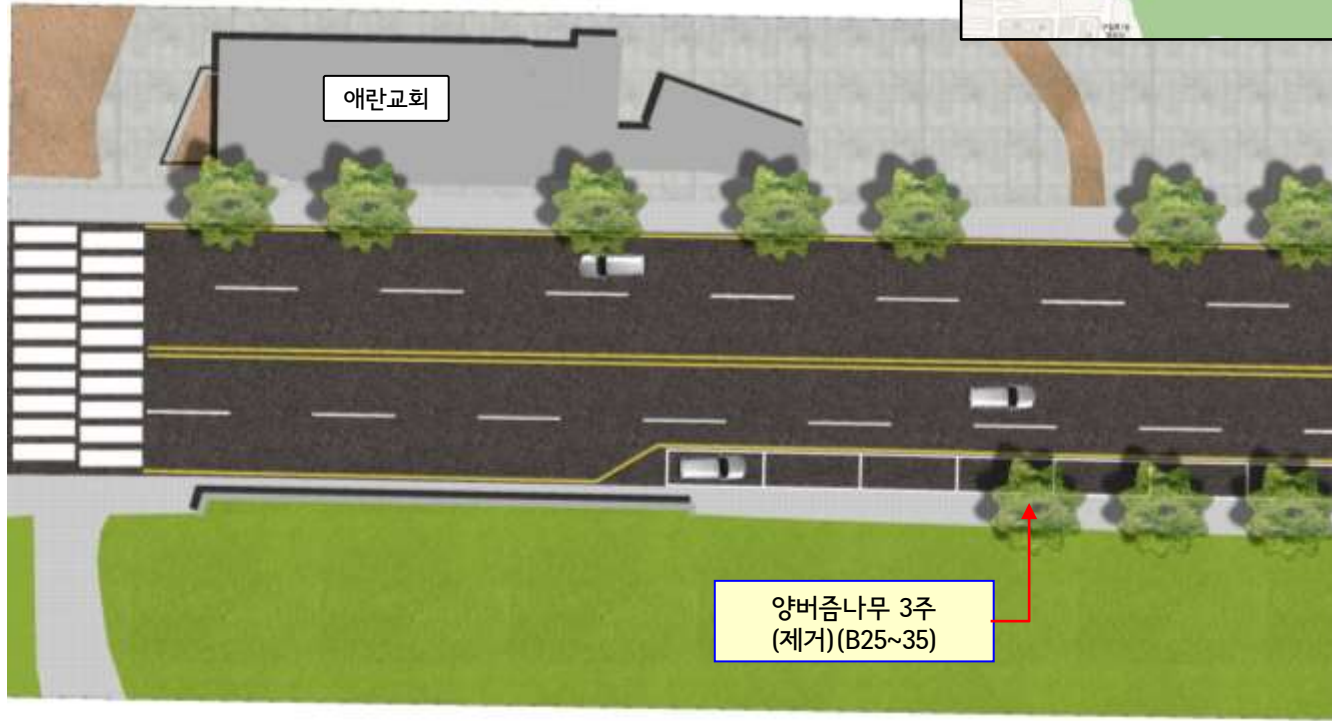

현 황 도

중 량 구

□ **숙선옹주로 (목골파출소 앞~목동다목적 체육관)**




양버즘나무 9주
(제거) (B25~35)




현 황 도

중 량 구

□ **숙선옹주로(목동체육관 삼거리 앞)**

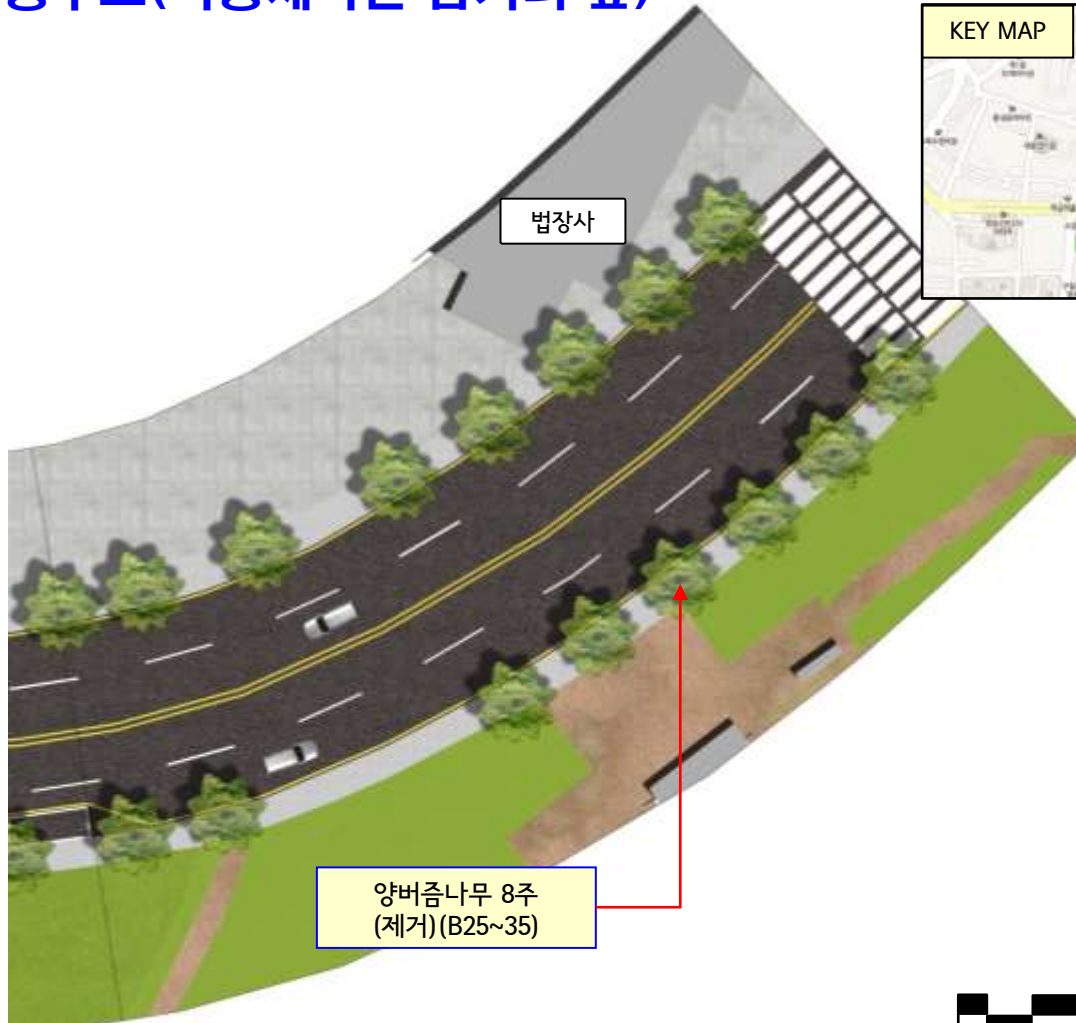

양버즘나무 8주
(제거)(B25~35)



가로수 바뀌심기 계획도

중 량 구

□ 속선용주로 단면도(표준부)


- 현황 평면도




- 계획 평면도



표준단면(현황)

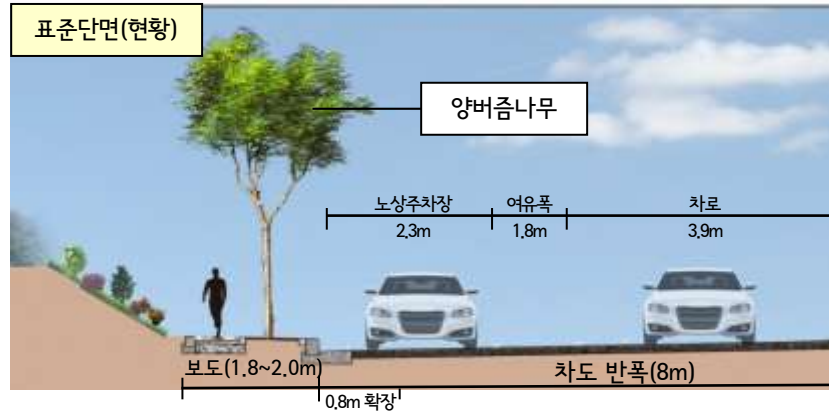

표준단면(계획)

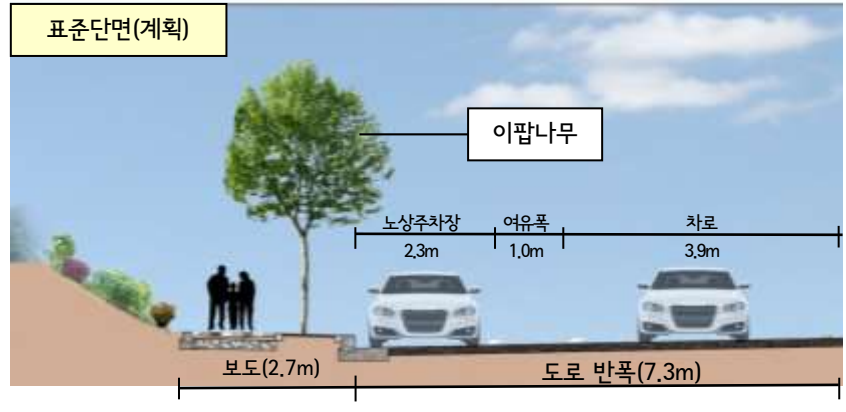

* 평균 보도 폭 1.9m를 2.7m로 확장하고 이팝나무를 6m간격으로 식재

가로수 바뀌심기 계획도



중 량 구

□ 속선용주로 단면도(옹벽부)

- 현황 평면도



- 계획 평면도

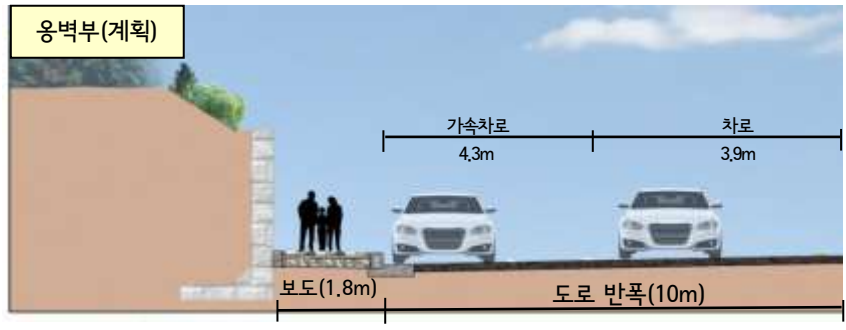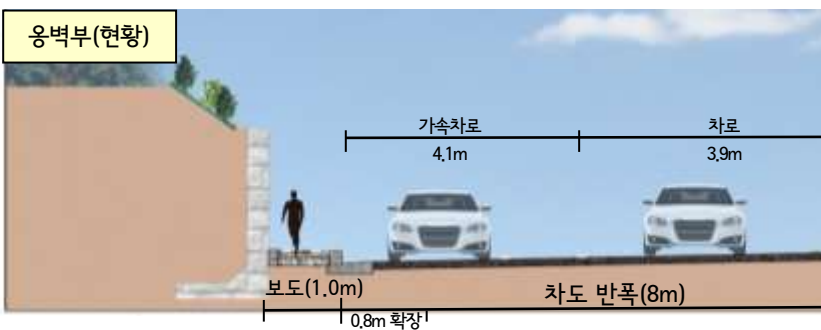


* 협소한 보도 폭1.0m를 1.8m로 확장하고 옹벽 음지부 지역과 통행을 고려 가로수는 미적용


식재계획도

중랑구

□ **숙선옹주로 (먹골파출소 앞)**

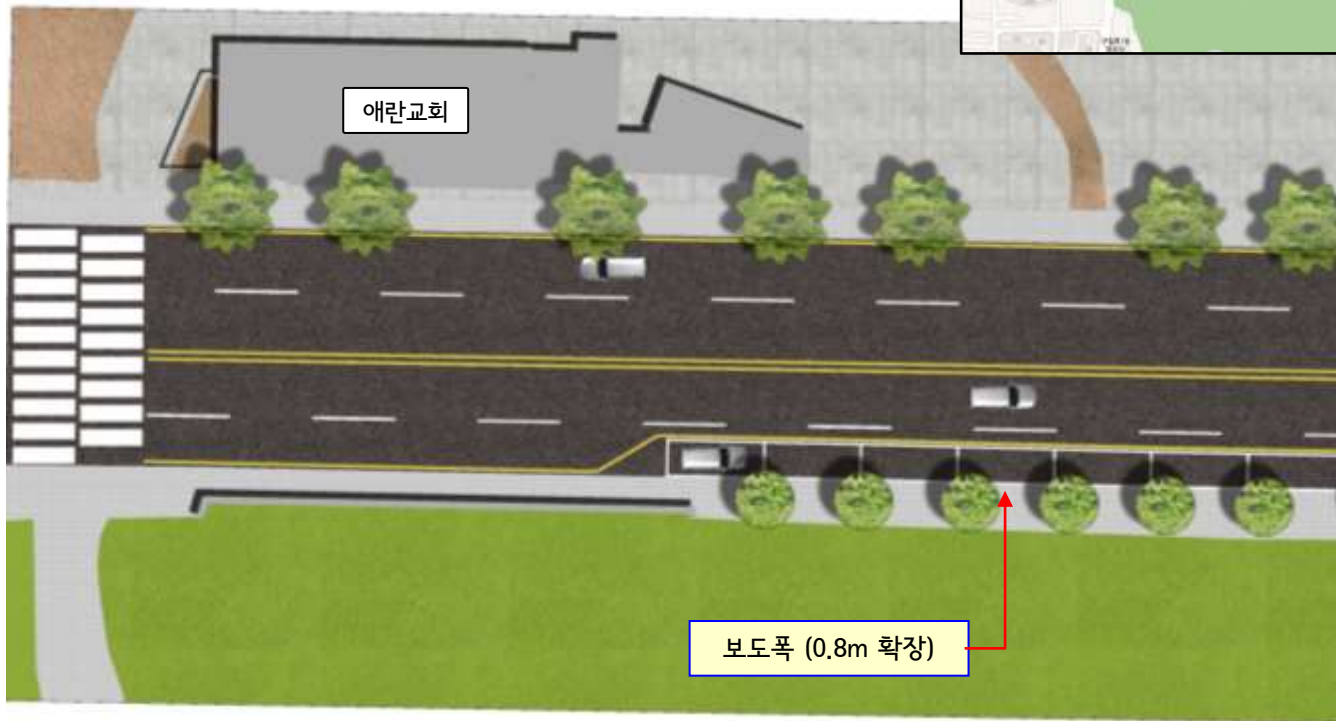


이팝나무: H4.0 X R15 - 6주



식재계획도

중랑구

□ **숙선옹주로 (먹골파출소 앞~묵동다목적 체육관)**

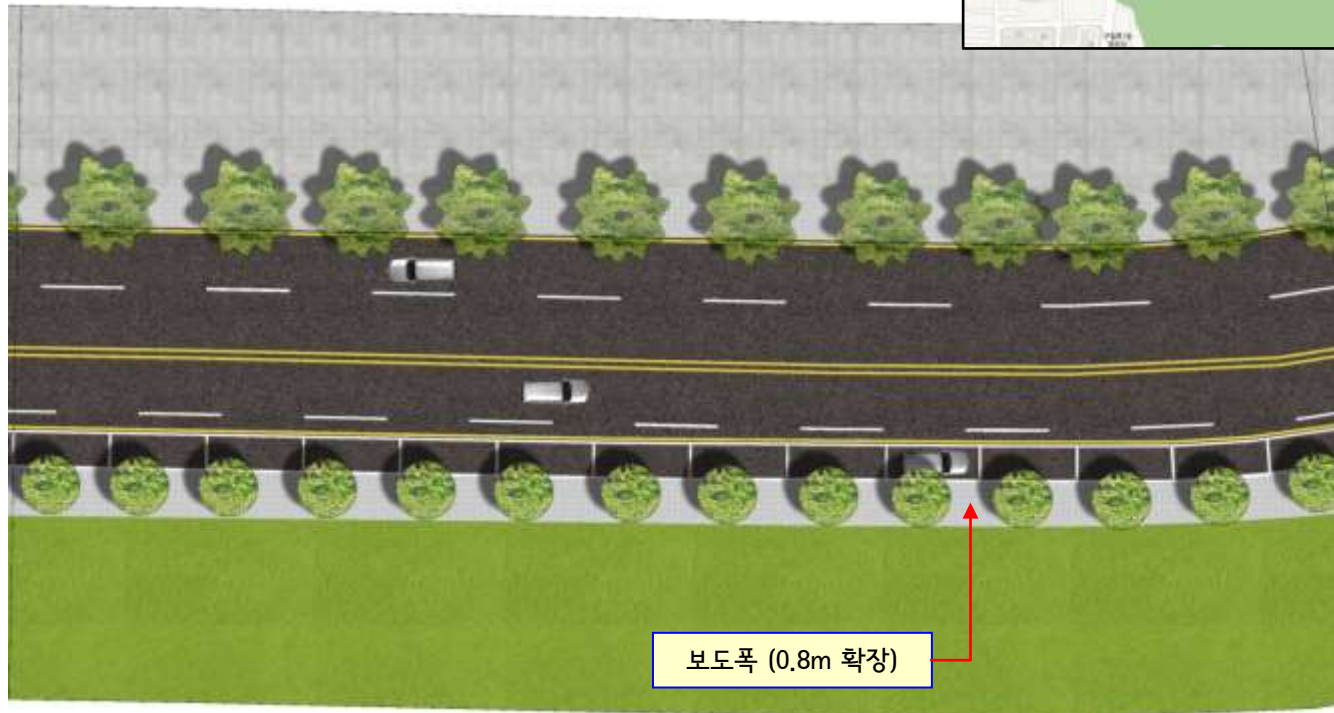

이팝나무: H4.0 X R15 - 14주




식재계획도

중랑구

□ **속선용주로(묵동체육관 삼거리 앞)**





이팝나무: H4.0 X R15 - 12주



보호시설물 상세도

종 랑 구

□ 수목 보호판

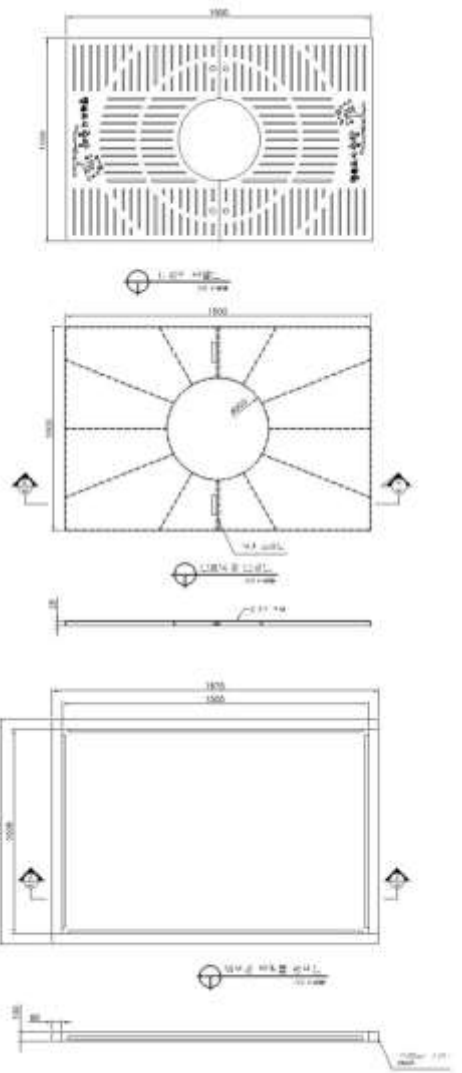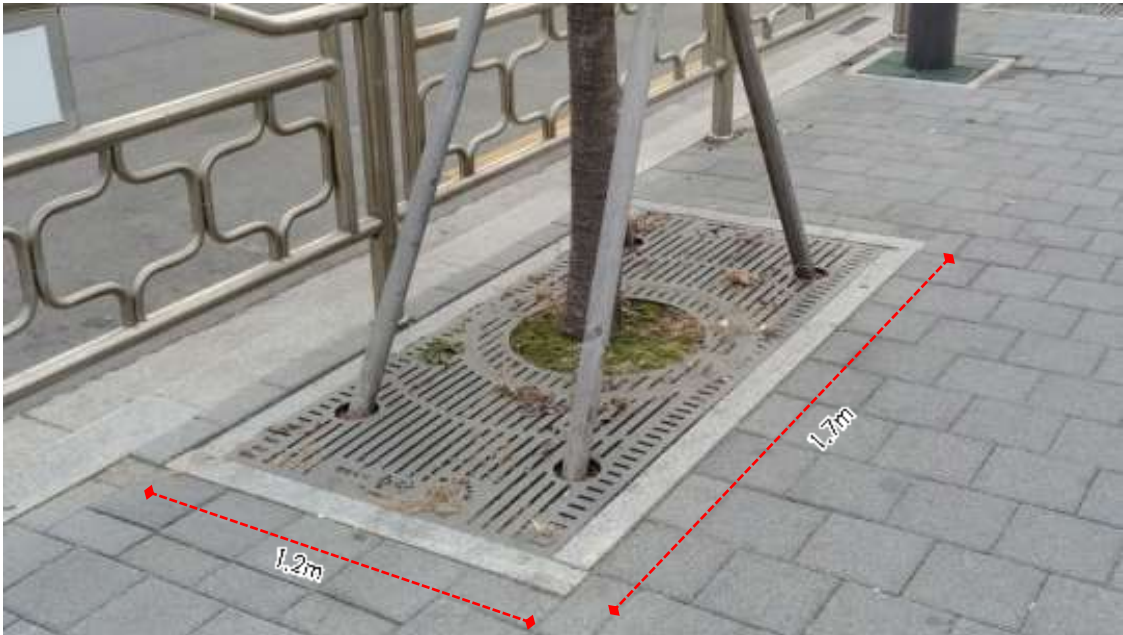

감사합니다.
