

# 도봉구 가로수 조성·관리계획(변경) 및 시루봉로 15길 가로수 바뀌심기 계획

2018. 09.

요구기관 : 도봉구

### □ 노선 현황

- 도로명 : 시루봉로 15길(남도빌라 교차로 ~ 로데미리교회 교차로)
- 규 모 : 길이 281m(양방향), 폭 8m(보도 폭 약1.5m)
- 관리구분 및 가로유형 : 구 도로, 주거지 및 상가

### □ 가로수 및 식재현황

- 식재 현황 : 44주 (좌측:22주, 우측:22주)
  - 은행나무 44주(R30~40)

### □ 도봉구 가로수 조성·관리 계획(2011.07)

- 구 간 : 시루봉로 15길 (281m)
- 시루봉로 15길 : 장기변경노선(계획수종 : 은행나무)

# 상 정 안 건 개 요

도      봉      구

## □ 상 정 안 건

- 기본계획 수종 변경
  - 당초 : 장기변경(은행나무)
  - 변경 : 장기변경(중국단풍)
  
- 바뀌심기 내용
  - 은행나무(R30~40)44주
  - 중국단풍(R15) 19주

수 종	규 격	수 량	단 위	비 고
중국단풍	R15	19	주	

### □ 가로수 바뀌심기 상정사유

- 방학2동 도시재생사업과 연계한 도로다이어트 시행으로 보도폭이 확장됨에 따라 가로수 이식(위치이동)이 불가피하나,
- 현재 가로수인 은행나무는 수목의 규격이 커서(R30~40) 이식 후 재식재가 어렵고 가로수 바뀌심기가 필요함
- 시루봉로 15길 가로수 식재수종은 가로경관과 지역주민의 의견을 반영하여 중국단풍으로 변경하여 시행하고자 함

- 2014. 12. : 「도봉구 방학2동 숲속마을 주거환경관리사업 정비계획수립」 용역 착수
- 2017. 08. : 「도봉구 방학2동 숲속마을 주거환경관리사업」 정비구역 지정 및 정비계획 결정
- 2018. 04. : 「도봉구 방학2동 숲속마을 주거환경관리사업 정비기반 시설 실시설계」 용역 착수
- 2018. 05. : 2018년 도시공원 위원회 심의 상정 (도봉구)
- 2018. 07. : 2018년 도시공원 위원회 재심의 결정 (서울시)
- 2018. 10. ~ 2019.06 : 도로다이얼트 사업 공사시행(예정)

# 위 치 도

## 도 봉 구




# 구 간 현 황

도 봉 구

## □ 시루봉로 15길 (남도빌라 교차로 ~ 로템감리교회 교차로)

- 연 장 : 281m (B=11m)
- 보 도 폭 : 가로수포함 약1.5m (가로수를 제외한 순수 보도유효폭 0.5m~1.5m)
- 수 종 : 은행나무 44주
- 현 황 : 보도 유효폭이 협소하여 주민통행 불편, 차로폭 축소 및 보도폭 증대 필요

은행나무 가로수







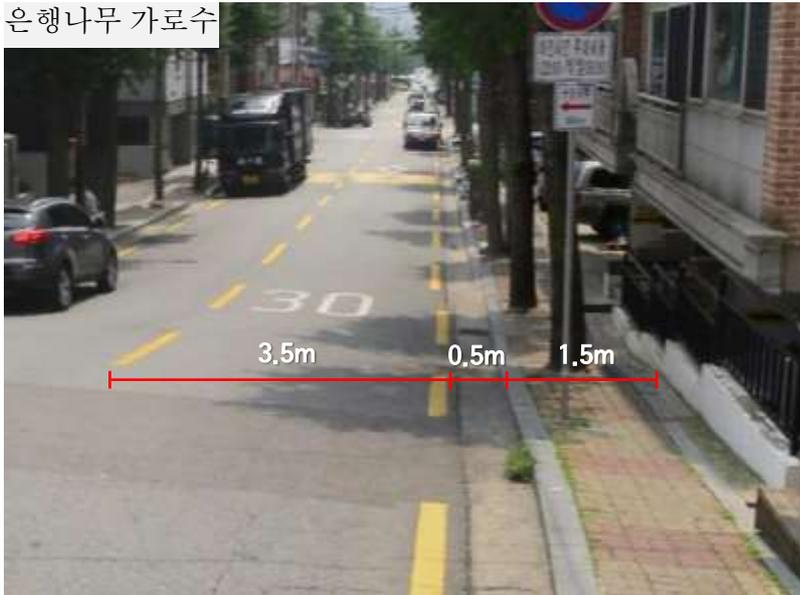


협소한 보행공간



# 구 간 현 황


## 도 봉 구

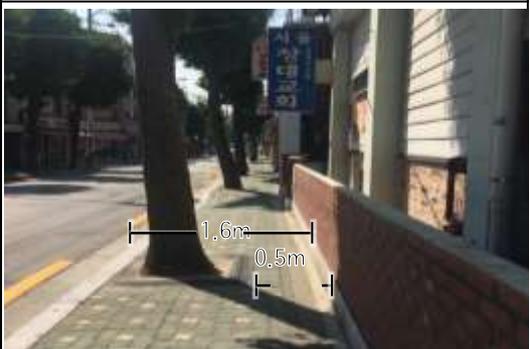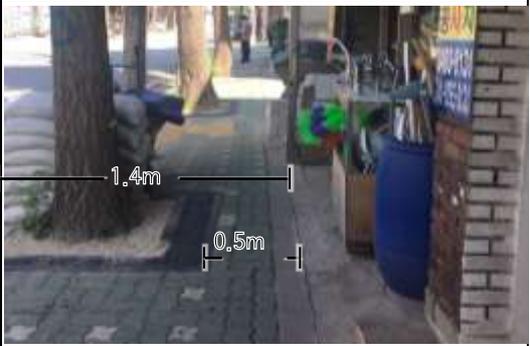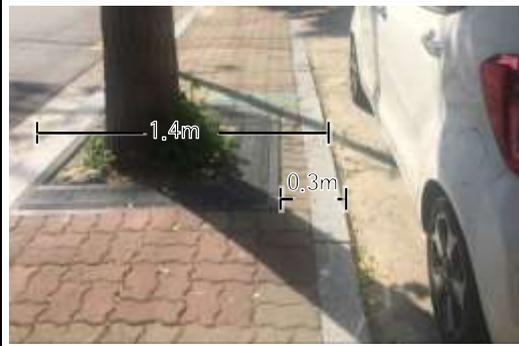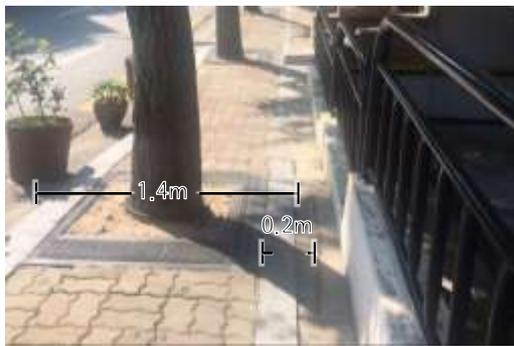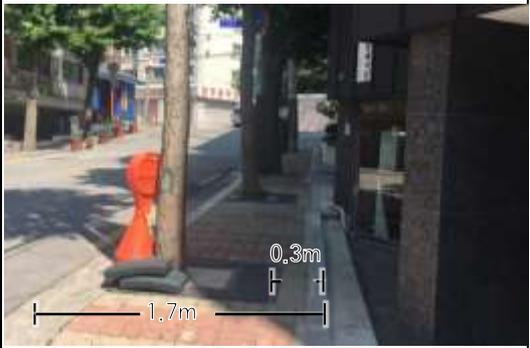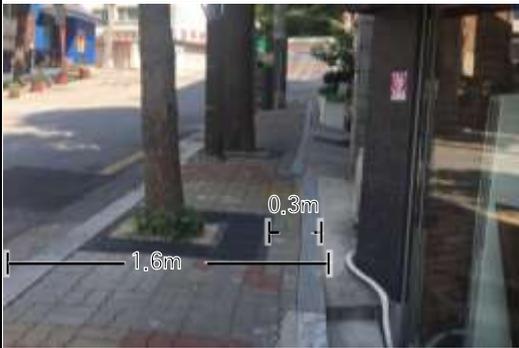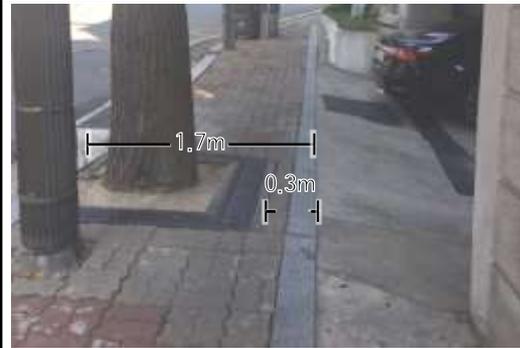

# 현 황 도

# 도 봉 구

## □ 시루봉로 15길(남도빌라 교차로 ~ 서울창대교회 교차로)

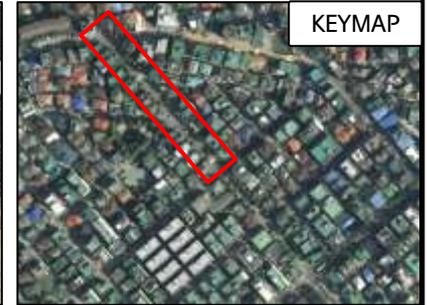

### • 수목수량표


수목명	규격	수량	비고
은행나무	R30~40	23주	



# 현 황 도

# 도 봉 구

## □ 시루봉로 15길(서울창대교회 교차로 ~ 로템감리교회 교차로)

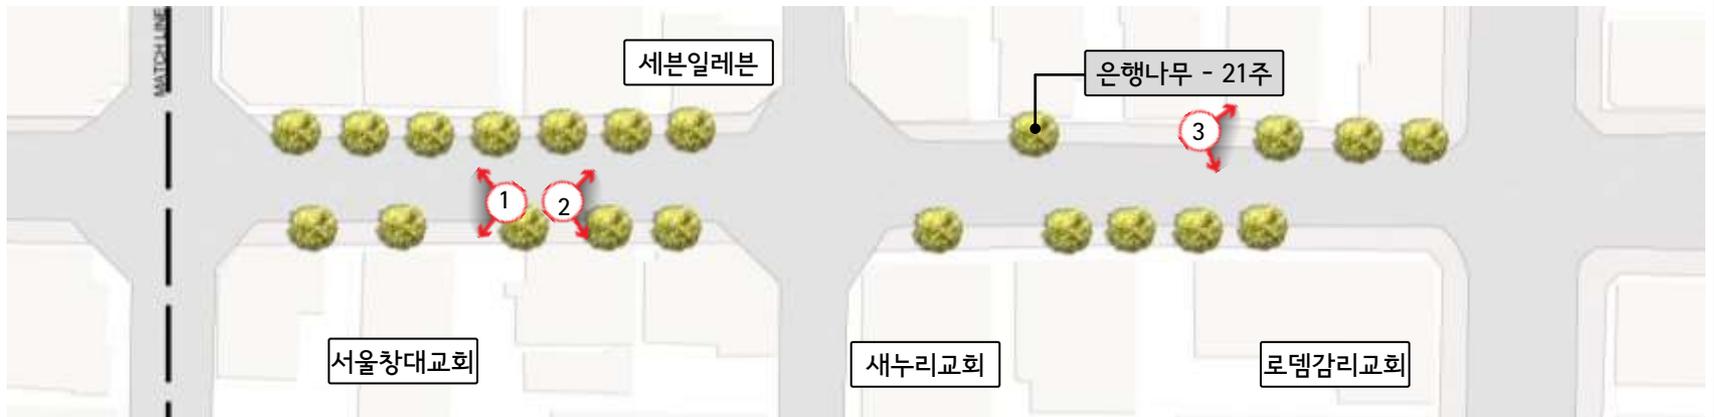

### • 수목수량표

수목명	규격	수량	비고
은행나무	R30~40	21주	



### □ 시루봉로15길(현황 및 계획)

구 분	시루봉로15길 도로 횡단면도
<p><b>현 황</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 차로폭 3.5m</li> <li>불법주정차 원인</li> <li>보도폭 협소</li> <li>가로수 보행방해</li> <li>빗물받이 이설 필요</li> </ul>	
<p><b>개 선 (안)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 차로폭 축소</li> <li>(버스통행고려)</li> <li>보도폭 증대</li> <li>가로수 최소화</li> <li>빗물받이 50cm 이설</li> </ul>	

# 식재 계획도

도봉구

## □ 시루봉로 15길(남도빌라 교차로 ~ 서울창대교회 교차로)

- 대상지 내 가로수(은행나무) 전체 제거 후 중국단풍(R15) 식재
- 기존 가로수 식재지 중 보도폭이 지나치게 좁고, 건물 진출입로 및 버스정류장과 인접하여 불편사항 발생하는 곳은 가로수 재식재를 제외하였음(도로 좌우 경관과 식재 간격을 고려하여 조정)



### • 수목수량표(철거)

수목명	규격	수량	비고
은행나무제거	R30~40	23주	

### • 수목수량표(신규)



수목명	규격	수량	비고
중국단풍	R15	10주	

# 식재 계획도

도봉구

## □ 시루봉로 15길(서울창대교회 교차로~로템감리교회 교차로)

- 대상지 내 가로수(은행나무) 전체 제거 후 중국단풍(R15) 식재
- 기존 가로수 식재지 중 보도폭이 지나치게 좁고, 건물 진출입로 및 버스정류장과 인접하여 불편사항 발생하는 곳은 가로수 재식재를 제외하였음(도로 좌우 경관과 식재 간격을 고려하여 조정)

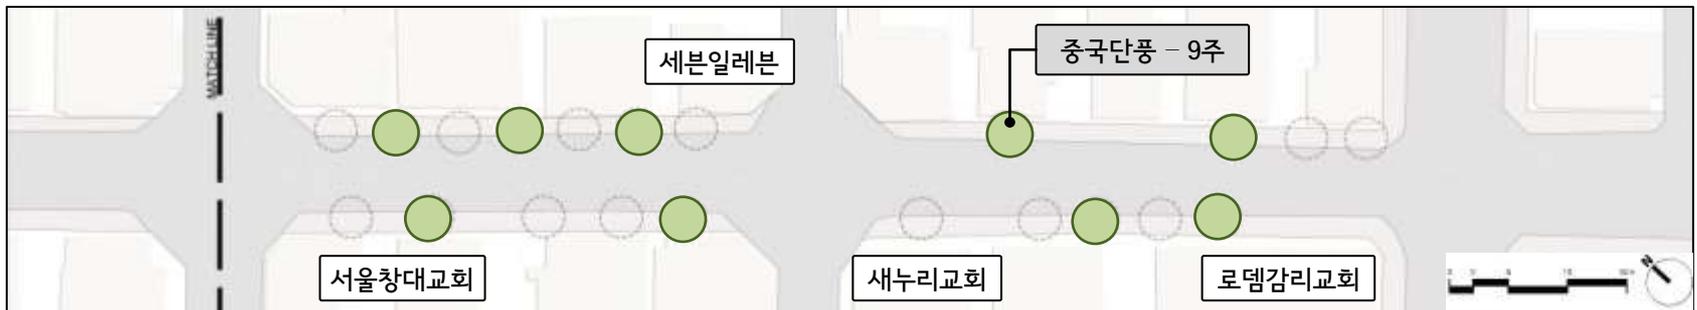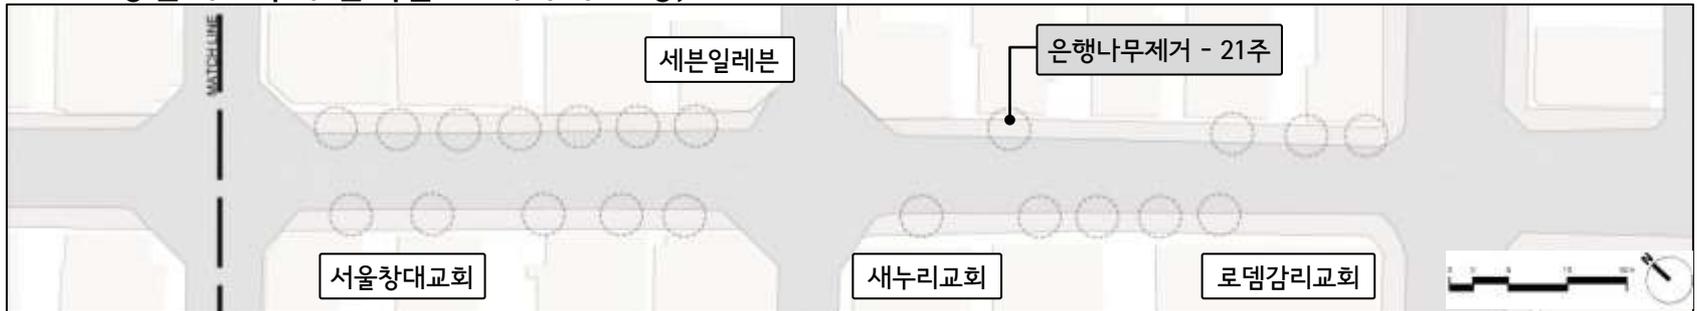

### • 수목수량표(철거)

수목명	규격	수량	비고
은행나무제거	R30~40	21주	

### • 수목수량표(신규)

수목명	규격	수량	비고
중국단풍	R15	9주	
