

시행	안전관리과-1927 (2014.6.12.)
접수	도시철도건축부-3776 (2014.6.12.)
보존기간	년
결재일자	2014.6.12.
공개여부	대시민공개
수신자	수신자참조

주무관	안전관리과장		
이상훈	06/12 박상태		
협조			

건설공사장 기동불시 특별점검 결과보고 [우이~신설 1공구]

- 점검일시 : 2014. 6. 12(목)
- 점검결과
 - ◆ 점검자 : 안전관리과 이상훈

○ 개인보호구 착용관리에 관한 사항

<작업현황>

- 차량기지구간내 자재납품 차량 운전기사가 트럭위에서 자재 옮기는 작업중

<위험요인>

- 인근 차량기지 작업구간에서 자재 등의 낙하사고 위험이 있으므로 반드시 작업구간내에서는 안전모를 착용할 것

※ 도시철도건축부 소관




○ 기타 안전에 관한 사항

(검토사항)

- 차량기지2층에 있는 폐자재의 처리를 위하여 크레인으로 처리한다고 하나, 이를 이용하지 않을시에는 투하설비를 설치하여 처리할 것.

※ 도시철도건축부 소관

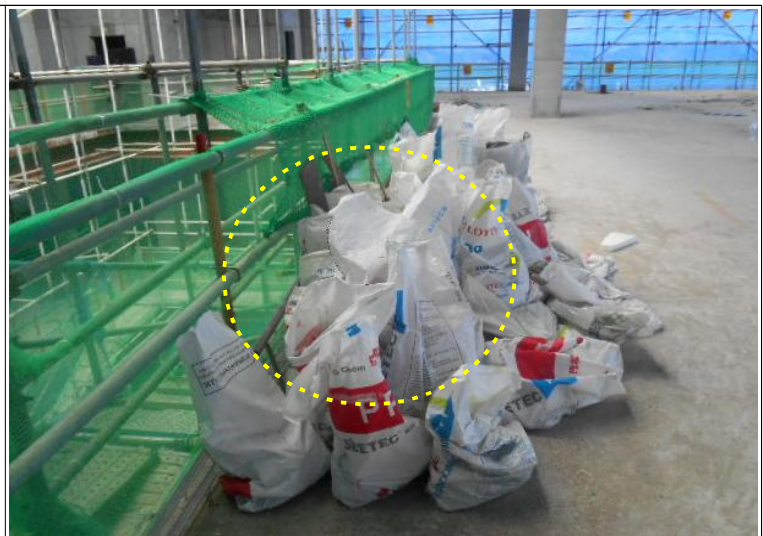

○ 작업환경 개선에 관한 사항
(검토사항)

- 차량기지 지하실 계단부에 작업자가 소변을 본 흔적이 있으므로 청소 조치하고 근로자에게 교육요함.




- 차량기지 지하2층 계단부 측면에 체수가 있으므로 여름철 미생물 번식우려가 있으므로 조치 요함.



○ 폭발재해 예방에 관한 사항
(검토사항)



- 화약 장전용 삽입봉을 PVC 파이프 로 사용중이므로 규정에 적합한 자재로 교체하여 폭발재해 예방요함.

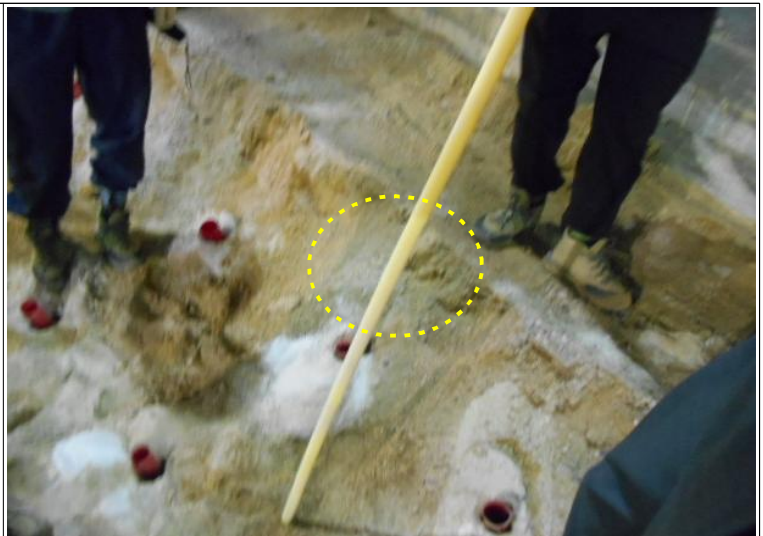


○ 흠막이 붕괴재해 예방에 관한 사항

(검토사항)

- 1번 정거장 구간 단부의 락볼트 보강요함.

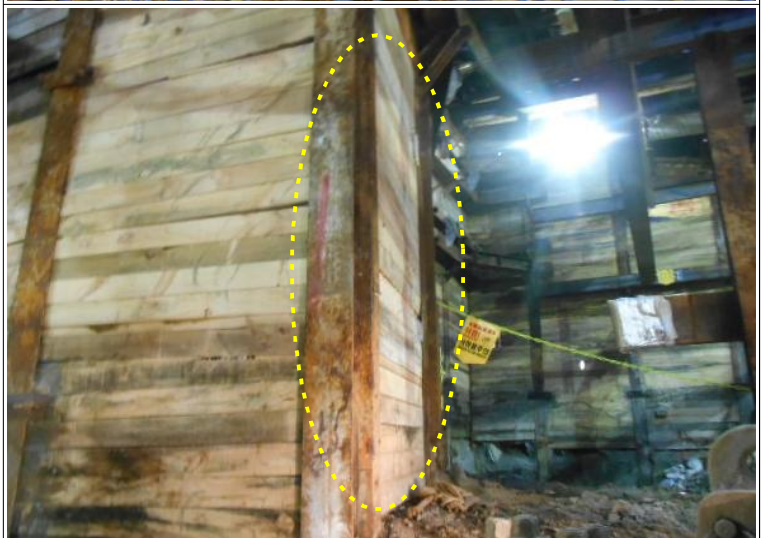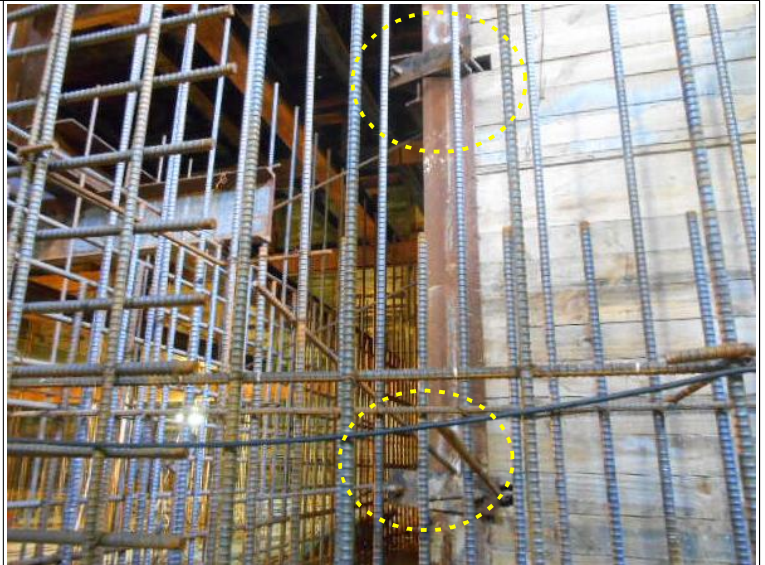

- 1번 정거장 구간 토류부 단부 락볼트 보강요함.

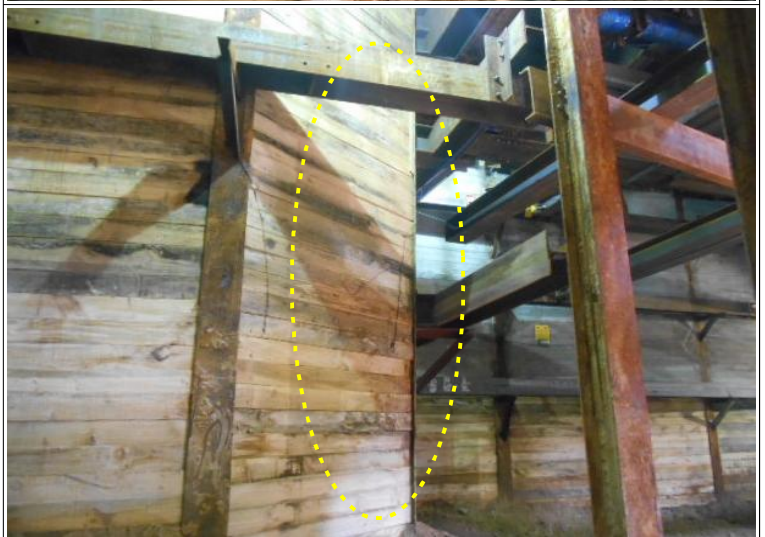

○ 낙하 재해예방에 관한 사항
(검토사항)

- 토사인양중인 버킷의 보조 와이어로 프를 체인으로 교체하여 사용요함.



○ 기타 안전에 관한 사항
(검토사항)

- 3정거장 중점부의 통신케이블 등을 정비요함.



○ 권고사항

- 수방대비하여 수방대책을 재검하여 긴급상황에 대비 요함.

□ 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전·후 사진을 첨부하여 부서장 보고 후 2014. 6. 19(목)까지 안전관리과로 제출하여 주시기 바랍니다. 끝.

