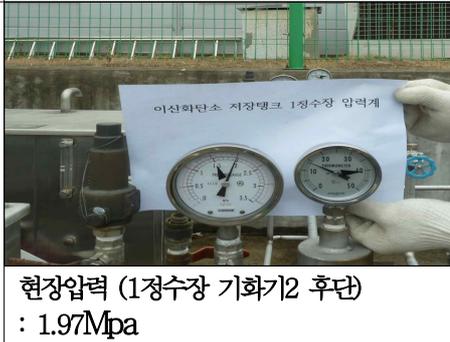
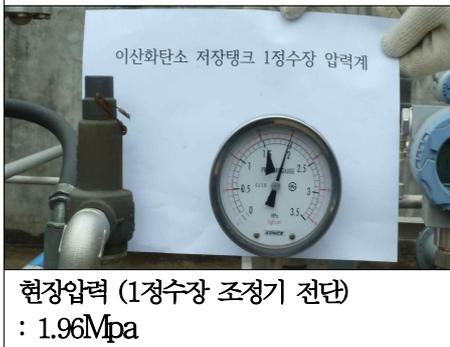


# 1. 이산화탄소 압력계 기능검사 재측정

- 구간2: 1정수장 기화기 ~ 조정기 (3개소)

 <p>이산화탄소 저장탱크 1정수장 압력계</p>	 <p>이산화탄소 저장탱크 1정수장 압력계</p>
<p>표준압력 (기화기 ~ 조정기) : 1.94Mpa</p>	<p>현장압력 (1정수장 기화기1 후단) : 1.76Mpa → <b>측정불가(고장)</b></p>
<p>-</p>	 <p>이산화탄소 저장탱크 1정수장 압력계</p>
	 <p>이산화탄소 저장탱크 1정수장 압력계</p>
	<p>현장압력 (1정수장 기화기2 후단) : 1.97Mpa</p>
	<p>현장압력 (1정수장 조정기 전단) : 1.96Mpa</p>

끝.
