

작업지시서 - 1차

건 명	구의취수동 전기실 변압기실 차양판 설치외 4건
위 치	강북취수장 내
계약자	광장토건(주) 대표 권지영
공사개요	<p>○ 작업내용</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 구의취수동 1,2층 전기실 변압기실 차양판설치 - 52개소 2. 구의취수동 인젝터 설비 샌드위치패널 설치 및 뚝도 인젝터실 확장 3. 간이식당 주변 지반정리 및 야자매트 설치 4. 간이식당 취사설비 보호 칸막이 설치 5. 강북취수동 주출입 방화문 교체 <p>○ 공사기간 : 2018.6.3. ~2018. 7.31</p>
예산금액	<p>- 28,000천원</p> <p>- 신규공종은 낙찰율 적용하여 설계변경시 정산</p>
점검자 (입회자)	<p>직급 : 시설6급 성명 : 김종원</p> <p>직급 : 전문경력관 성명 : 이정호</p> <p>직급 : 공업6급 성명 : 김효준</p>

위와 같이 작업지시를 하오니 기한내 조치 하여 주시기 바랍니다

2019. 5. 31

작성자 : 원수관리과 시설6급 김종원


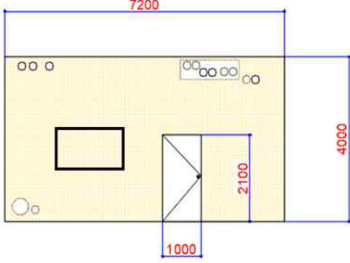
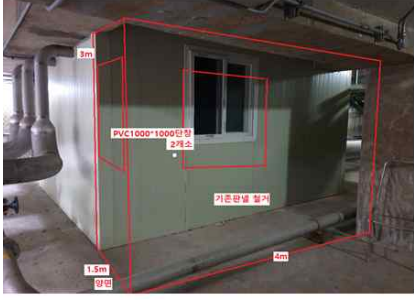
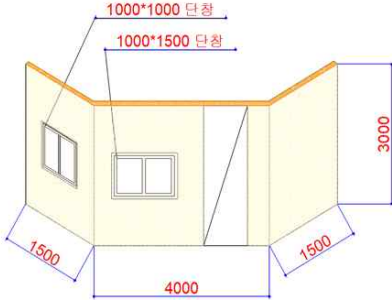
확인자 : 원수관리과 유통희

보수예정정보고서(1차)

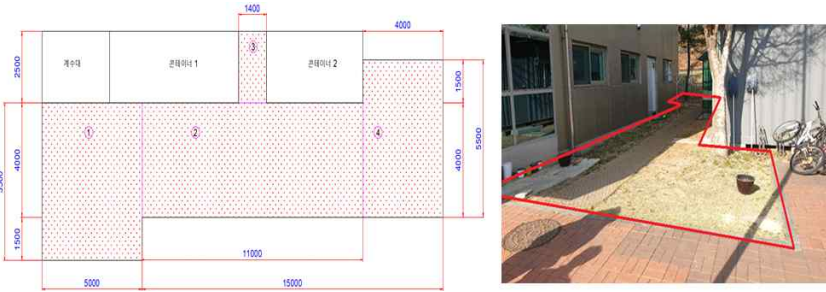
1. 구의취수동 1,2층 전기실 변압기실 차양판 설치 (52개소)

건 명	구의취수동 1,2층 전기실 변압기실 차양판 설치
작업내용	<p>The drawings show a grid of rooms. The top row shows five rooms: three '전기실' (Electrical Rooms) and two '변압기실' (Transformer Rooms). The bottom row shows four '전기실' (Electrical Rooms). Dimensions are provided for each room, such as 2000, 2470, and 1500. A legend on the left specifies 16 fixed windows (고정식 16개) and 36 sliding windows (수동식 36개).</p>
공종	차양판 52개소(1.5×1m/개) 설치

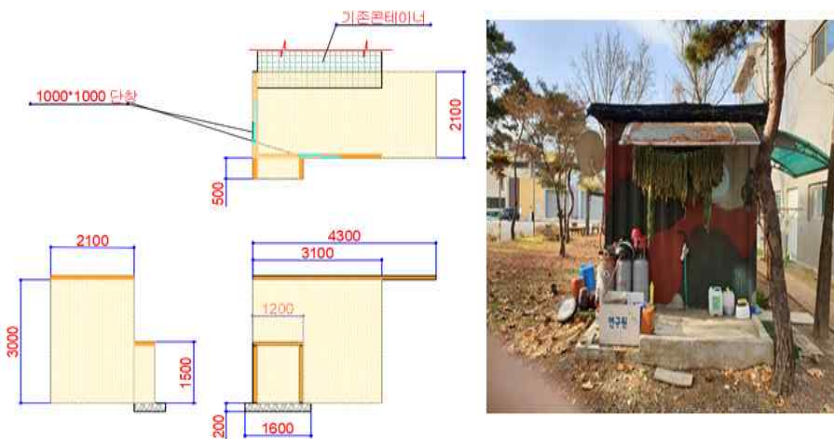
2. 구의취수동 인젝터 설비 패널 설치 및 똑도 인젝터실 확장

<p>건 명</p>	<p>인젝터실 패널 설치 및 확장</p>
<p>작업내용</p>	<p>1. 구의취수동 인젝터실 설치</p>   <p>2. 똑도 인젝터실 확장</p>  
<p>공종</p>	<p>수밀코킹 건축물 보양 건축물 현장정리 샌드위치패널 벽설치 pvc 창호 설치</p>

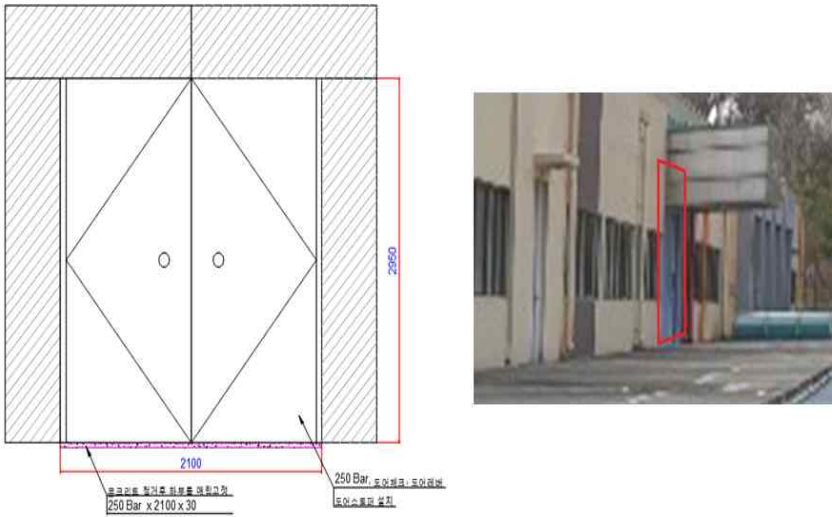
3. 간이식당 주변 지반정리 및 야자매트 설치

<p>건 명</p>	<p>간이식당 주변 지반정리 및 야자매트 설치</p>
<p>작업내용</p>	<p>지반정리 및 야자매트 설치</p>  <p>The diagram shows a site plan with dimensions and labels. The overall width is 15000 and the length is 5500. A central area of 11000 width and 4000 length is marked with a dotted pattern and numbered 1, 2, 3, and 4. Labels include '계수대' (water table), '콘테이너 1', and '콘테이너 2'. A photograph on the right shows the actual site with a red line indicating the work area, a tree, and a bicycle.</p>
<p>공종</p>	<p>터파기 다짐 - 플레이트 콤팩터 거적덮기 및 설치 파쇄물 걷기 및 싣기</p>

4. 간이식당 취사설비 보호 칸막이 설치

<p>건 명</p>	<p>간이식당 취사설비 보호 칸막이 설치</p>
<p>작업내용</p>	
<p>공종</p>	<p>수밀코킹 건축물보양 및 현장정리 샌드위치패널 벽설치 pvc 창호설치</p>

5. 강북취수동 주출입 방화문 교체

<p>건 명</p>	<p>강북취수동 주출입 방화문 교체</p>
<p>작업내용</p>	
<p>공종</p>	<p>수밀코킹 도아록 및 클로저 설치 방화문 설치</p>
