

2019년 가로변 녹지량 확충사업

(을지로)

2019. 04



서울중구

목차

1. 사업의 개요	03
2. 대상지 현황	05
3. 계획안	08
4. 예정 공정표	15
5. 개략 공사비	17

1. 사업의 개요

개요

개요

◇ 위치 : 을지로 (L=165m, W1.5~2.0m)

◇ 사업목표

가로녹지대의 환경개선을 통해 주민들에게 “쾌적하고 건강한 공공환경” 제공

◇ 사업내용



띠녹지 내 관목 및 초화류 보식

위치도 (을지로)




2. 대상지현황

을지로 현황사진

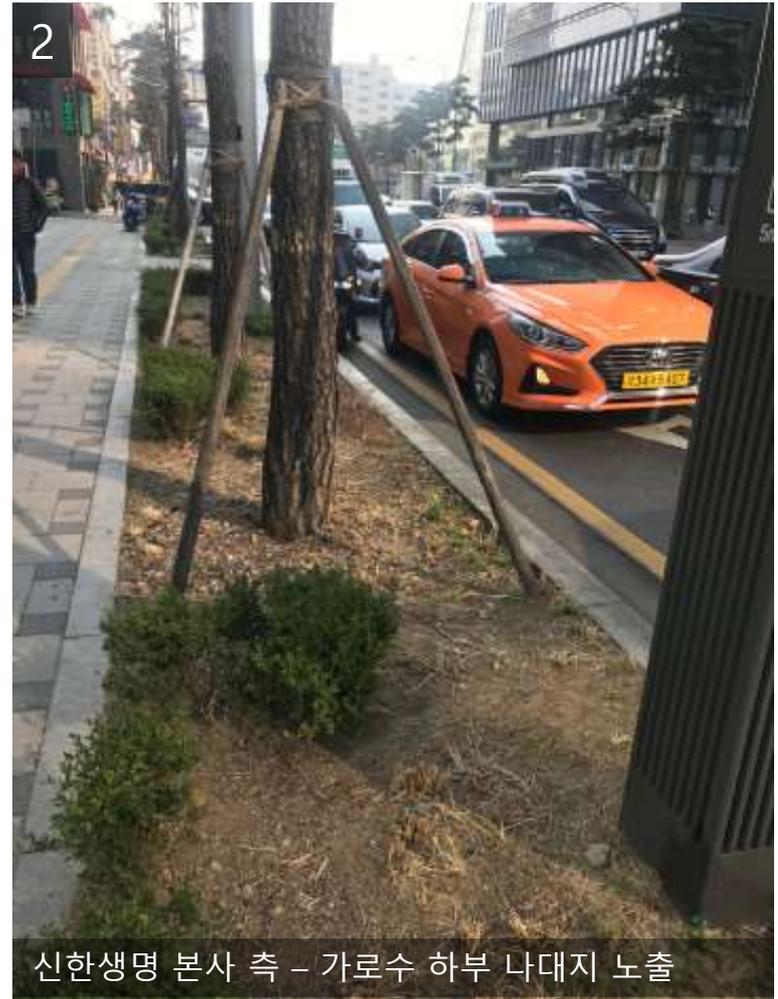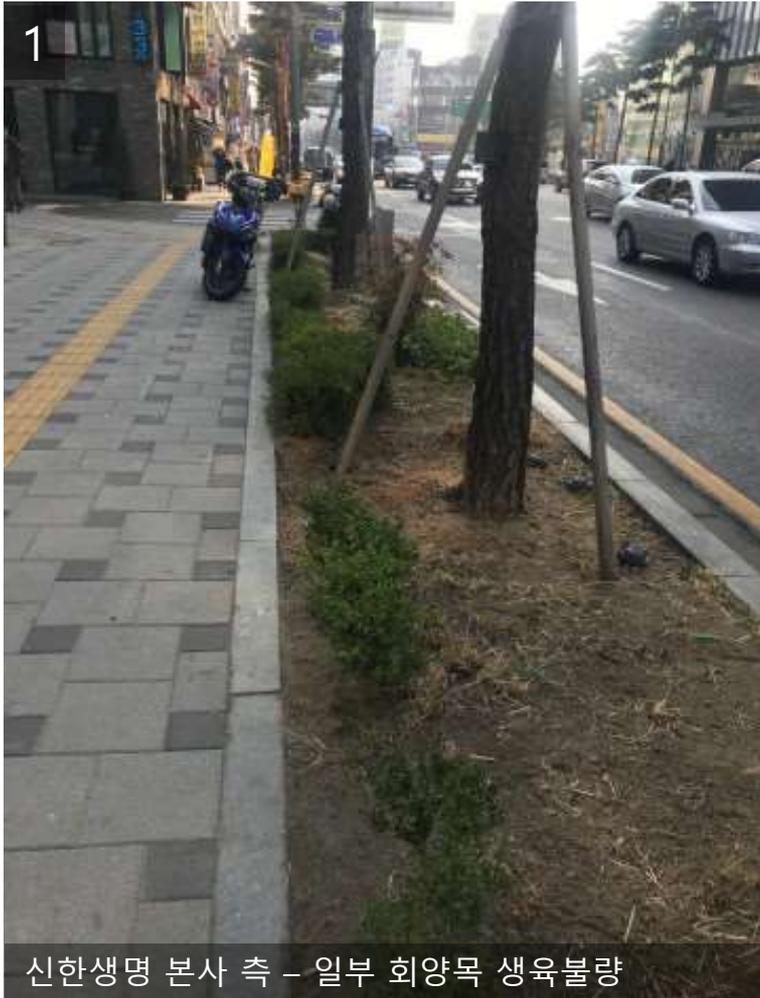

을지로 현황사진

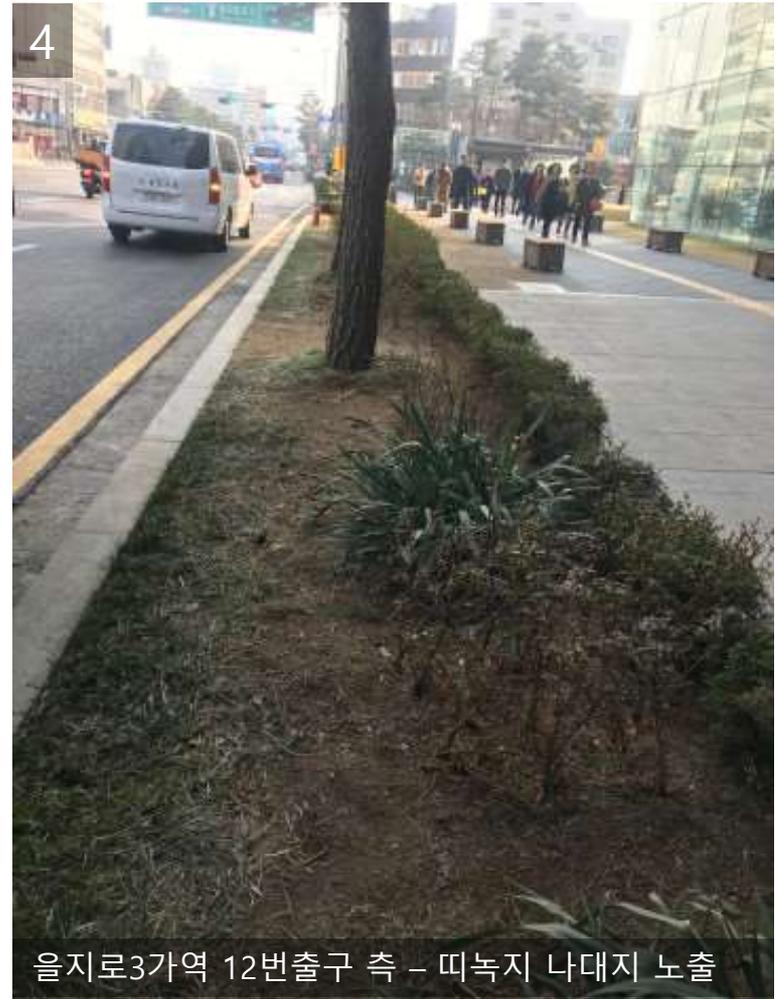

3. 계획안

조성계획

조성목표

- 을지로 : 가로수 하부 나대지 노출지역에 초화, 관목 식재 하여 경관 개선


관목 제거물량

- 회양목 제거 - 10주

띠녹지 조성계획

- 가로수 하부 관목 및 초화 식재
관목 - 145주, 초화 - 4,020본

주요 식재수종



총괄수량표

■ 철거수량표(을지로)


구분	기호	품명	규격	단위	합계	계획도-1	계획도-2	비고
상록관목	[]	회양목 (제거)	H0.3xW0.3	주	10	5	5	
		상록관목합계		주	10	5	5	

■ 식재수량표(을지로)


구분	기호	품명	규격	단위	합계	계획도-1	계획도-2	비고
상록관목	[]	황금측백	H0.6xw0.4	주	35	35	-	9주/m'
		상록관목합계		주	35	35	-	
낙엽관목	[]	삼색조팝	H1.0xW0.3	주	110	35	75	16주/m'
		낙엽관목합계		주	110	35	75	
		관목합계		주	145	70	75	
지피	[]	국화(가든멈)	24cm분	본	120	30	90	25본/m'
	[]	나리	12cm분	본	500	195	305	36본/m'
	[]	돌단풍	8cm	본	150	40	110	49본/m'
	[]	무늬달개비	10cm	본	500	335	165	36본/m'
	[]	무늬둥굴레	8cm	본	250	80	170	49본/m'
	[]	무늬맥문동	8cm	본	1,400	500	900	49본/m'
	[]	무늬쑥부쟁이	8cm	본	200	120	80	49본/m'
	[]	수국	18cm	본	200	85	115	30본/m'
	[]	수크령(리틀버너)	21cm	본	250	120	80	36본/m'
	[]	에키네시아	15cm	본	400	190	210	36본/m'
	[]	은쑥	15cm	본	100	30	70	36본/m'
			지피합계		본	4,020	1,725	2,295

현황 및 철거계획도 - 1

KEYMAP



1 현황및철거계획도-1
SCALE:1/50

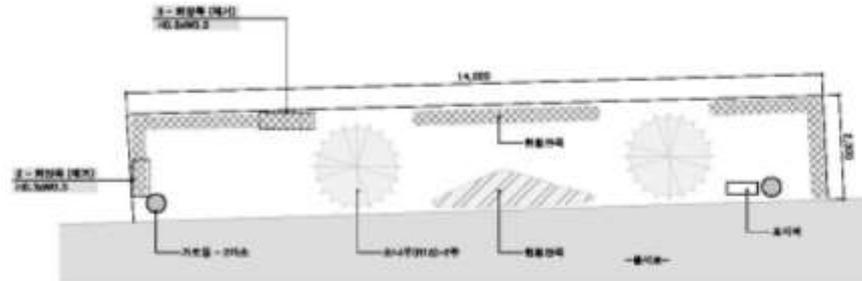


2 현황및철거계획도-2
SCALE:1/50

■ 철거수량표(음지표)-1


구분	가로	종량	과목	단위	수량	비고
관음죽	1000	1000	소-관음죽	주	5	
			소나무(110-20)	주	5	

현황 및 철거계획도 - 2

KEYMAP



1 현황 및 철거 계획도 - 1
SCALE:1/60




2 현황 및 철거 계획도 - 2
SCALE:1/60

철거수량표(별지표)-2

구분	기호	종류	규격	단위	수량	비고
상록수목		학갈매 (대기)	H0.3000.3	주	3	
		상록수목(원기)		주	3	


조경계획도 - 2

KEYMAP




식재수량표 (을지로) - 2

구분	식종	종이	단위	수량	비고	
상목종목	200	왕벚꽃	H1.0xW1.0	주	35	9부/구
	200	상목정원정계	주	35		
하목종목	100	상목정원정계	H1.0xW1.0	주	35	16부/구
	100	상목정원정계	주	35		
지목	000	국화(가운뎃)	24cm	본	90	35본/구
	100	나리	12cm	본	305	36본/구
	200	물단초	8cm	본	110	49본/구
	300	부디알개비	10cm	본	165	36본/구
	400	부디알개비	8cm	본	170	49본/구
	500	부디알개비	8cm	본	900	49본/구
	600	부디알개비	8cm	본	80	49본/구
	700	수국	15cm	본	115	30본/구
	800	수국(과(물베니)	21cm	본	40	36본/구
	900	해커네시아	15cm	본	310	36본/구
	000	잔목	15cm	본	70	36본/구
		지피정계	본	2,295		

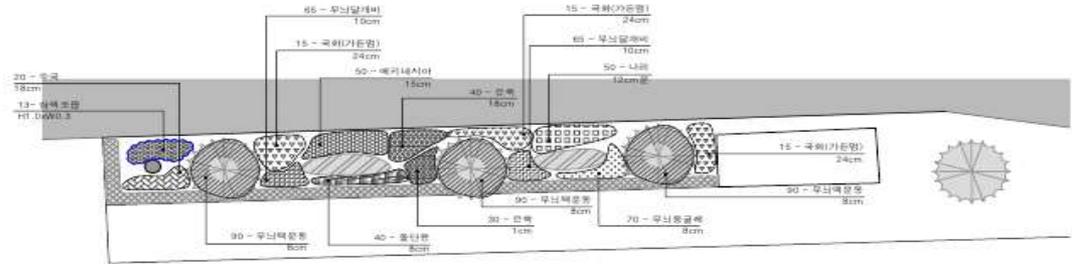

식재계획도 - 1
SCALE:1/60

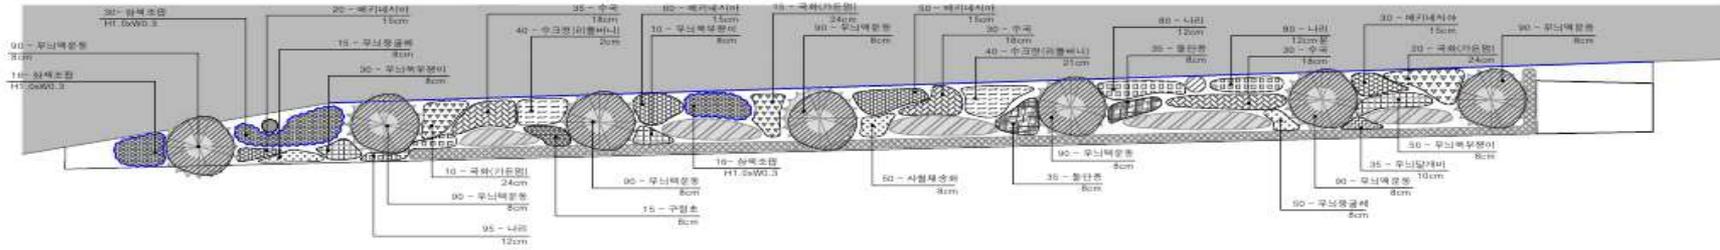

식재계획도 - 2
SCALE:1/60

4. 예정공정표

공사예정공정표

공사예정공정표

공사명: 2019년 가로변 녹지량 확충사업

공종별	기간			비고
	5일	10일	15일	
1.준비작업				
2.관목제거 및 식재공				
3.현장청소 및 정리 등				

5. 개략공사비

원가계산서

비 목		구 분	금 액	구 성 비	비 고	비 목		구 분	금 액	구 성 비	비 고
순 공 사 비	재 료 비	재 료 비	46,155,603	45.24%		순 공 사 비	경 비	세 금 과 공 과		0.00%	
		관 급 자 재 비		0.00%				도 서 인 쇄 비		0.00%	
		작업설부산물등		0.00%				건설기계대여금 지급보증서발급수수료	92,391	0.09%	
		소 계	46,155,603	45.24%				지 급 임 차 료		0.00%	
	노 무 비	직 접 노 무 비	18,011,200	17.65%				노인요양보험료	49,507	0.04%	
		간 접 노 무 비	2,035,265	2.00%				기 타 경 비 계	4,634,144	4.54%	
		소 계	20,046,465	19.65%				고 용 보 험 료	174,404	0.17%	
	경 비	전 력 비		0.00%				건 강 보 험 료	581,761	0.57%	
		운 반 비		0.00%				연 금 보 험 료	448,478	0.44%	
		기 계 경 비	6,903,246	6.77%				소 계	13,635,673	13.36%	
		특허권 사용료		0.00%			환 경 관 리 비(0.3%)		0.00%		
		산 재 보 험 료	751,742	0.73%			일 반 관 리 비(6.0%)	4,861,489	4.76%		
		보 관 비		0.00%			이 윤 (15%)	5,782,625	5.66%		
		외 주 가 공 비		0.00%			폐 기 물 처 리 비		0.00%		
		안 전 관 리 비		0.01%			공 급 가 액	91,668,183	89.86%		
		복 리 후 생 비		0.00%			부 가 가 치 세	9,166,817	8.98%		
		소 모 품 비		0.00%			도 급 공 사 비	100,835,000	98.85%		
	여비,교통비,통신비		0.00%		관 급 자 재 비		1,172,000	1.14%			
	수도광열비		0.00%		총 공 사 비		102,007,000	100.00%			

개략공사비

공 종	규 격	수량	단위	합 계	비고
1. 철거공사_을지로					
회양목 제거	H0.3xW0.3	10	주	43,308	
소 계		1	식	43,308	
2. 식재공사_을지로					
황금측백	H0.6xW0.4	35	주	240,399	
삼색조팝	H1.0xW0.3	110	주	1,193,116	
국화(가든멈)	24cm분	180	본	5,637,830	
나리	12cm분	500	본	4,330,639	
돌단풍	8cm	150	본	341,291	
무늬달개비	10cm	500	본	2,270,639	
무늬동글레	8cm	250	본	620,319	
무늬맥문동	8cm	1400	본	3,473,790	
무늬쑥부쟁이	8cm	200	본	455,055	
수크령(리틀버니)	21cm	250	본	10,405,319	
수국	18cm	250	본	10,405,319	
에키네시아	15cm	400	본	3,464,511	
은쑥	15cm	150	본	3,462,191	
소 계		1	식	46,300,418	
3. 관급자재					
황금측백	H0.6xW0.4	36	주	432,000	
삼색조팝	H1.0xW0.3	113	주	734,500	
조달수수료	0.54%	1	식	6,299	
단위조정		1	식	- 799	
소 계				1,172,000	



서울중구

감사합니다.
