

천호대로 연장 중앙버스전용차로 공사 교 통 소 통 대 책

〈 서울 지방경찰청 교통규제 요약보고서 〉


2018. 03



서울특별시 도시기반시설본부

□ 위치도

- 본 공사는 「천호대로 연장 중앙버스전용차로 공사」로 천호대로상에 중앙버스 전용차로 연장 설치를 통해 교통혼잡을 해소하고자 함.
- 현재 천호대로상에 「천호대로(광나루역) 확장공사」가 진행 중에 있음. (※ 참고자료 참조)
- 본 공사의 구간 및 구체적인 지점은 다음과 같음.

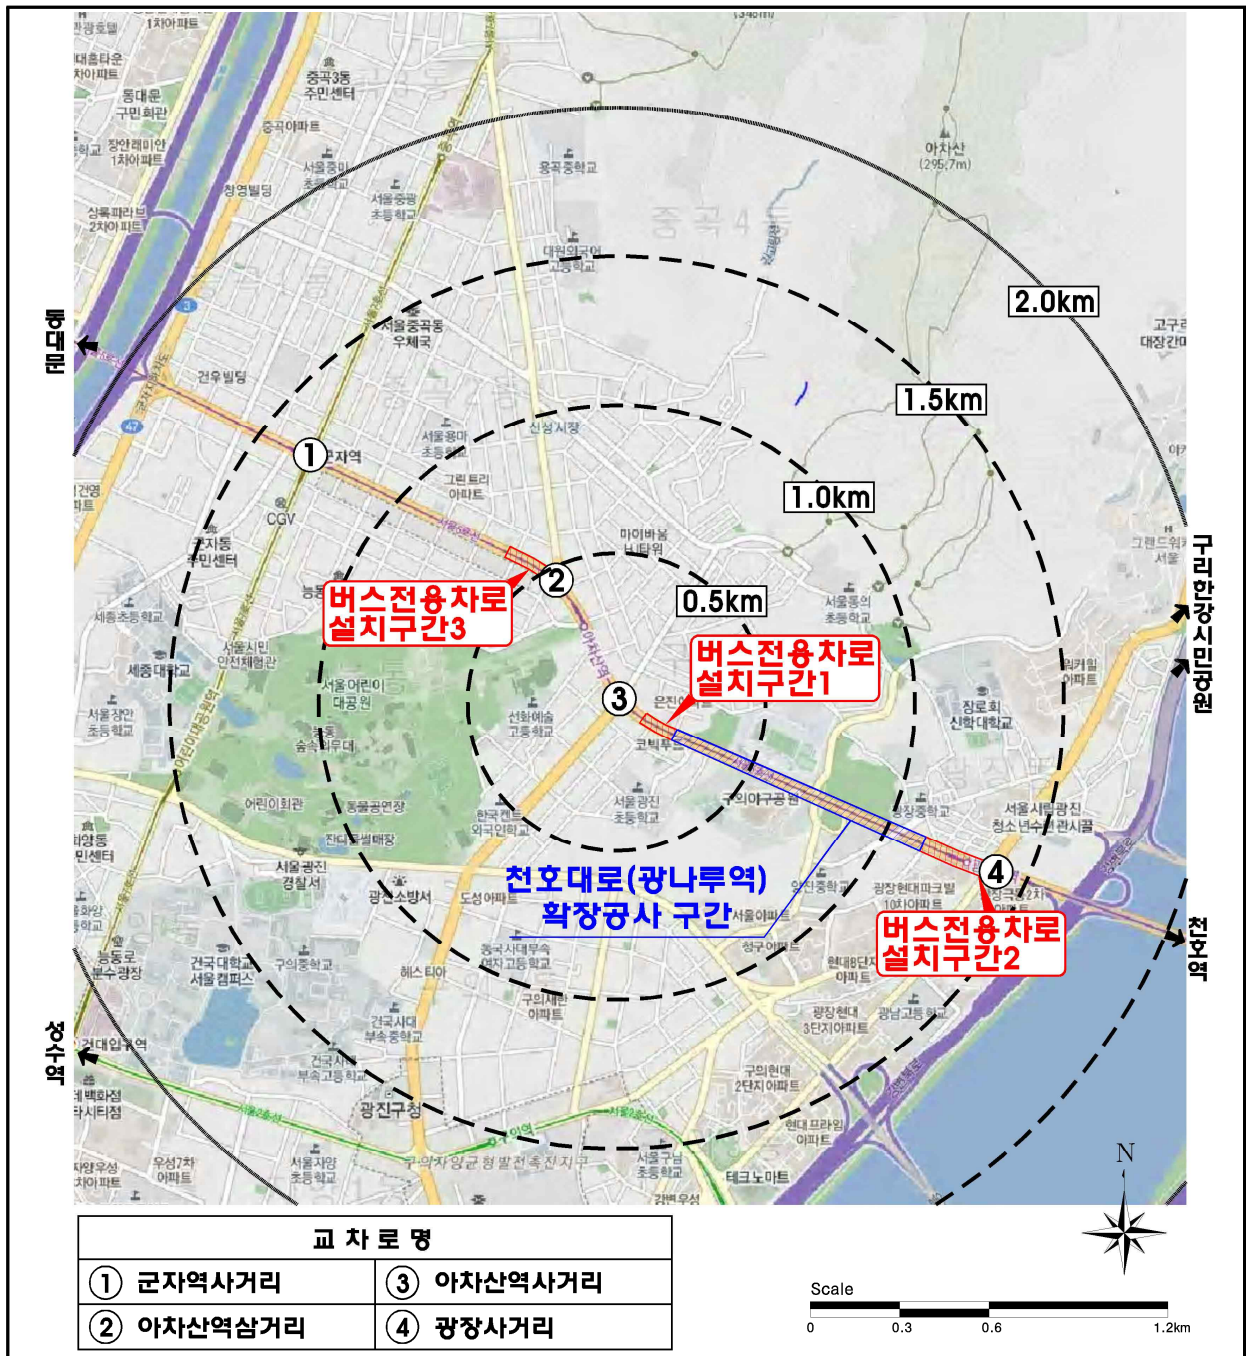

▣ 공사구간 도로현황

군자역사거리
~
아차산역
삼거리



군자역사거리
~
아차산역
삼거리



< 그림 계속 >

아차산역
삼거리
~
아차산역
사거리



아차산역
삼거리
~
아차산역
사거리



< 그림 계속 >

아차산역
사거리
~
광장사거리



아차산역
사거리
~
광장사거리



■ 천호대로 연장 중앙버스전용차로 공사 교통소통대책(변경) 요약

공사 단계	공사기간, 시간	공사내용	교통개선내용
1 구간	1 단계 · 2018.3.01~2018.3.10 (10일) · 주·야간공사(24시간)	· 1개차로(3.5m) 점용후 보도블럭 철거공사 (보도블럭 깨기 → L형 측구 설치 → 보도블럭 설치)	· 차로운영(천호대로) : - 군자역 및 광나루역방면 1차로 점용 - 공사시 인근상가 차량 진출입공간 확보 - 횡단보도 공사시 반쪽공사를 통한 보행통로 확보
	2-1 단계 · 2018.3.11~2018.3.19 (9일) · 주·야간공사(24시간)	· 2개차로(8.0m) 점용후 중앙차로부 재포장공사 (기존아스콘 깨기 → 아스콘 포장)	· 차로운영(천호대로) : - 중앙 2개 차로 점용 - 유턴 폐쇄에 따른 교통안내표지판 설치 - 차로운영계획 재수립
	2-2 단계 · 2018.3.20~2018.3.24 (5일) · 주·야간공사(24시간)	· 2개차로(8.0m) 점용후 중앙차로부 재포장공사 (기존아스콘 깨기 → 아스콘 포장)	· 차로운영(천호대로) : - 아차산역사거리 중앙 2개 차로 점용 - 회전차량을 고려한 유도선 설치 및 교통통제수 추가 배치 - 차로운영계획 재수립
	2-3 단계 · 2018.3.25~2018.4.08 (15일) · 주·야간공사(24시간)	· 2개차로(7.8m) 점용후 중앙차로부 재포장 및 버스정차대 설치공사 (기존아스콘 깨기 → 버스정차대경계석 설치 → 보도블럭 포장 → 아스콘 포장)	· 차로운영(천호대로) : - 중앙 2개 차로 점용 - 유턴 폐쇄에 따른 교통안내표지판 설치 - 횡단보도 공사시 반쪽공사를 통한 보행통로 확보 - 차로운영계획 재수립
	2-4 단계 · 2018.4.09~2018.4.21 (13일) · 주·야간공사(24시간)	· 2개차로(11.3m) 점용후 중앙차로부 재포장 및 버스정차대 설치공사 (기존아스콘 깨기 → 버스정차대경계석 설치 → 보도블럭 포장 → 아스콘 포장)	· 차로운영(천호대로) : - 중앙 2개 차로 점용 - 횡단보도 공사시 반쪽공사를 통한 보행통로 확보 - 차로운영계획 재수립

공사 단계		공사기간, 시간	공사내용	교통개선내용
2 구 간	1 단 계	<ul style="list-style-type: none"> · 2018.3.01~2018.3.20 (20일) · 주·야간공사(24시간) 	<ul style="list-style-type: none"> · 1개차로(3.5m) 점용후 보도블럭 철거공사 (보도블럭 깨기 → L형 측구 설치 → 보도블럭 설치) 	<ul style="list-style-type: none"> · 차로운영(천호대로) : <ul style="list-style-type: none"> - 천호대교방면 1차로 점용 - 공사시 인근상가 차량 진출입공간 확보 - 횡단보도 공사시 반쪽공사를 통한 보행통로 확보
	2 단 계	<ul style="list-style-type: none"> · 2018.3.21~2018.4.21 (32일) · 주·야간공사(24시간) 	<ul style="list-style-type: none"> · 3개차로(10.55m) 점용후 중앙차로부 재포장 및 버스정차대 설치공사 (기존아스콘 깨기 → 버스정차대 경계석 설치 → 보도블럭 포장 → 아스콘 포장) 	<ul style="list-style-type: none"> · 차로운영(천호대로) : <ul style="list-style-type: none"> - 중앙 3개 차로 점용 - 유턴 폐쇄에 따른 교통안내표지판 설치 - 횡단보도 공사시 반쪽공사를 통한 보행통로 확보 - 차로운영계획 재수립
3 구 간	1 단 계	<ul style="list-style-type: none"> · 2018.4.11~2018.4.17 (7일) · 주·야간공사(24시간) 	<ul style="list-style-type: none"> · 1개차로(3.5m) 점용후 보도블럭 철거공사 (보도블럭 깨기 → L형 측구 설치 → 보도블럭 설치) 	<ul style="list-style-type: none"> · 차로운영(천호대로) : <ul style="list-style-type: none"> - 군지역 및 광나루역방면 1차로 점용 - 공사시 인근상가 차량 진출입공간 확보
	2 단 계	<ul style="list-style-type: none"> · 2018.4.18~2018.4.22 (5일) · 주·야간공사(24시간) 	<ul style="list-style-type: none"> · 2개차로(6.2m) 점용후 가드레일 철거공사 (기존 가드레일 철거 → 버스정차대구버스정차대구간 깨기 → 아스콘 포장) 	<ul style="list-style-type: none"> · 차로운영(천호대로) : <ul style="list-style-type: none"> - 중앙 2개 차로 점용 - 중앙버스차로를 일반차로로 위치 변경후 중앙버스차로 유지 - 일반차로 4차로 → 3차로로 변경
	3 단 계	<ul style="list-style-type: none"> · 2018.4.23~2018.4.30 (8일) · 주·야간공사(24시간) 	<ul style="list-style-type: none"> · 3개차로(9.5m) 점용후 버스정차대 설치공사 (버스정차대경계석 설치 → 보도블럭 포장 → 아스콘 포장) 	<ul style="list-style-type: none"> · 차로운영(천호대로) : <ul style="list-style-type: none"> - 중앙 3개 차로 점용 - 군지역 방면 중앙버스차로를 일반차로로 위치 변경후 중앙버스차로 유지 - 광나루역 방면 중앙버스차로 임시 해제후 일반차로로 운영

▣ 천호대로 연장 중앙버스전용차로 공사 홍보계획

1) 홍보계획

- 본 공사는 「천호대로 연장 중앙버스전용차로 공사」로 2018년 2월 17일 ~ 2018년 4월 30일 까지(72일) 시행하는 공사임.

2) 교통통제에 따른 사전 예고

- 본 공사시행시 교통통제에 따른 교통처리방안으로서 공사전 주요 지점에 공사안내표지판을 설치하여 민원을 최소화하도록 하며, 차로구간에는 안전휀스, 교통표지시설을 적절히 설치하고 주요지점에 교통유도원을 배치하여 교통소통 및 안전에 만전을 기하도록 조치하겠음.
- 한편, 공사 시행으로 인한 도로 점용시 야간에 차량 및 보행통행에 안전을 위해 경고등, 워카 등 야광 교통시설물을 설치하여 공사구간을 사전 인지하여 차량 및 보행통행상의 불편을 최소화할 계획임.

3) 홍보계획

- 공사구간과 인접된 도로에는 원거리에서 우회할 수 있도록 우회안내표지판을 설치하고, 교통 정보상황실에 보도자료를 제공하여 교통통제를 홍보할 계획임.
- 서울시 교통관련 홈페이지를 이용한 공사개요, 공사기간, 주요 공법, 공사 진행현황, 교통통제 현황, 우회도로 정보 등을 제공할 계획임.현황, 우회도로 정보 등을 제공할 계획임.

4) 교통방송 홍보

- 공사시행전 5일전부터 1일 3회 이상 방송토록 요청하겠음.
- 안내문

- 2018년 00월 00일부터 2018년 00월 00일까지 「천호대로 연장 중앙버스전용차로 공사」가 천호대로에서 시행됩니다.
- 이에 따라 일부 차로가 통제되오니 운전자 여러분께서는 우회하시기 바라며, 차로변경에 특히 유의하시기 바랍니다.

5) 시민홍보

- 공사시행계획에 대한 구체적인 정보(※단계별 관리도 참조)를 시민들에게 홍보하여 불편사항을 최소화하기 위한 홍보계획으로 다음과 같음.
 - 대중매체를 활용하는 방법 : 지역일간지에 광고
 - 반상회 보고회 : 전단지 작성후 배포

6) 현수막 설치

- 본 공사 7일 전부터 종료일까지 공사 시종점부 가로등주에 현수막(배너)을 설치하여 공사구간을 운행하는 운전자와 보행자에게 미리 홍보를 실시토록 함.
- 예시

천호대로 연장 중앙버스전용차로 공사입니다

2018년 00월 00일까지 마치겠습니다. 불편하신 사항은 연락주세요

서울특별시 도시기반시설본부 000 TEL 000-0000, 현장담당자 000 TEL 000-0000
