


정기(기동점검) 점검 결과보고

[서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사(T/K)]

- 점검일시 : 2018.07.23 (월)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 전용현

○ 품질관리(도시철도토목부)

- 933정거장 7번출입구 토공 되메우기 작업은 일부에서 골재의 최대관리 기준치(노상 :100mm)를 초과하는 경우가 있으니 다짐도 확보를 위하여 보완하기 바람.

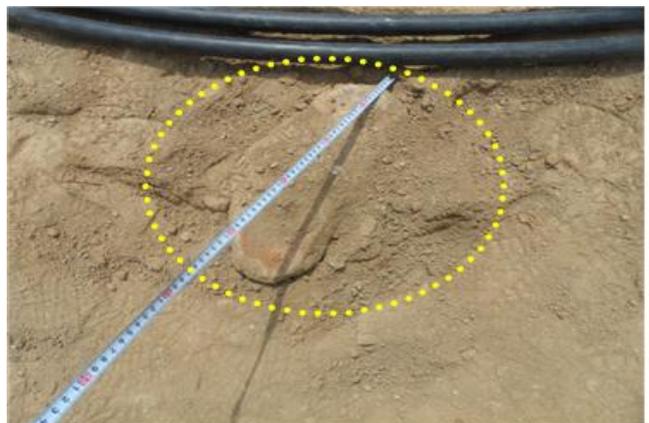

○ 추락재해 예방(도시철도건축부)

- 933정거장 7·8번 출입구 중간계단에서 A형사다리를 이용하여 천정부를 작업하는 근로자는 추락재해 예방을 위하여 아래사항을 보완하기 바람.

- ① 사다리 아웃트리거 확장 후 사용
- ② 2인1조 작업 시행 요망

※ 건설안전기본지침 공통 5
(사다리 A형)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(도시철도건축부)

- 933정거장에서 난간부 그라인더 작업은 화재 예방을 위하여 불티확산방지 조치를 시행하기 바람.

※ 건설안전기본지침 P-47
(고속절단기, 그라인더 화재예방 관리)



○ 기타 안전관리(도시철도건축부)

- 933정거장에서 석재절단작업을 시행중인 근로자는 안구 보호를 위하여 보안경을 착용 후 작업하기 바람.

※ 건설안전기본지침 공통 43
(개인보호구)

