

정기(기동점검) 점검 결과보고

[울곡로(창경궁앞) 도로구조 개선사업]

- 점검일시 : 2019.08.07 (수)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 이태행

○ 가설통로 안전(토목부)

- Seag Arch 설치시 상부로 통행하기 위해 설치된 줄사다리는 받침 부분이 손상되어 통행시 위험이 있으니 보완 요망
 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제24조(사다리식 통로 등의 구조)




○ 사면 안전(토목부)

- 창경궁 방향 절토부는 굴착사면 보호를 위한 법면 보호시설이 일부 미설치 되어 있으니 즉시 설치 하여 관리 요망
 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제340조(지반의 붕괴 등에 의한 위험방지)



○ 낙하·비래 재해 예방(토목부)

- PC Arch 상부에서 사용되는 체인블럭의 후크
해지방지장치가 미설치 되어 있으니 후크해지방
지장치를 설치 요망
※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제137조(해
지장치의 사용)

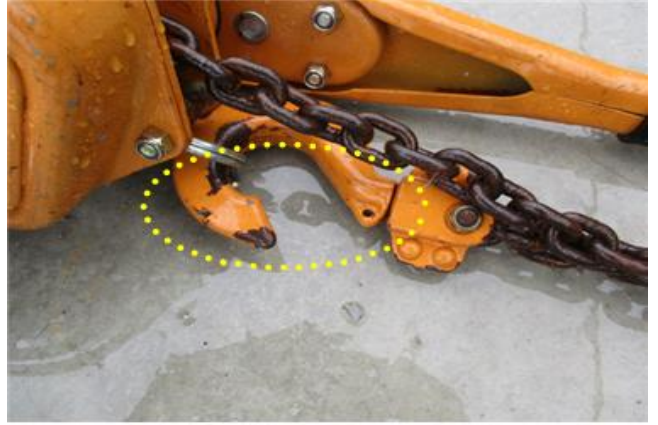

○ 추락재해 예방(토목부)

- 종요측 PC Arch 설치 구간은 근로자 추락방지
를 위한 안전난간이 일부 미설치 되어 있으니 설
치 요망
※ 산업안전 보건 기준에 관한 규칙 제43조(개
구부 등의 방호 조치)



○ 기타 안전관리(토목부)

- 동대문 방향 사면에 설치 된 배수로는 철거 폐
기물 등이 제거되지 않은 상태이므로 청소 요망



○ 기타 안전관리(토목부)

- 동대문 방향 터널은 통과 높이 제한표지가 미
설치 되어 있으니 설치 요망

