

정기(기동점검) 점검 결과보고

[남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사]


□ 점검일시 : 2020.01.21 (화)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 박수엽

○ 추락재해 예방(토목부)

- 작업으로 인해 일부 해체되어 있는 오류IC교 안전난간은 견고하게 보완하기 바람.
 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제43조(개구 부등의 방호조치)

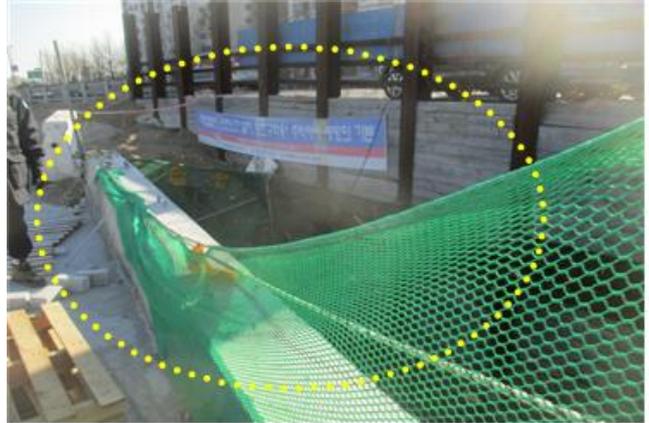

○ 사면 안전(토목부)

- 오류IC교로 이동하는 A1구간의 사면은 비닐등을 덮어 보호하기 바람.
 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제340조(지반의 붕괴 등에 의한 위험방지)



○ 기타 안전관리(토목부)

- 현장에 놓여있는 불량소화기들은 비상시 근로자들의 착오 행동을 유발할 수 있으므로 현장에서 반출하고 현장에 비치된 소화기들은 정기점검을 통해 관리바람.



○ 기타 안전관리(토목부)

- 현장에서 실시하고 있는 일일 안전점검 및 일지관리는 내실있는 안전활동이 되도록 관리바람

