

정기(기동점검) 점검 결과보고

[동부간선도로확장(3공구) 전기공사]

- 점검일시 : 2020.02.12 (수)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 전해령


○ 전도재해 예방(설비부)

- 방음터널 전기설비 작업용 고소작업차 이동방지용 고임목 설치 철저요함.
- ※산업안전보건 기준에 관한 규칙 제199조 (전도 등의 방지)



○ 낙하·비래 재해 예방(설비부)

- 방음터널 전기설비 설치 작업용 고소작업차 작업발판 바닥에 볼트 등이 낙하할 경우 밖으로 떨어짐을 방지하기 위한 조치요함.
- 고소작업대 위에서 공구 사용시 공구 낙하방지용 공구달줄을 설치하여 작업요함.
- ※산업안전보건 기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)

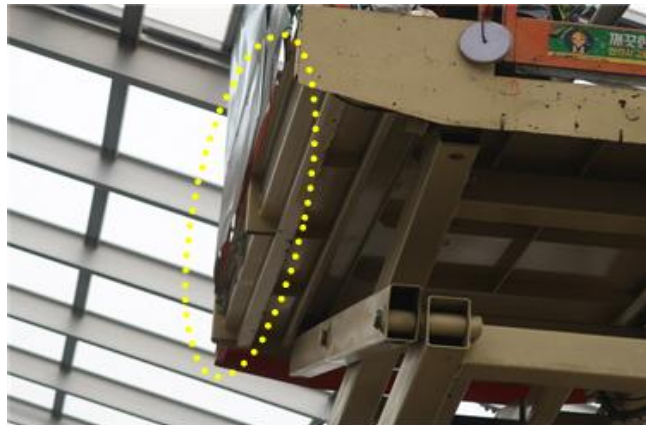

○ 기계기구 안전(설비부)

- 전기설비 가공용 고속절단기 작업시 방호덮개 설치요함.
- ※건설안전 기본지침 공통-026 (고속절단기)



○ 감전재해 예방(설비부)

- 콘센트 보호 커버가 달린 산업용 콘센트 사용 요함.
- ※건설안전 기본지침 공통-017 (가설전선)

