

정기(기동점검) 점검 결과보고

[사천 빗물펌프장 유입관로 신설공사]

- 점검일시 : 2021.05.06 (목)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 이상현


○ 가설통로 안전(방재시설부)

- 수직구 가설계단 일부구간은 주변 가시설로 매우 협소하고 계단 통행시 붙잡을 난간이 없어 답단을 대신 잡고 내려가야 하는 등 불안정한 행동을 유발하므로 로프 설치 등 여건에 맞는 안전한 통로를 확보하기 바람
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(방재시설부)

- 현장 내 사용하지 않는 위험물은 위험물 보관소 내에 보관하기 바람
- ※ 건설안전 기본지침 공통-024(위험물 보관소)

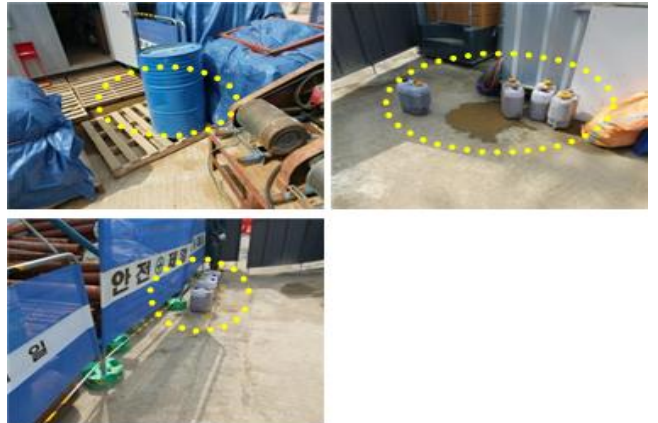

○ 기타 안전관리(방재시설부)

- 굴진장비 유압잭 실린더 부분에 누유가 일부 있으므로 향후 보수하기 바람

