

정기(기동점검) 점검 결과보고

[마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사(장기1차)]

□ 점검일시 : 2021.09.08 (수)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 이태행

○ 건설기계 안전(건축부)

- 유리 설치 작업시 사용되는 고소작업대의 붐대가 도로 방향으로 돌출되어 있어 통행하는 차량에 충돌 위험이 있으므로, 이에 대한 대책 마련 및 조치 요망
- ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)




○ 기계기구 안전(건축부)

- 용접 작업중 자리를 비웠을시 전원을 차단하고 비울수 있도록 교육하고, 용접작업시는 소화기를 주변에 배치하도록 조치 요망
- ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제243조(소화설비)



○ 기계기구 안전(건축부)

- 목재가공용 동근톱기계 사용시 톱날접촉예방 장치 및 반발예방장치를 설치하여 작업 할 수 있도록 관리 요망
- ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제106조(동근톱기계의 톱날접촉예방장치)

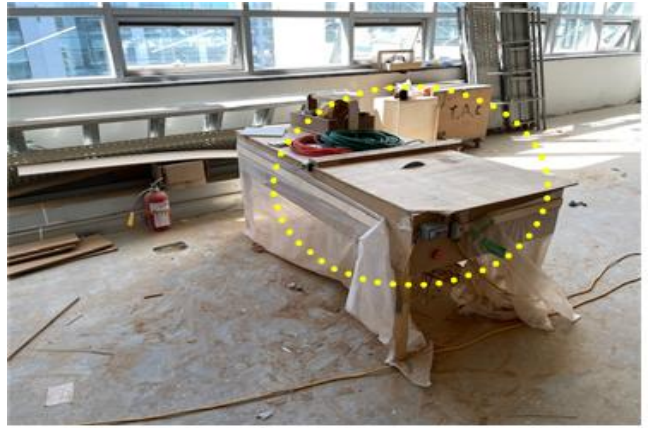

○ 품질관리(건축부)

- 창대석 하부 공간이 넓은 구간은 사춤물탈 충전 후 코킹 처리 작업 검토 요망
- 4층 벽 곰팡이 처리 후 마감조치 요망

