

정기(기동점검) 점검 결과보고

[신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(3공구)]

□ 점검일시 : 2021.12.08 (수)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 박종찬

○ 추락재해 예방(도시철도사업부)

- 정거장 및 환기구에 하부가 고정되지 않은 추락 방호망이 다수 발견됨에 따라 각 정거장별 전수조사 하여 고정조치 요함

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지)



○ 추락재해 예방(도시철도사업부)

- 정화조 맨홀 뚜껑의 안전 조치가 미흡하여(임시 덮개가 가벼움) 근로자 이동시 낙상사고가 발생할 수 있으므로 안전 조치 바람(110정거장)


※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치)



○ 낙하·비래 재해 예방(도시철도사업부)

- 외부 엘리베이터 작업대 발판 철제가 일부 파손되어 낙하에 의한 안전사고를 유발할 수 있으므로 조치 요망(111정거장)

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)

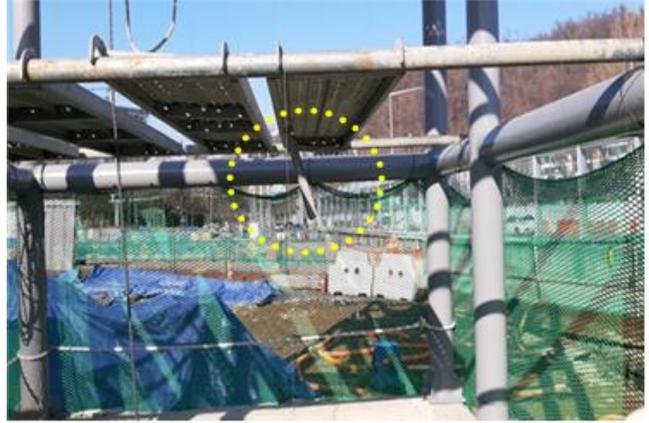

○ 중량물취급 안전(도시철도사업부)

- 휴관 인입 작업 시 한줄걸이로 인한 자재 이탈, 낙하 우려가 있으니 2줄걸이, 유도로프 체결 등 양중작업 기준을 준수하여 작업바람

※ 건설공사장 안전관리지침 3.2 (중량물 취급 안전)



○ 중량물취급 안전(도시철도사업부)

- 현장에서 사용하는 파손된 항공마대는 즉시 반출하고, 날카로운 자재 보관 후 양중 시 낙하에 의한 안전사고 발생 우려가 있으므로 조치 요망

※ 건설공사장 안전관리지침 3.2 중량물취급-005(항공마대)



○ 기계기구 안전(도시철도사업부)

- 정거장 내부 바닥시공을 위해 대리석 커팅 작업 시, 집진장치 설치 후 작업 요망(111정거장)

※ 건설공사장 안전관리지침 3.2 기계·기구-002(핸드글라인더)



○ 품질관리(도시철도사업부)

- 출입구 되메우기 작업 전 파손된 보호재 및 내부방수재는 보수 요망(109정거장)

