

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## [강남순환도시고속도로 건설(4공구)]


- 점검일시 : 2017.10.12 (목)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 홍민철

<p>○ 가설통로 안전(토목부)</p> <p>- 금하지하차도 슈트파일 옆으로 설치된 근로자 통로는 정비되지 않아 미끄러질 위험이 있으니 정비하기 바람</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)</p>	
<p>○ 가설통로 안전(토목부)</p> <p>- 금하지하차도 슈트파일 상부로 넘어서 통행하는 부분은 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 계단 등을 설치하기 바람</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)</p>	
<p>○ 가설통로 안전(토목부)</p> <p>- 금하지하차도 슈트파일 설치구간 단부에 근로자 통행시 굴러떨어지지 않도록 안전난간 설치하기 바람</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)</p>	

○ 감전재해 예방(토목부)

- 금하지하차도 발전기의 전선 이음부는 절연테이프가 부식되어 있으니 보강하고, 전선은 바닥에 깔지 말고 전선거치대를 이용하여 가공처리하기 바람

※ 건설안전 기본지침 공통-017 가설전선

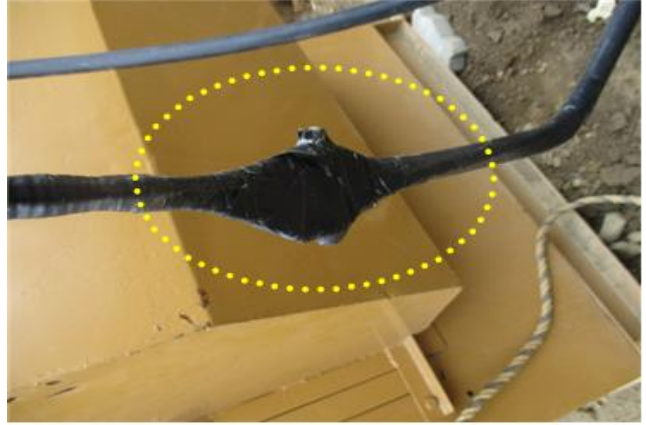

○ 기타 안전관리(토목부)

- 금하지하차도 복공설치구간으로 전일 강우로 빗물이 고여 있으니 배수로 정비하여 우수가 원활히 배수되도록 조치하기 바람



○ 기타 안전관리(토목부)

- 금하지하차도 주형보 설치 작업하는 용접자는 용접앞치마 및 용접 장갑을 착용토록 조치하기 바람

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조(보호구의 지급 등)



○ 기타 안전관리(토목부)

- 금하지하차도 가설휀스 중 야간 교통시설물이 설치되지 않은 곳이 있으니 보완 설치하기 바람

