

강남구 가로수 기본계획 변경 및 선릉로 등 가로수 바꿔심기

2018. 12.

요구기관 : 강남구

상 정 안 건 개 요

강 남 구

1. 사업개요

- 대 상 지 : 선릉로 약 400m, 선릉로4길 약 200m



1. 사업개요

○ 사업내용

- 개포 주공2단지 주택 재건축 정비사업의 인접도로(선릉로, 선릉로4길) 정비에 따른 가로수 바꿔심기 계획
- 향후 개포 주공1단지 정비로 인한 금희구간 주변 가로 정비를 감안한 주변지역(선릉로) 가로수 기본계획 설정


○ 사업목적

- 도로정비로 인한 가로수 바꿔심기 계획 작성
- 주변여건과 부합하고, 가로환경을 고려한 가로수 바꿔심기 계획설정 (가로수종선정)
향후 주변지역의 정비를 감안한 선릉로의 통일된 가로경관 조성을 위한 방향 제시

위 치 도

강 남 구

1. 위치도

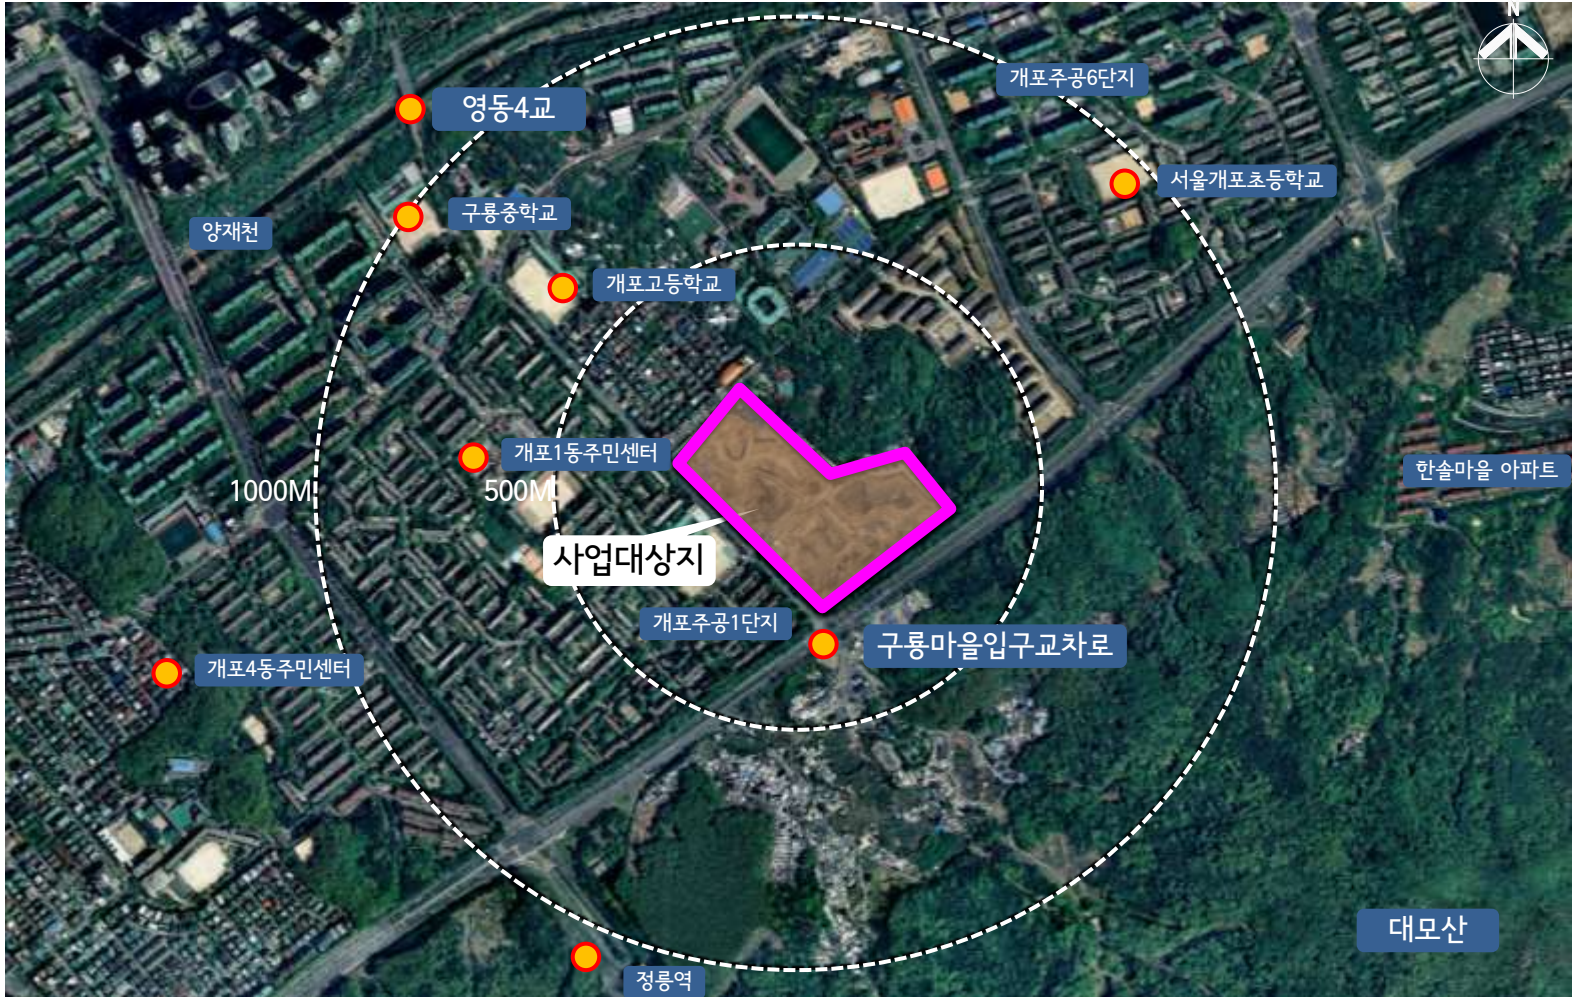

가로수 현황

강남구


1. 강남구 가로수 현황도



바꿔심기계획

강남구

1. 가로수 종합계획도

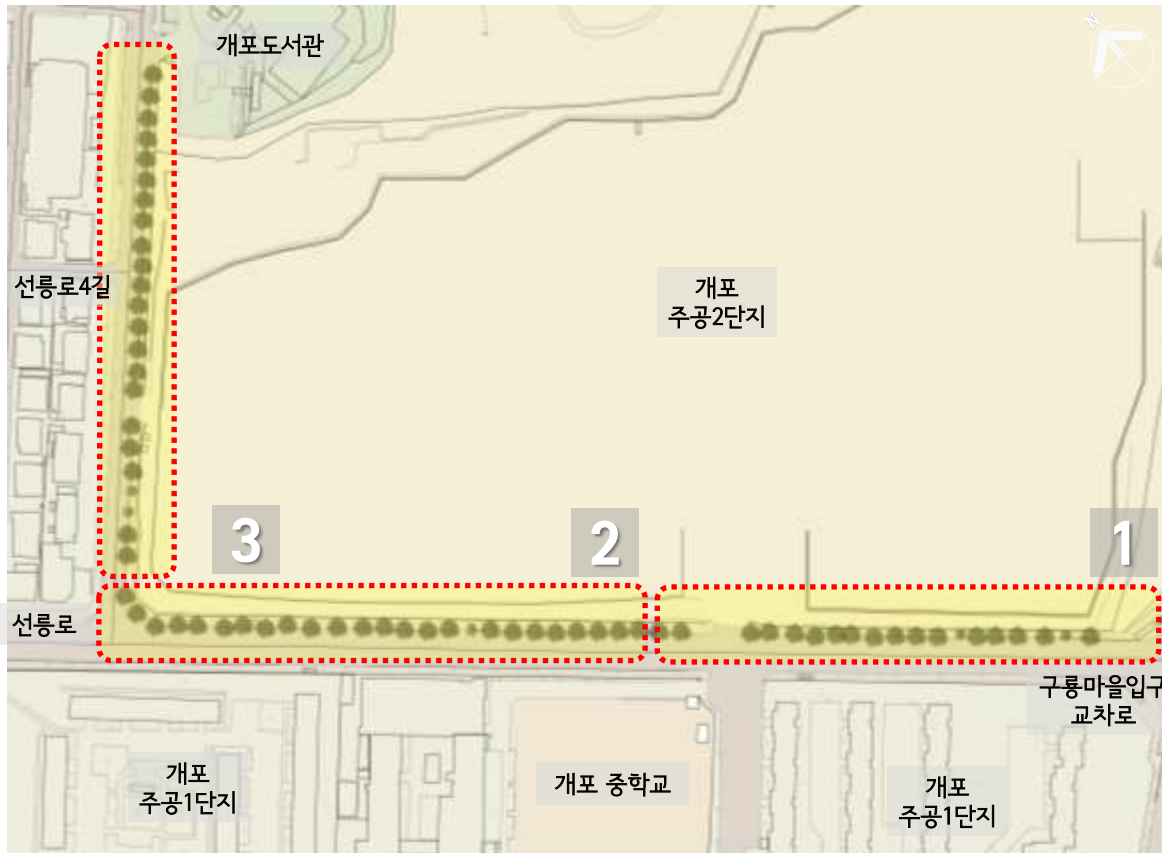

1구간(선릉로)

● 철거

- 버즘나무 17주, 은행나무 2주 철거
- 수목보호틀 10개소 제거
- 수목보호덮개 2개소 제거

● 신규

- 느티나무 16주 식재,
- 수목보호판 16개소 설치

2구간(선릉로)

● 철거

- 버즘나무 23주, 은행나무 1주 철거
- 수목보호틀 11개소
- 수목보호덮개 1개소

● 신규

- 느티나무 24주 식재
- 수목보호판 24개소 설치

3구간(선릉로4길)

● 철거

- 버즘나무 22주, 은행나무 2주 철거
- 수목보호틀 3개소

● 신규



- 느티나무 21주 식재,
- 화살나무 1,130주 식재,
- 사철나무 1,840주 식재 (띠녹지조성)

가로수 현황

강남구

1. 가로수 현황(1구간, 구룡마을입구~개포중학교정류장)

현황

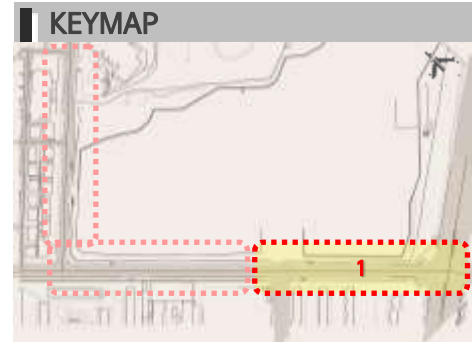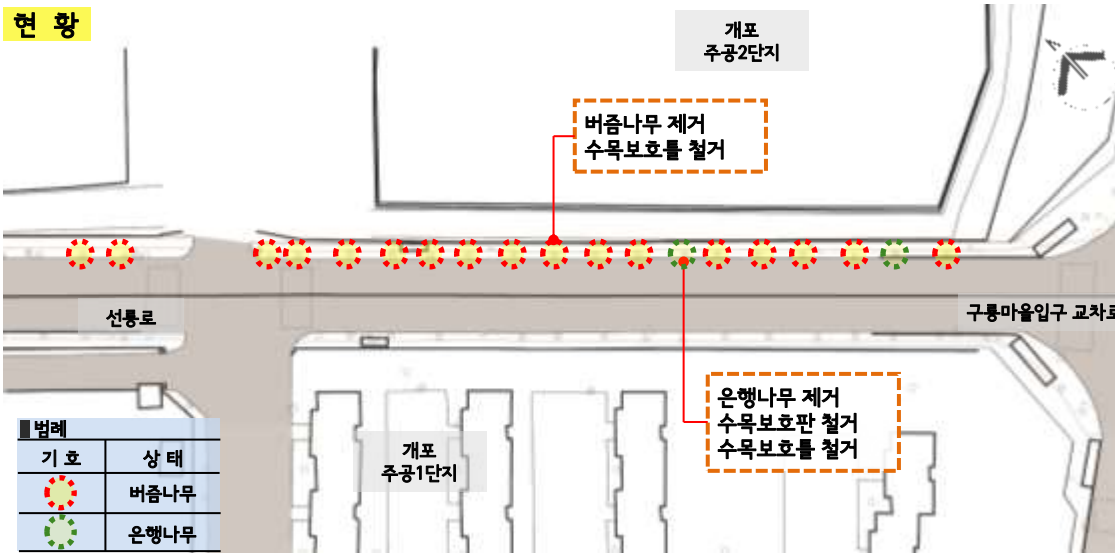


세부 가로수 교체 계획 (1구간)

| 구분 | 공종 | 규격 | 단위 | 수량 |
|----|-----------|---------|----|----|
| 철거 | 버즘나무 제거 | B31~B40 | 주 | 15 |
| | | B26~B30 | 주 | 2 |
| | 은행나무 제거 | B15 이하 | 주 | 2 |
| | 수목보호를 철거 | - | 개소 | 10 |
| | 수목보호덮개 철거 | - | 개소 | 2 |

가로수 현황

강남구

2. 가로수 현황(2구간, 개포중학교정류장~롯데리아개포점)

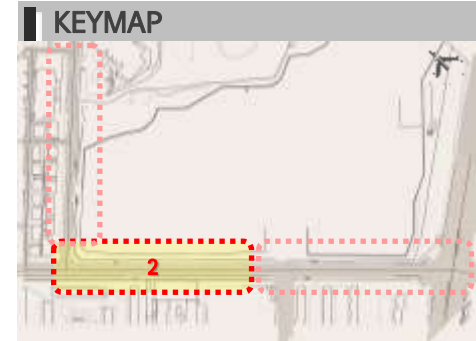


세부 가로수 교체 계획 (2구간)

| 구분 | 공종 | 규격 | 단위 | 수량 |
|----|-----------|---------|----|----|
| 철거 | 버즘나무 제거 | B31~B40 | 주 | 15 |
| | | B26~B30 | 주 | 8 |
| | 은행나무 제거 | B15 이하 | 주 | 1 |
| | 수목보호를 철거 | - | 개소 | 11 |
| | 수목보호덮개 철거 | - | 개소 | 1 |

가로수 현황

강남구

3. 가로수 현황(3구간,선릉로4길)

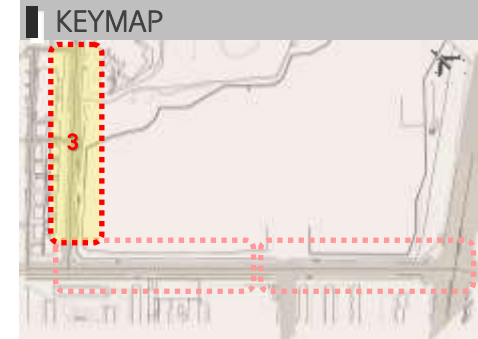



세부 가로수 교체 계획 (3구간)

| 구분 | 공종 | 규격 | 단위 | 수량 |
|----|----------|---------|----|----|
| 철거 | 버즘나무 제거 | B51 | 주 | 2 |
| | | B41~B50 | 주 | 5 |
| | | B31~B40 | 주 | 14 |
| | | B21~B25 | 주 | 1 |
| | 은행나무 제거 | B15 이하 | 주 | 2 |
| | 수목보호를 철거 | - | 개소 | 3 |

가로수 계획

강남구

1. 가로수 계획(1구간, 구룡마을입구~개포중학교정류장)

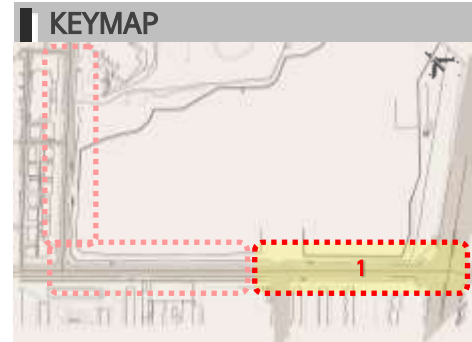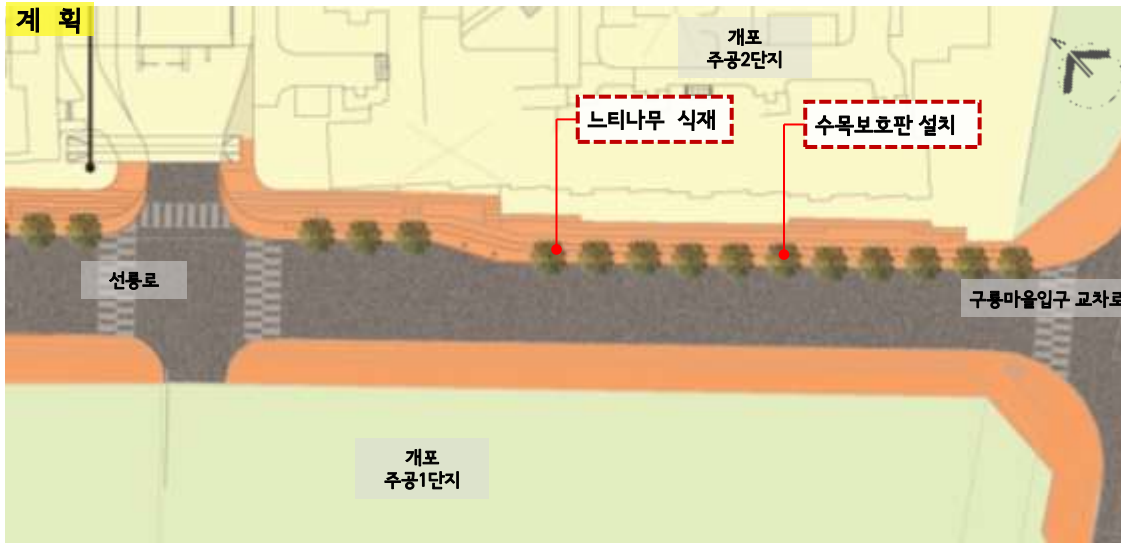


■ 세부 가로수 교체 계획 (1구간)

| 구분 | 공종 | 규격 | 단위 | 수량 |
|----|-----------------|-----------|----|----|
| 설치 | 느티나무 식재 | H4.0xR15 | 주 | 16 |
| | 수목보호판 설치 (틀 포함) | 1500x1500 | 개소 | 16 |
| | | | | |

가로수 계획

강남구

2. 가로수 계획(2구간, 개포중학교정류장~롯데리아개포점)

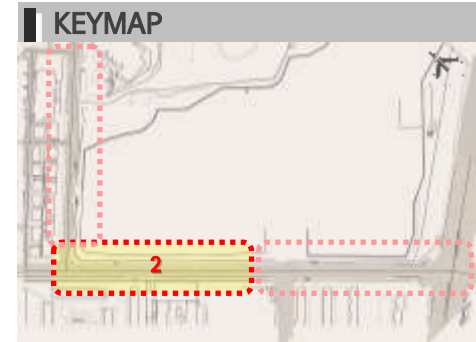



세부 가로수 교체 계획 (2구간)

| 구분 | 공종 | 규격 | 단위 | 수량 |
|----|-----------------|-----------|----|----|
| 설치 | 느티나무 식재 | H4.0xR15 | 주 | 24 |
| | 수목보호판 설치 (틀 포함) | 1500x1500 | 개소 | 24 |
| | | | | |

가로수 계획

강남구

3. 가로수 계획(3구간,선릉로4길)

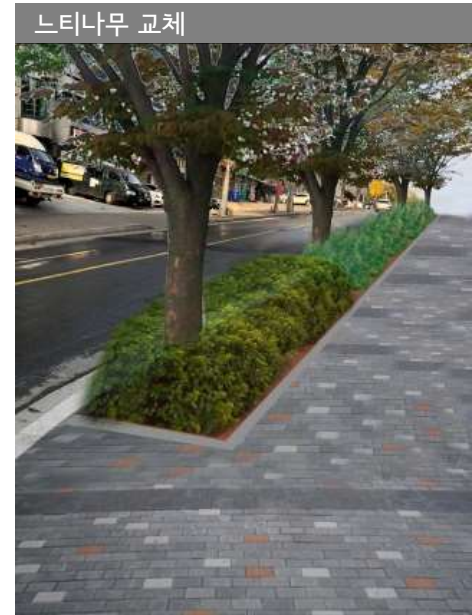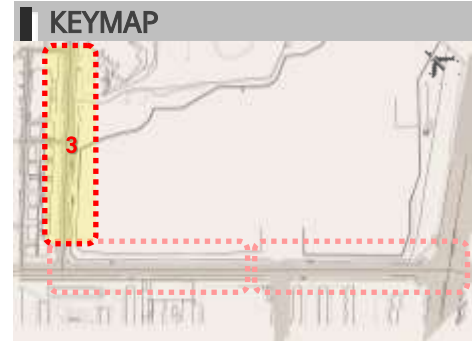

■ 세부 가로수 교체 계획 (3구간)

| 구분 | 공종 | 규격 | 단위 | 수량 |
|----|---------|-----------|----|-------|
| 설치 | 느티나무 식재 | H4.0xR15 | 주 | 21 |
| | 화살나무 식재 | H0.8xW0.4 | 주 | 1,130 |
| | 사철나무 식재 | H1.0xW0.3 | 주 | 1,840 |

중 장 기 계 획

강 남 구

1. 가로수 현황 (금회구간 포함)

■ 주택정비사업으로 인한 가로수 바뀌심기 필요구간 (예정)
→ 현 버즘나무 가로수

■ 주택정비사업으로 인한 도로, 보도정비구간(금회구간)
→ 가로수 바뀌심기 계획
; 버즘나무, 은행나무 → 느티나무

■ 현 버즘나무, 은행나무 가로수



영동4교

개포 고교 교차로

개포도서관

선릉로4길

주공2단지

구룡마을입구 교차로

선릉로

주공1단지

■ 현 느티나무 가로수



■ 주택정비사업으로 인한 가로수 바뀌심기 필요구간 (예정)
→ 현 버즘나무 가로수



2. 중.장기 계획(안)

- 선릉로 주변 주택 정비 사업으로 인한 가로 정비로 가로경관 재조성
- "느티나무" 가로수 바꿔심기 계획으로 선릉로(구룡마을 입구교차로~영동4교 구간)의 통일된 가로경관 조성 도모

- 가로수 바꿔심기 (안)
 - 버즘나무 → 느티나무
 - 개포 주공2단지 주택재건축 정비사업(장기안)으로 인한 도로 확폭 예정



- 현재 가로수종 유지 (느티나무)

- 가로수 바꿔심기 (안)
 - 버즘나무 → 느티나무
 - 개포 주공1단지 주택재건축 정비사업으로 인한 보도 정비 예정

■ 조성 사례



중 장기 계획


강 남 구

2. 중·장기 계획(안)


- 「개포택지(공동주택) 제1종지구단위계획 (재정비) 결정 변경 교통영향분석·개선대책 (2차 변경심의), 2010.12」에 의한 도로정비 계획 (2018.10 금회 변경신고)




선릉로4길 현황단면 (A-A')

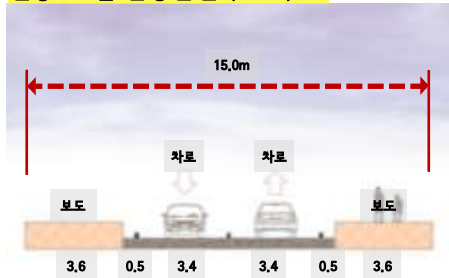

정비계획 단기안 (A-A')

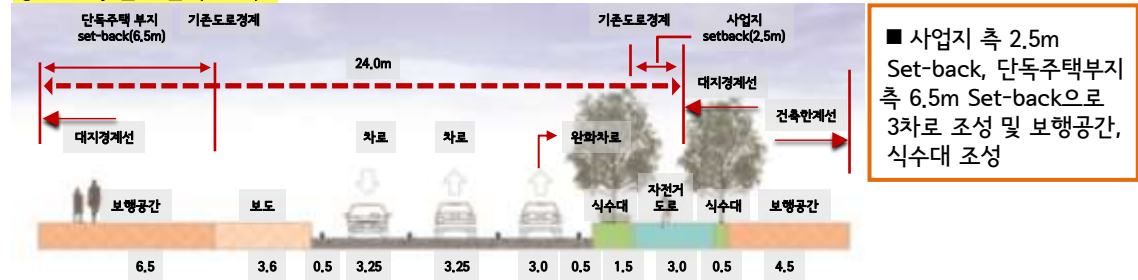

정비계획 장기안 (A-A')

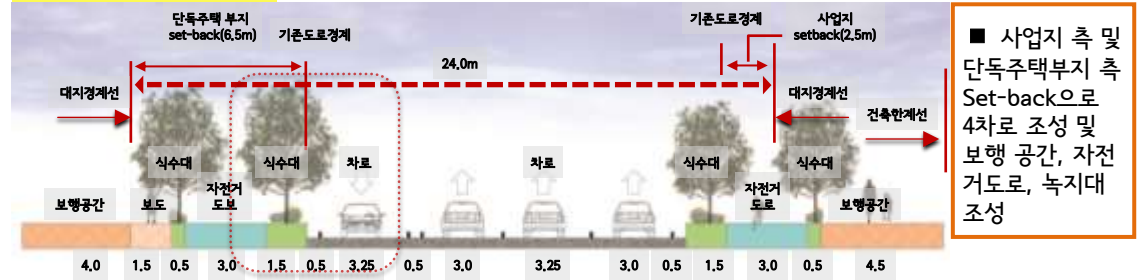


중 장기 계획


강 남 구

2. 중·장기 계획(안)


선릉로 현황단면 (B-B')



정비계획 단기안 (B-B')



정비계획 단기안 (b-b')



정비계획 장기안 (B-B')

